

**Вх.№07-00-44/16.04.2024г.**

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ДРЯНОВО**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
от Трифон Руенов Панчев - Кмет на Община Дряново**

**Относно:** Приемане на „Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 - 2023 г. на Плана за интегрирано развитие на община Дряново (2021-2027г.)“.

**УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Междинната оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Дряново (2021-2027г.) е разработена в съответствие с чл. 8, ал. 2 и в чл. 33 ал. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който изиска изготвянето на обобщена преценка на общинското развитие между 2021 - 2023г., която да изведе насоките за управление на общината до края на настоящия програмен период.

Междинната оценка изследва интегрираното общинско развитие в периода между 2021 и 2023г. Фокусът е поставен върху проекти, проектни идеи, дейности и резултати, които са реализирани или са в процес на реализация за периода на действие на ПИРО.

Междинната оценка включва четири елемента, дефинирани от чл. 33 ал. 2 от ЗРР:

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. Оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки за изпълнението.

Изготвеният Доклад за резултатите от Междинната оценка на ПИРО се внася за обсъждане и одобряване от Общински съвет - Дряново, съгл. чл. 26 ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР. След приемането му от Общински съвет, Докладът от Междинната оценка се публикува на интернет страницата на общината и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Дряново да вземе следното

**РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет - Дряново, одобрява „Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 - 2023 г. на Плана за интегрирано развитие на община Дряново (2021-2027г.)“.



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ  
ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА  
ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2023Г.  
НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ  
НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 2021 – 2027Г.



ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №..... НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО

Съдържание	
<b>ВЪВЕДЕНИЕ</b> .....	5
<b>I. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО</b> .....	11
1.1. Обща характеристики на изпълнените проекти и инициативи .....	11
1.2. Подробен преглед на проектите в програмата за реализация на ПИРО.....	12
<b>II. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПИРО</b> .....	69
2.1. Оценка на техническото изпълнение на ПИРО .....	70
2.2. Оценка на финансово изпълнение на ПИРО .....	104
2.3. Отчитане актуалните стойности на индикаторите от ПИРО .....	107
<b>III. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ</b> .....	117
3.1. Оценка на ефективността .....	117
3.2. Оценка на ефикасността .....	118
<b>IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО</b> .....	130

### Списък на използваните съкращения

Съкращение	Описание
АДБФП	Административен договор за безвъзмездна финансова помощ
АПИ	Агенция „Пътна инфраструктура“
АСП	Агенция за социално подпомагане
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ВИК	Водоснабдяване и канализация
ВОМР	Водено от общностите местно развитие
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“
ДГ	Детска градина
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗЛП	Закон за личната помощ
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ЗСУ	Закон за социалните услуги
ЗХУ	Закон за хората с увреждания
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България
ИТСР	Интегрирана териториална стратегия за развитие
ИУЕЕО	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
КККР	Кадастрална карта и кадастрални регистри.
МИГ	Местна инициативна група
МО	Междинна оценка
МОН	Министерство на образованието и науката
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НПО	Неправителствена организация
НСИ	Национален статистически институт
НУБА	Негодни за употреба батерии и акумулатори.
НЧ	Народно читалище
ОбС	Общински съвет
ОДЗ	Областна дирекция „Земеделие“
ОПДУ	Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
ОПНОИР	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
ОУПО	Общ устройствен план на община
ПИ	Поземлен имот
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПМС	Постановление на Министерски съвет
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПРЧР	Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027
ППЗРР	Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПСОВ	Пречиствателна станция за отпадни води
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда
СМР	Строително – ремонтни дейности

### Списък на използваните съкращения

Съкращение	Описание
СОП	Специални образователни потребности
СУ	Средно училище
СЦР	Северен централен район
ТБО	Твърди битови отпадъци
ТСБ	Териториално статистическо бюро
УПИ	Урегулиран поземлен имот
ФЕПНЛ	Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
ЦНСТПЛПР	Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства/

### Списък на таблиците в текста

Таблица №	Описание
Таблица 1.	Скала за качествена оценка на количествени показатели
Таблица 2.	Финансово изпълнение на ПИРО на Община Дряново за периода 2014-2020 г. (в хил. лв.)
Таблица 3.	Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2027 г. – индикатори за резултат
Таблица 4.	Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2027 г. – индикатори за продукт
Таблица 5.	Население под, във и над трудоспособна възраст в Община Дряново за периода 2020-2022г., в %

### Списък на фигурите в текста

Фигура №	Описание
Фигура 1.	Процес по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО
Фигура 2.	Структура на Междинната оценка
Фигура 3.	Основни етапи на Междинната оценка
Фигура 4.	Стратегическа рамка на ПИРО на Община Дряново
Фигура 5.	Дял на изпълнените проекти спрямо заложените в ПИРО на Община Дряново
Фигура 6.	Изпълнение по стратегически цели и категории проекти/инициативи
Фигура 7.	Технически напредък на проектите по приоритети, допринасящи за постигане на Стратегическа цел 1
Фигура 8.	Технически напредък на проектите по приоритети, допринасящи за постигане на Стратегическа цел 8
Фигура 9.	Технически напредък на проектите по приоритети, допринасящи за постигане на Стратегическа цел 3
Фигура 10.	Финансово изпълнение на Стратегическите цели на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2023 г. (в хил. лева)
Фигура 11.	Разпределение на финансовите ресурси по години (хил. лв.)
Фигура 12.	Сравнение между вложените ресурси в проекти, техния брой и приноса им към изпълнението на приоритетите на ПИРО Дряново
Фигура 13.	Ефективност на изпълнение по източници на финансиране
Фигура 14.	Разпределение на финансовите ресурси по източници и по стратегически цели (хил. лв.)

## ВЪВЕДЕНИЕ

Междинната оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Дряново е разработена в съответствие с чл. 8, ал. 2 и в чл.33 (1) от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който изисква изготвянето на обобщена преценка на общинското развитие между 2021 – 2023г., която да изведе насоките за управление на общината до края на настоящия програмен период.

### Цели

---

Разработването на Междинната оценка (МО) е ориентирано към постигането на следните цели и подцели: Систематизиране и оценка на резултатите от изпълнението на ПИРО в периода 2021 – 2023г.; Формулиране на обосновани препоръки за: актуализиране съдържанието на ПИРО за остатъка от периода до 2027г.; необходимите действия на администрацията за последващо изпълнение и наблюдение на ПИРО; подобряване на действията по реализиране на интегрирания териториален подход.

Настоящият доклад разглежда територията на община Дряново, включително строителните граници и землищата на населените места. Общата площ на община Дряново е 24 826,23 ха и е специфична комбинация от урбанизирана територия - 5,76%, гори – 32,13%, земеделски територии – 56,68%.<sup>1</sup> Територията на общината включва общо 63 населени места – административния център град Дряново и 62 села: с. Балалея, с. Балванците, с. Банари, с. Билкини, с. Бучуковци, с. Ганчовец, с. Геня, с. Геша, с. Глушка, с. Гоздейка, с. Големи Българени, с. Горни Върпища, с. Горни Драгойча, с. Гостилница, с. Гърня, с. Денчевци, с. Джуровци, с. Длъгня, с. Добрените, с. Долни Върпища, с. Долни Драгойча, с. Доча, с. Дурча, с. Еленците, с. Зая, с. Игнатовци, с. Искра, с. Каломен, с. Караиванца, с. Катранджии, с. Керека, с. Косарка, с. Косилка, с. Крънча, с. Кукля, с. Куманите, с. Къртипъня, с. Малки Българени, с. Маноя, с. Муця, с. Нейчовци, с. Пейна, с. Петковци, с. Плачка, с. Пърша, с. Раданчето, с. Радовци, с. Ритя, с. Руня, с. Русиновци, с. Саласука, с. Скалско, с. Славейково, с. Соколово, с. Станча, с. Сухолоевци, с. Сяровци, с. Сяровци, с. Туркинча, с. Царева ливада, с. Чуково, с. Шушня, с. Янтра.

### Предмет

---

Предмет на настоящия Доклад от междинната оценка на ПИРО за периода 2021 – 2023г. е развитието на община Дряново, свързано с изпълнението на проекти и инициативи с принос към Програмата за реализация на ПИРО. Докато ПИРО анализира и оценява състоянието и тенденциите в развитие на общината, Междинната оценка обхваща социално – икономическото развитие от гледна точка на изпълнението на ПИРО.

---

<sup>1</sup> По данни на ОУПО Дряново

Оценката разглежда инвестициите по отношение на икономиката, социалната сфера, околна среда, управление и функционално – пространствено развитие. Направените анализи акцентират върху проектните дейности и не разглеждат резултатите от изпълнението на основните и регулярни дейности на общинската администрация.

## **Отчетен период**

---

Междинната оценка изследва интегрираното общинско развитие в периода между 2021 и 2023г. Фокусът е поставен върху проекти, проектни идеи, дейности и резултати, които са реализирани или са в процес на реализация за периода на действие на ПИРО. В настоящия документ са включени проекти, които са изпълнявани през 2021, 2022 и 2023г.

## **Процес по разработване, наблюдение и оценка на ПИРО**

---

Планът за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027 г. (ПИРО) е приет с Решение №297 на Общинския съвет от 29.03.2021 г. ПИРО е със 7-годишен период на действие.

ПИРО е основният стратегически документ за управление на общината и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Дряново за периода 2021-2027 г. Документът обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво с дефинирана визия, цели и приоритети, свързани общо от стремежа към висок жизнен стандарт на хората в общината, устойчиво развитие на територията и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен централен регион (СЦР).

Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗРР ПИРО на община Дряново осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на община Дряново.

Визията и целите изразяват желанието за бъдещото състояние на общината, докато приоритетите представят необходимите действия на общинската администрация и нейните партньори за постигане на това състояние. Формулирането на стратегията се основава на т.нар. „интегриран подход“, при който отделните приоритети не са дефинирани като ограничен сектор, а като комплекс от допълващи се теми. По идентичен начин отделните приоритети и обвързаните с тях мерки и проекти, създават съвместни резултати и продукти в търсенето на обща добавена стойност за общината. Приоритетите включват мерки и конкретни проекти, като проектите са остойностени в обобщени индикативната финансова таблица на ПИРО. Неразделна част от документа са и инструментите за неговото наблюдение и оценка, включително планирани индикатори и порядък от действия. Важна роля сред тях заема изготвянето на Междинната оценка.

Фигура 1. Процес по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО



**Междинната оценка** е нормативно планирана за средата на програмния период – 2024г. Нейната роля е да анализира и оцени изпълнението на ПИРО в първата половина от неговия период на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години. Значението на Междинната оценка е свързано с две основни направления:

- Оптимизиране съдържанието и изпълнението на ПИРО до края на програмния период;
- Осигуряване на основа за изготвянето на Последваща оценка на ПИРО 2021 – 2027г.

**Последващата оценка** следва да се изготви с натрупване от 2021г., тоест да включва и резултатите от Междинната оценка. По този начин констатациите на настоящия документ са неразделна част от общата оценка на общинското развитие между 2021г. и 2027г. Според процеса по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО, Последващата оценка ще се изготвя през 2028г., когато новият средносрочен стратегически документ на общината за периода 2028 – 2034г. вече ще бъде разработен и ще се изпълнява. При тази последователност, констатациите на Междинната оценка ще бъдат основа за стратегическото планиране през следващия програмен период.


## Структура

Междинната оценка включва четири елемента, дефинирани от чл.33 (2) от ЗРР:

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. Оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки за изпълнението.



Фигура 2. Структура на Междинната оценка

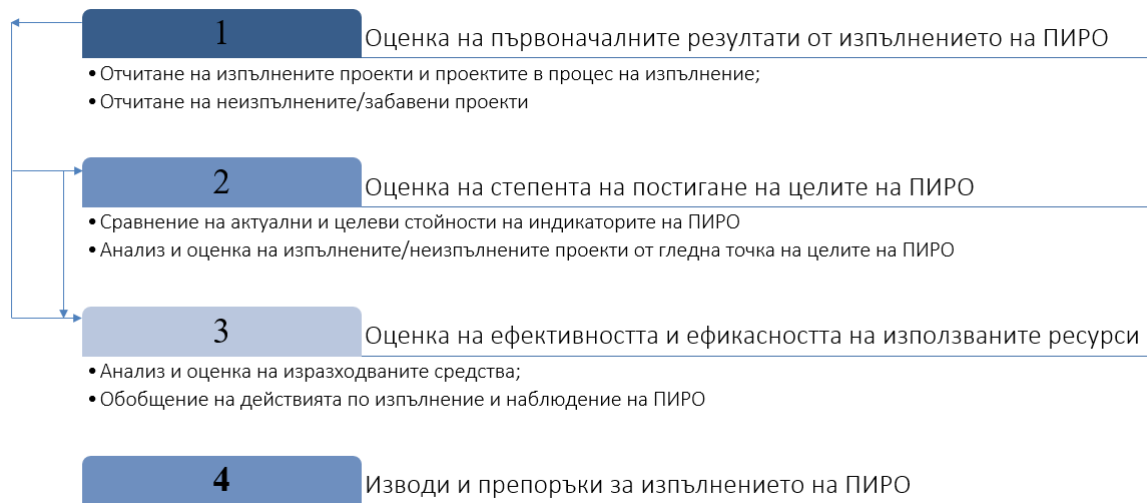

Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълнението на ПИРО, докато четвъртият включва предложения за промени в ПИРО или в начините на неговото приложение.

Елемент 1. Оценката на първоначалните резултати от изпълнението е свързан с общ преглед на проектите и инициативите с принос към плана – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. На този етап са систематизирани различни проекти и инициативи и се определя тяхната принадлежност към съответния приоритет. Първата преценка завършва с идентифициране на неизпълнени ключови проекти и мерки.

Елемент 2. Оценката на степента на постигане на съответните цели оценява степента в изпълнението на целите и приоритетните области, като надгражда оценката на първоначалните резултати. Стойностите на систематизираните проекти и инициативи са обобщени в обща финансова оценка за изпълнението на ПИРО. В този елемент са сравнени актуалните и целевите стойности на индикаторите на ПИРО.

Елемент 3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси се аргументира от съотношението между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на целите и приоритетите на ПИРО. Този трети компонент синтезира информацията за проектите и индикаторите от предните части и добавя обзор на предприетите действия по изпълнението и наблюдението на ПИРО – основна предпоставка за ефективност и ефикасност в управлението.

Елемент 4. Изводи и препоръки за изпълнението отразява най-важните констатации на МО и техните причини. Изводите са ориентирани спрямо трите основни теми в оценката:

- Проекти и инициативи;
- Индикатори;

- Действия по изпълнението и наблюдението на плана.
- Конкретните препоръки са базирани на изводите и са разделени в две групи:
- Препоръки относно съдържанието на ПИРО, включително необходимостта от актуализация
- Препоръки за усъвършенстване на процесите по изпълнението и наблюдението на ПИРО.

## Информационно осигуряване

---

Извършването на Междинната оценка на изпълнението на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2023г., се базира на следните информационни източници:


- План за интегрирано развитие на Община Дряново;
- Справки и данни от Националния статистически институт;
- Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО за 2021г., 2022г. и 2023г.
- Разчети за финансиране на капиталовите разходи на Община Дряново за 2021г., 2022г., 2023г.
- Информация от ИСУН за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, съфинансирани от Европейските фондове;
- Справки от общинска администрация и Общински съвет – Дряново;
- Различни стратегически и секторни документи на общинско и областно ниво.

## Приложими методи

---

Процесът на подготовка, разработване и приемане на Междинната оценка за периода 2021-2023 г. на ПИРО на Община Дряново преминава през следните основни етапи:

Фигура 3. Основни етапи на Междинната оценка



За целите на Междинната оценка са приложени следните методи за анализ:

- Структуриране и съдържателно проучване на информацията;
- Проследяване на изменението на стойностите на индикаторите спрямо базовия сценарий;
- Идентифициране на тенденции по изследвани области;
- Вторичен преглед на данни при идентифициране на противоречащи си тенденции и/или изводи;

- Графично и таблично изобразяване на данни, факти, тенденции;
- Експертни заключения относно изследваните области;
- Дефиниране на слаби места и предложения за подобрене и оптимизиране на процеси.
- Приложени са следните основни видове анализ:
- Анализ на средата, преглед и оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО;
- Анализ и оценка за степента на постигане на целите;
- Анализ на промените в контекста на плана за развитие;
- Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на ПИРО чрез сравнение на данни, факти, показатели и резултати;
- Анализ на инвестираните финансови ресурси спрямо предварително определените за постигане на заложените цели. Отчитане на ефективност и ефикасност на използваните ресурси.

За постигане на по-голяма обективност при оценката е използвана, посочената в таблица 1. Скала за качествена оценка на количествени показатели.

Таблица 1. Скала за качествена оценка на количествени показатели

Съотношение на изпълнение (в %)	Качествена оценка на изпълнението
От 0 до 1	Неизпълнение
От 1 до 25	Незадоволително изпълнени
От 26 до 50	Добро изпълнение
От 51 до 70	Много добро изпълнение
От 71 до 100	Отлично изпълнение
Над 100 (преизпълнен)	Изключително изпълнение/ над очакванията

Изготвеният Доклад за резултатите от Междинната оценка на ПИРО се внася за обсъждане и одобряване от Общински съвет – Дряново, съгл. чл.26 (1) от Правилника за прилагане на ЗРР. След приемането му от Общински съвет, Докладът от Междинната оценка се публикува на интернет страницата на общината и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

# I. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

## 1.1. Обща характеристики на изпълнените проекти и инициативи

Оценката на първоначалните резултати се основава на списъка с проекти в План за интегрирано развитие на община Дряново за периода 2021 – 2027 год. (ПИРО), разработен и попълнен за целите на Междинната оценка, Годишните доклади за наблюдение изпълнението през 2021, 2022 и 2023 г. на ПИРО, отчети за изпълнението на капиталовите разходи за 2021, 2022 и 2023г. и обобщение на проекти и инвестиции с отношение към ПИРО. Основните източници на информация са допълнени с по-детайлно проучване на единични проекти с оглед точно определяне на тяхното съответствие с приоритетите и мерките в ПИРО.

Обект на наблюдение и оценка са четири категории проекти, проектни идеи и дейности:

1. Проекти и дейности, които са реализирани или в процес на реализация с висока степен на съответствие спрямо проектите от Програмата за реализация на ПИРО;
2. Проекти и дейности, които са в реализирани или са в процес на реализация, но не са включени в Програмата за реализация на ПИРО, но имат принос към изпълнение на мерките в ПИРО;
3. Оценени проектни предложения с предстояща реализация;
4. Разработени проектни предложения в процес на оценка.

Последните две категории са свързани с бъдеща или потенциална реализация, които съответстват на мерките от Приоритетите на ПИРО. Независимо, че за разработените проектни предложения в процес на оценка няма сигурност за резултата към момента на изготвяне на настоящата Междинна оценка, те са разгледани като неразделна част от предприетите действия от общинската администрация за развитие на общината и реализиране на средносрочния планов документ.

При извършване на оценката са идентифицирани проекти/ дейности, които допринасят за изпълнение на отделна мярка и за които е изразходван публичен ресурс. Те са съотнесени към проект – мярка в зависимост от тематичното им направление.

Степента на изпълнението е оценена на база напредъка по конкретни проекти/дейности.

Принос на Междинната оценка е систематизирането на всички разгледани проекти и дейности, заедно с посочване на техните основни характеристики.

## 1.2. Подробен преглед на проектите в програмата за реализация на ПИРО

### 1.2.1. Напредък по изпълнението на Приоритет 1.1.

В Приоритет 1.1. са включени 7 мерки:

Мярка 1.1.1. Изграждане на активен позитивен имидж на общината като инвестиционна дестинация

Мярка 1.1.2 Създаване на подходяща инвестиционна среда за привличане на стратегически инвеститори

Мярка 1.1.3. Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за създаване на нови МСП

Мярка 1.1.4. Финансиране на стартапи

Мярка 1.1.5. Развитие на цифровата инфраструктура

Мярка 1.1.6. Насърчаване на преход към Индустрия 4.0

Мярка 1.1.7. Развитие на публично-частни партньорства

#### Описание на напредъка по Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“

Мярка 1.1.1. Изграждане на активен позитивен имидж на общината като инвестиционна дестинация  
Не е отчетен напредък

Мярка 1.1.2. Създаване на подходяща инвестиционна среда за привличане на стратегически инвеститори  
Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

В обхвата на мярката са включени 2 дейности

- Изграждане на индустриална зона - в източната част на град Дряново – без напредък
- Изготвяне и цифровизация на кадастрални карти на малките населени места в община Дряново

През 2023г. се извършва цифровизация на нецифровизирани пространствени данни (Дигитализация, Гео рефериране, трансформация и оцифряване на текущи регулационни, за строителни, кадастрални планове и др.).

Мярка 1.1.3. Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за създаване на нови МСП

#### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

*Изпълнен*

За напредък по изпълнение на мярката допринасят 8 реализирани проекта на частни бенефициенти

През 2021г. приключва изпълнението на 2 проекта, финансирани от ОПИК 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19

BG16RFOP002-2.077-0097-C01, частен бенефициент, с. Царева ливада

BG16RFOP002-2.077-0096-C01, частен бенефициент, с. Царева ливада

През 2021г. приключва изпълнението на 1 проект, финансиран от ОПИК 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-2.091 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19

BG16RFOP002-2.091-0556-C01, частен бенефициент, 2021, гр. Дряново

През 2021г. приключва изпълнението на 5 проекта, финансирани от ОПИК 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19

BG16RFOP002-2.089-0192-C01, частен бенефициент, 2021, с. Геша

BG16RFOP002-2.089-2690-C01, частен бенефициент, 2021, гр. Дряново

BG16RFOP002-2.089-0302-C01, частен бенефициент, 2021, гр. Дряново

BG16RFOP002-2.089-1292-C01, частен бенефициент, 2021, с. Соколово

BG16RFOP002-2.089-2896-C01, частен бенефициент, 2021, гр. Дряново

#### **Мярка 1.1.4. Финансиране на стартъпи**

##### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

*В процес на изпълнение*

За напредък по изпълнение на мярката допринася 1 проект, който е в процес на изпълнение - BG06RDNP001-19.506-0003-C01 Закупуване на нова техника за пречистване, йонизиране и преструктуриране на вода, (18.11.2022 - 30.06.2025), МИГ, ПРСР, частен бенефициент гр. Дряново. Целта на проекта е създаване на нов бизнес на територията на община Дряново за продажба на алкална, йонизирана и преструктурирана вода за местното население със здравословна цел.

#### **Мярка 1.1.5. Развитие на цифровата инфраструктура**

Не е отчетен напредък

#### **Мярка 1.1.6. Насърчаване на преход към Индустрия 4.0**

Не е отчетен напредък

Мярка 1.1.7. Развитие на публично-частни партньорства  
Не е отчетен напредък

*Допълнени* Допълнените проекти, допринасящи за изпълнение на Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“

Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

За напредък по изпълнение на мярката допринасят 5 проекта, финансирани от ОПРЧР 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-1.081 МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“:

- проект BG05M9OP001-1.081-0012-C01 Подобряване условията на труд в „Ес Ди Комерс“ ЕООД – Дряново (01.10.2021 - 26.01.2023), ОПРЧР, частен бенефициент
- проект BG05M9OP001-1.081-0005-C01 Подобряване на условията на труд на служителите в "А и Г Казакови" ООД, гр. Дряново (28.06.2021- 16.06.2023), ОПРЧР, частен бенефициент
- проект BG05M9OP001-1.081-0003-C01 Висока работоспособност и жизнеспособност на служителите в ЕТ „Вега - Валентин Жоров“ (13.10.2021 - 26.01.2023), ОПРЧР, частен бенефициент
- проект BG05M9OP001-1.081-0010-C01 Подобряване условията на труд на работниците в „Мортали“ ООД, гр. Дряново (13.10.2021 - 26.01.2023), , частен бенефициент гр. Дряново
- проект BG05M9OP001-1.081-0002-C01 По-добро здраве и работоспособност на служителите в „УНИТРАФАД“ ООД, (27.09.2021 - 26.01.2023), ОПРЧР, частен бенефициент, с. Соколово.

Проектите са изпълнени периода 2021 – 2023 година.

## 1.2.2. Напредък по изпълнението на Приоритет 1.2.

В Приоритет 1.2. са включени 5 мерки:

Мярка 1.2.1. Стимулиране на въвеждането на нови технологии и иновативни практики

Мярка 1.2.2. Създаване на центрове за върхови постижения, местни лаборатории за технологични изпитвания и др.

Мярка 1.2.3. Развитие на информационните и комуникационни технологии и online услугите

Мярка 1.2.4. Насърчаване на фирми, реализиращи производствени модели в подкрепа на кръговата икономика

Мярка 1.2.5. Стимулиране на иновационната активност на предприятията съгласно Стратегията за интелигентна специализация 2021-2027 г.

## Описание на напредъка по Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите“

### Мярка 1.2.1. Стимулиране на въвеждането на нови технологии и иновативни практики

#### Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

В ПИРО е посочена дейност, свързана с дигитализация на музейни, библиотечни и читалищни фондове, по която не е отчетен напредък.

За напредък по изпълнение на мярката допринасят 2 приключили проекта и 3 в процес на изпълнение на частни бенефициенти.

През 2022г. приключва изпълнението на:

- проект BG16RFOP002-2.031-0012-C02 Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Металолеене – Дряново“ ООД, (15.03.2021-16.05.2022), Процедура BG16RFOP002-2.031 МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ – „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, ОПИК, частен бенефициент гр. Дряново
- проект BG16RFOP002-2.040-0707-C01 Подобряване на производствения капацитет на Унитраф АД (01.12.2020 - 02.02.2022), BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП, ОПИК, частен бенефициент, с. Соколово

В процес на изпълнение е:

- проект BG06RDNP001-19.506-0001-C01 Придобиване на мини верижен товарач от „Олимпс“ ЕООД (12.05.2023 - 12.05.2025), Процедура BG06RDNP001-19.506 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, частен бенефициент

През 2023г. започва изпълнението на 2 проекта по Процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация на НПВУ

- BG-RRP-3.004-0048-C01, частен бенефициент, 2023 - 2024, гр. Дряново
- BG-RRP-3.004-2040-C01, частен бенефициент, 2023 - 2024, с. Соколово



- Мярка 1.2.2.** Създаване на центрове за върхови постижения, местни лаборатории за технологични изпитвания и др.  
Не е отчетен напредък
- Мярка 1.2.3.** Развитие на информационните и комуникационни технологии и online услугите  
**Отчетен напредък**  
Описание на изпълнението:  
За напредък по изпълнение на мярката допринасят 1 приключил проект и 3 в процес на изпълнение на частни бенефициенти.  
През 2021г. приключва:
- проект BG16RFOP002-2.083-0060-C01, частен бенефициент, 2021, финансиран от ОПИК по Процедура BG16RFOP002-2.083 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.
- През 2023г. започва изпълнението на 3 проекта, финансирани от НПВУ по Процедура BG-RRP-3.005 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
- проект BG-RRP-3.005-1365-C01, частен бенефициент 2023-2024, с. Царева ливада
  - проект BG-RRP-3.005-4609-C01, частен бенефициент 2023-2024, с. Геша
  - проект BG-RRP-3.005-3851-C01, частен бенефициент 2023-2024, гр. Дряново
- Мярка 1.2.4.** Насърчаване на фирми, реализиращи производствени модели в подкрепа на кръговата икономика  
**Отчетен напредък**  
Описание на изпълнението:  
За напредък по изпълнение на мярката допринасят 5 приключили проекта на частни бенефициенти.  
През 2023г. приключва изпълнението на 5 проекта, финансирани от ОПИК по Процедурата BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“
- проект BG16RFOP002-6.002-0360-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, (16.09.2022 - 15.07.2023), ОПИК, частен бенефициент
  - проект BG16RFOP002-6.002-0888-C02 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност (16.09.2022 - 16.07.2023), ОПИК, частен бенефициент гр. Дряново

- проект BG16RFOP002-6.002-0044-C02 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност (21.09.2022 - 21.07.2023), ОПИК, частен бенефициент гр. Дряново
- проект BG16RFOP002-6.002-0853-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност (16.09.2022 - 16.07.2023), ОПИК, частен бенефициент, с. Царева ливада
- проект BG16RFOP002-6.002-0653-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност (16.09.2022 - 16.03.2023), ОПИК, частен бенефициент, с. Соколово

**Мярка 1.2.5. Стимулиране на иновационната активност на предприятията съгласно Стратегията за интелигентна специализация 2021-2027 г.  
Не е отчетен напредък**

### 1.2.3. Напредък по изпълнението на Приоритет 1.3.

В Приоритет 1.3. са включени 9 мерки:

Мярка 1.3.1. Придобиване на ключови знания и умения

Мярка 1.3.2. Създаване на програми за гъвкави системи за квалификация и преквалификация включително на безработни

Мярка 1.3.3. Насърчаване на младежката заетост

Мярка 1.3.4. Насочване на образованието и обучението към изграждане на умения и компетентности в съответствие с местния пазар на труда

Мярка 1.3.5. Мерки за подобряване на услугите по активиране, помощ при търсенето на работа, съответствие между търсене и предлагане, преквалификация и индивидуализирани услуги за нискоквалифицираната работна ръка

Мярка 1.3.6. Насочване на образованието и обучението към изграждане на умения и компетентности в съответствие с местния пазар на труда

Мярка 1.3.7. Подкрепа за самонаети лица и начинаещи предприемачи чрез професионална квалификация и обучение на безработни, включително и тези от рискови групи

Мярка 1.3.8. Подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение

Мярка 1.3.9. Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и заетост

**Описание на напредъка по Приоритет 1.3. „Откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта“**

**Мярка 1.3.1. Придобиване на ключови знания и умения**  
**Не е отчетен напредък**

**Мярка 1.3.2. Създаване на програми за гъвкави системи за квалификация и преквалификация включително на безработни**  
**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

За напредък по изпълнение на мярката допринася изпълнението проект „Заетост за теб“ на ОП „Чисто Дряново“.

Проектът започва през януари 2022 г. в изпълнение на договор между ОП „Чисто Дряново“ и Агенция по заетостта в края на 2021 г. По проекта са назначени двама работника за срок от шест месеца, като след приключване на проекта и извършен подбор, един от работниците беше трайно назначен в ОП „Чисто Дряново“. Тези работници са включени в дейностите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и поддържане на парковете. Стойността на проекта е 8 028 лв., като с тези средства са осигурени трудовите възнаграждения на работещите по проекта и осигурителните им вноски, за срока на действие на проекта.

**Мярка 1.3.3. Насърчаване на младежката заетост**  
**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

За напредък по изпълнение на мярката допринася приемане на „Общински план за младежта“ в началото на 2022 г.

По Национална програма „Активиране на неактивни лица“: Младши специалист, младежки медиатор – 1 работно място. Национална програма „Старт в кариерата“: Младши експерт – 1 работно място.

**Мярка 1.3.4. Насочване на образованието и обучението към изграждане на умения и компетентности в съответствие с местния пазар на труда**  
**Не е отчетен напредък**

**Мярка 1.3.5. Мерки за подобряване на услугите по активиране, помощ при търсенето на работа, съответствие между търсене и предлагане, преквалификация и индивидуализирани услуги за нискоквалифицираната работна ръка**  
**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

За напредък по изпълнение на мярката допринасят реализираните проекти на Община Дряново.

През 2023г. приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-1.107-0002-C01 „Постигане на социално-икономическо развитие на територията на община Дряново чрез осигуряване на нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и подобряване условията и качеството на живот“ (10.05.2021 - 23.01.2023), BG05M9OP001-1.107 МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“, ОПРЧР, Бенефициент Община Дряново. По проекта са осигурени 14 работни места за „Работник горско стопанство“.

По проект BG05SFPR002-2.002-0019-C01 „Укрепване на капацитета на Община Дряново за провеждане на устойчиви социални политики на местно ниво“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2023-2027 г., през 2023 г. е разкрит фронт-офис в с две работни места за срок от една година.

През 2022 г. са осигурени следните работни места по проекти на Община Дряново:

- Проект „Патронажна грижа +“ са разкрити работни места на длъжностите: чистач хигиенист – 16 работни места
- Проект „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и умствена изостаналост“ - 12 работни места
- Механизъм „Лична помощ“, за предоставяне на услугата „Личен асистент“ / Продължение от 2019 г. през Закона за личната помощ с ново назначаване на служителите през 2022 г./ - личен асистент – 44 работни места.
- Национална програма „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания“ Експерт /управление на собствеността /- 1 работно място, стартирала през 2020 г. с краен срок 19.10.2022 г.
- Регионална програма по заетостта – стартирала през 10.06. 2022 г. и приключила на 10.12.2022 г., Сезонен работник – 15 работни места.
- Национална програма „Активиране на неактивни лица“: Младши специалист, младежки медиатор – 1 работно място.
- Национална програма „Старт в кариерата“: Младши експерт – 1 работно място.

По всички изброени програми и проекти са назначени общо 102 работници.

- Мярка 1.3.6. Насочване на образованието и обучението към изграждане на умения и компетентности в съответствие с местния пазар на труда (Дублира мярка 1.3.4.)  
Не е отчетен напредък
- Мярка 1.3.7. Подкрепа за самонаети лица и начинаещи предприемачи чрез професионална квалификация и обучение на безработни, включително и тези от рискови групи  
Не е отчетен напредък
- Мярка 1.3.8. Подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение  
Отчетен напредък  
Описание на изпълнението:  
Социално-икономическата интеграция е процес, който изисква продължителни и целенасочени усилия по отношение на децата и семействата. Това е и целта на заложената дейност за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги.  
През 2023г. приключва проект BG05M9OP001-2.082-0010-C01 „Подкрепа за трудова реализация на лица с интелектуални затруднения настанени в защитени жилища“ (21.05.2020 - 21.05.2023), финансиран от ОПРЧР 2014-2020г., бенефициент: Сдружение „Дружество за умствено и психически увредени лица“, гр. Дряново  
Чрез проект е оказана подкрепа на настанените лица с различни степени на умствена изостаналост- мъже и жени в две защитени жилища в с. Царева ливада, Община Дряново за включване в пазара на труда, по начин, отговарящ на техните потребности и възможности.  
Постигнат индикатор: Възрастни с увреждания, получили достъп до услуги за социално включване – 18 бр.
- Мярка 1.3.9. Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и заетост  
Не е отчетен напредък

#### 1.2.4. Напредък по изпълнението на Приоритет 1.4.

В Приоритет 1.4. са включени 4 мерки:

Мярка 1.4.1. Популяризиране на културното наследство на общината и развитие на културния туризъм

Мярка 1.4.2. Подкрепа на инициативи за създаване на туристически продукти в областта на селския туризъм

Мярка 1.4.3. Обособяване на нови и рехабилитация на съществуващи екопътеки и туристически маршрути с цел развитие на екотуризма

Мярка 1.4.4. Развитие на MICE туризъм: целенасочена рекламна кампания, привличане на специализирани събития, разработване на инсентив пакети

#### Описание на напредъка по Приоритет 1.4. „Развитие на туризма“

**Мярка 1.4.1. Популяризиране на културното наследство на общината и развитие на културния туризъм**

##### Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

През 2023г. е подписан договор за БФП за проект BG06RDNP001-19.732-0001-C02 „Опознай Дряновския край с работи екскурзоводи“ (05.12.2023- 30.06.2025), Процедура BG06RDNP001-19.732 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Бенефициент: НЧ „Дряновска пробуда-2008“, Обща стойност на проекта: 69 726,19 лв., съфинансиране на бенефициента 3 000 лв.

Изпълнени дейности, допринасящи за популяризиране на културното наследство в общината:

2021 година:

- Заснет филм за Дряново за туристическото предаване „Компас“ на Румънската национална телевизия.
- Провеждането на събори, фестивали, концерти, семинари, чествания и др. допринасят за популяризиране на Дряново като целогодишна туристическа дестинация: първото издание на Фит Фес – Дряново (април), домакин на спектакъла „Царете на магията“, както и на кръг от Националния рали – спринт шампионат (май); 19-то издание на Националния събор „От дума на дума, от песен на песен“ (юни) и др.
- Подкрепа на инициативи за създаване на туристически продукти в областта на селския туризъм

2022 година:

- Реализиране на събития от културния календар, организирани и в партньорство с Община Дряново с Министерство на туризма и периодично в Министерство на културата.

- Заснети 10 кратки рекламни видеа за забележителности и събития в Дряново;
- Монтирани девет табели до основните забележителности в град Дряново. Всеки обект е представен чрез стилизирано изображение, основна информация на български и английски език и QR код, който при сканиране отвежда към страница с повече данни. Изработена и поставена е обновена винилова карта на града, с основните туристически и културни обекта (ул. Шипка, до църква „Св. Никола“). Изработени и монтирани са двуезични информационни табели за туристическите обекти в град Дряново.
- Проведени 2 заседания на Консултативния съвет по туризъм, както и периодични срещи с отделните представители, във връзка с текущи дейности и въпроси, касаещи изпълнението на годишната програма за туризма.

**Мярка 1.4.2. Подкрепа на инициативи за създаване на туристически продукти в областта на селския туризъм**  
**Не е отчетен напредък**

**Мярка 1.4.3. Обособяване на нови и рехабилитация на съществуващи екопътеки и туристически маршрути с цел развитие на екотуризма**  
**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През 2023г. се изпълнява проект BG06RDNP001-19.376-0005-C01 Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера (05.01.2023 - 30.06.2025), BG06RDNP001-19.376 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, ППСР, Бенефициент Община Дряново.

Дата на сключване на договора - 05.01.2023.

Обща стойност на проекта: 54 775,35 лв.

**Мярка 1.4.4. Развитие на MICE туризъм: целенасочена рекламна кампания, привличане на специализирани събития, разработване на инсентив пакети**  
**Не е отчетен напредък**

## 1.2.5. Напредък по изпълнението на Приоритет 1.5.

В Приоритет 1.5. са включени 9 мерки:

Мярка 1.5.1. Стимулиране развитието на земеделие и животновъдство

Мярка 1.5.2. Модернизация на материалните активи и производствените фактори

Мярка 1.5.3. Повишаване информираността и професионалната квалификация на заетите в селското стопанство

Мярка 1.5.4. Насърчаване на внедряването на иновациите и обмена на знания в областта на храните и земеделието

Мярка 1.5.5. Модернизиране и разширяване на напоителните полета и внедряване на нови технологии за напояване

Мярка 1.5.6. Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и природосъобразно горско стопанство

Мярка 1.5.7. Устойчиво управление на горите и горския фонд

Мярка 1.5.8. Наблюдение, превенция и борба с пожарите

Мярка 1.5.9. Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите

### Описание на напредъка по Приоритет 1.5. „Развитие на селското и горското стопанство“

#### Мярка 1.5.1. Стимулиране развитието на земеделие и животновъдство

##### Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

С решение №264/28.01.2021г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №28) е приета Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Дряново. С Наредбата се определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Дряново и осъществяване на контрол върху санитарно – хигиенното състояние в населените места на територията на общината.

В подкрепа на земеделските производители Общината продължава дейността си по осигуряване на земеделските производители и животновъди със земеделски земи от общинския поземлен фонд.

За напредък по изпълнение на мярката допринасят реализираните частни проекти, финансирани по Програмата за развитие на селските



райони за периода 2014 - 2020 г. за развитие на земеделието и животновъдството.

В процес на изпълнение са 7 проекта по Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.:

- BG06RDNP001-6.007-1067-C01 Подобряване икономическото развитие и укрепване на стопанството на ДИ (22.03.2021 - 22.09.2025)
- BG06RDNP001-6.007-2092-C03 подобряване икономическото развитие и укрепване на стопанството на ЗИ (23.03.2021 - 23.09.2025)
- BG06RDNP001-6.007-1365-C02 Биологично отглеждане на пчелни семейства и подобряване на икономическото развитие в стопанството на Искра Христова (15.03.2021 - 15.09.2025)
- BG06RDNP001-6.007-1786-C02 Биологично отглеждане на пчелни семейства и подобряване на икономическото развитие в стопанството на Йорданка Митева Димитрова (16.03.2021 - 16.09.2025)
- BG06RDNP001-6.007-1265-C03 Подобряване на икономическото развитие и укрепване на стопанството на Пеньо Пенев (22.03.2021 - 22.09.2025)
- BG06RDNP001-6.007-1211-C02 Подобряване на икономическото развитие и укрепване на стопанството на Христо Станчев Тумбалов, (15.03.2021 - 15.09.2025)
- BG06RDNP001-6.007-0915-C04 Подобряване икономическото развитие и укрепване на стопанството на ЦЗ, (30.03.2021 - 30.09.2025)

В процес на изпълнение са 5 проекта по Процедура BG06RDNP001-6.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

- BG06RDNP001-6.012-0776-C01 Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Боян Радославов Генчев (20.12.2022 - 20.12.2027),
- BG06RDNP001-6.012-0441-C01 Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин РИД (20.12.2022 - 20.12.2027),

- BG06RDNP001-6.012-0486-C01 Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Райчо Маринов Радев (19.12.2022 - 19.12.2027), частен бенефициент,
- BG06RDNP001-6.012-0407-C01 Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Станислав Иванов Иванов (20.12.2022 - 20.12.2027),
- BG06RDNP001-6.001-0919-C02 Създаване и развитие на земеделско стопанство за отглеждане на трайни насаждения

## **Мярка 1.5.2. Модернизация на материалните активи и производствените фактори**

### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

За напредък по изпълнение на мярката допринасят реализираните проекти на частни проекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за развитие на земеделието и животновъдството – изпълнени 5 проекта и 3 са в процес на реализация.

По Процедура BG06RDNP001-4.008 Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година са реализирани 4 проекта:

- BG06RDNP001-4.008-0223-C05 Закупуване на машини и оборудване за кравеферма, частен бенефициент (28.03.2022 - 28.03.2024),
- BG06RDNP001-4.002-0137-C02 Закупуване на шредер, моторна пръскачка и лозаро - овощарска ножица от земеделски стопанин ДЦИ (04.02.2021 - 04.02.2023)
- BG06RDNP001-4.008-0522-C02 Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Ереджеб Мехмедов, чрез закупуване на земеделска техника (05.04.2022 - 01.10.2023)
- BG06RDNP001-4.009-0035-C04 Закупуване на земеделска техника от земеделския стопанин Ц.Д.З. (14.12.2022 - 15.09.2023)

В процес на изпълнение са 3 проекта:

- BG06RDNP001-4.015-0254-C01 „Предприятие за преработка и съхранение на плодове-малини“ (15.08.2023 - 15.06.2025)
- проект BG06RDNP001-4.012-0764-C02 Закупуване на машини и оборудване за модернизиране на кравеферма (26.01.2023 - 26.01.2025)
- BG06RDNP001-4.014-0131-C01 „Закупуване на автоматична система за динамично претегляне и етикетиране и

специализирано, триосно полуремарке за превоз на животни за предприятие за месопреработка, находящо се в с. Соколово, община Дряново, област Габрово“ (29.09.2023 - 15.06.2025)

Процедура BG06RDNP001-19.115 МИГ Дряново - Трявна Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е реализиран 1 проект:

- BG06RDNP001-19.115-0001-C01 Инвестиции в модернизация на земеделско стопанство (29.01.2020 - 29.01.2022)

**Мярка 1.5.3. Повишаване информираността и професионалната квалификация на заетите в селското стопанство**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През 2023г. приключи проект BG06RDNP001-19.375-0001-C01 Увеличаване на пазарния дял и повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопани чрез възможности за професионална квалификация (18.01.2022 - 30.06.2023), МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, ПРСР, частен бенефициент

**Мярка 1.5.4. Насърчаване на внедряването на иновациите и обмена на знания в областта на храните и земеделието**

Не е отчетен напредък

**Мярка 1.5.5. Модернизиране и разширяване на напоителните полета и внедряване на нови технологии за напояване**

Не е отчетен напредък

**Мярка 1.5.6. Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и природосъобразно горско стопанство**

Не е отчетен напредък

**Мярка 1.5.7. Устойчиво управление на горите и горския фонд**

*Отчетен напредък*

**Описание на изпълнението:**

През 2023г. е подписан договор BG06RDNP001-8.005-0002-C01 Залесяване на земеделски земи в землището на с. Керека, общ Дряново (28.02.2023 - 28.02.2025), Процедура BG06RDNP001-8.005 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

#### **Мярка 1.5.8. Наблюдение, превенция и борба с пожарите**

##### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През 2023г. се изпълнява Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025 г. на основание чл. 6д, ал.1 от Закона за защита при бедствия за изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. и Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. В нея е осъществена синергия с ПИРО и са изведени следните дейности за реализиране на оперативните цели на общинско ниво: Провеждане на общински етап от конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“; Провеждане на общински етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“; Провеждане на ученическите състезания по Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и други състезания, конкурси, викторини, учебни евакуации; Провеждане на информационно- разяснителни дейности във връзка с есенно-зимния отоплителен сезон, летния пожароопасен сезон, жътвена кампания и други; Публикуване на материали на сайта на общинска администрация за действия при съответна опасност (наводнения, земетресение, пожари и други рискове); Планиране на необходимите финансови средства за осигуряване на необходимото оборудване на територията на община Дряново - Съставни части на Единна спасителна Система; Дооборудване на доброволните формирания - лични предпазни средства и технически средства.

#### **Мярка 1.5.9. Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите**

##### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

В ПИРО е предвидена дейност: Превенция на риска от наводнения на територията на община Дряново - Изграждане подпорни стени и почистване на речни корита. Съвместно с Община Трявна за река Тревненска/Дряновска и с община Габрово за река Янтра

2021 година

На 07.12.2021 г. е извършено фактическо предаване на държавата, собствеността на следните язовири: „Рамадана“ в землището на гр. Дряново, „Чумашко дере“ в землището на с. Скалско, „Царева ливада“ в землището на с. Царева ливада. Сключването на договор за дарение между кмета на община Дряново и Областния управител на област

Габрово е в изпълнение на Решение №506/31-08-2918г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №58).

През 2021 г. със средства от капиталовата програма е извършено отводняване на пазар гр. Дряново и почистване и ремонт на отводнителна решетка на ул. „Шипка“; почистване речното корито от растителност в границите на урбанизираната територия на град Дряново за преодоляване на намалената проводимост на река Дряновка.

2022 година

- Изграждане подпорни стени и почистване на речни корита. Съвместно с Община Трявна за река Тревненска/Дряновска и с община Габрово за река Янтра

Във връзка с намалената проводимост на река Дряновска в границите на урбанизираната територия на град Дряново и с. Царева ливада, със заповед на кмета на Община Дряново работи Междуведомствена комисия със задача да направи оглед на речното корито на р. Дряновска в границите на урбанизираната територия на град Дряново. След решение на комисията, в границите на урбанизираната територия на град Дряново, през месец юли и август е почистено речното корито на р. Дряновска от растителност. Извършено е почистване коритото на дере, приток на река Дряновска, в участъка, преминаващ през с. Ганчовец.

- През 2022г. е разработена Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025 г. на основание чл. бд, ал.1 от Закона за защита при бедствия за изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. и Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

В нея е осъществена синергия с ПИРО и са изведени следните дейности за реализиране на оперативните цели на общинско ниво: Подпомагане дейността на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен при изготвяне и изпълнение на планове за намаляване на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2021-2027г.; публикуване на материали в сайта на общината

2023 година:

- Ремонт на Подпорна стена на ляв бряг на р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за ж.п. гара до съществуваща подпорна стена по течението

### 1.2.6. Напредък по изпълнението на Приоритет 1.6.

В Приоритет 1.6. са включени 2 мерки:

Мярка 1.6.1. Опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.

Мярка 1.6.2. Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа „Натура 2000“

#### Описание на напредъка по Приоритет 1.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“

Мярка 1.6.1. Опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.  
Не е отчетен напредък

Мярка 1.6.2. Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа „Натура 2000“  
Отчетен напредък  
Описание на изпълнението:  
През 2023г. продължава изпълнението на проект BG16M1OP002-3.032-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода BOMP в територията на МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, (26.04.2022 - 31.05.2024), МИГ, Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP“, ОПОС, Бенефициент НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ Фондация, Дряново и Трявна

### 1.2.7. Напредък по изпълнението на Приоритет 2.1.

В Приоритет 2.1. са включени 18 мерки:

Мярка 2.1.1. Осигуряване на условия за разширяване на обхвата на предучилищното образование и въвеждане на задължително образование за 4-годишните

Мярка 2.1.2. Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи училища

Мярка 2.1.3. Подкрепа за професионалните и специализирани училища

Мярка 2.1.4. Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и др. уязвими групи за придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от училищата;

Мярка 2.1.5. Изграждане на връзки между образованието, науката и бизнеса, насочени към развитието на общината

Мярка 2.1.6. Продължаване на действието на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование

Мярка 2.1.7. Продължаване на действието на Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Мярка 2.1.8. Синхронизиране на план-приема на ученици в професионалните училища, в съответствие с потребностите на реалния бизнес и спецификите на общината

Мярка 2.1.9. Развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.

Мярка 2.1.10. Разработване на програми за привличане и задържане на децата в училище

Мярка 2.1.11. Приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности

Мярка 2.1.12. Прилагане на механизми за социална подкрепа

Мярка 2.1.13. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Мярка 2.1.14. Изграждане на капацитет, с цел подобряване на предлагането и достъпа до възможности за качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията/преквалификация на възрастни

Мярка 2.1.15. Осигуряване на по-лесен достъп до целеви обучения, информационни и демонстрационни дейности, особено за земеделските производители и горски стопани, обитаващи периферните и отдалечени райони

Мярка 2.1.16. Осигуряване на достъп до формите на учене през целия живот чрез културни институции (библиотеки, читалища, музеи), спортни организации и др., насочени към нови целеви групи със специфични потребности и живеещи в отдалечени места.

Мярка 2.1.17. Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните организации, бизнеса и местната власт

Мярка 2.1.18. Осигуряване на компютър за всяко дете. Засилване на употребата на ИКТ като част от модернизирания образователна инфраструктура (посредством подкрепа за обновяване, осигуряване на достъп за хора с увреждания и др.)

**Описание на напредъка по Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на общината“**

**Мярка 2.1.1. Осигуряване на условия за разширяване на обхвата на предучилищното образование и въвеждане на задължително образование за 4-годишните**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

Всички, подлежащи на задължително обучение в подготвителна група ромски деца са обхванати на 100%. В детската градина се обхващат все повече деца още от 3 годишна възраст, което предполага по-добро овладяване на българския език, придобиване на умения и навици и по-висока степен на готовност на тези деца за училище.

Изпълнен: BG05M2OP001-3.013-0001-C02 „Учим и творим днес, за да успеем утре“ (03.04.2020 - 03.08.2022), МИГ, ОПНОИР, Бенефициент Детска градина „Детелина“

**Мярка 2.1.2. Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи училища**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

Община Дряново е обезпечила достъпа до образование до всички деца, живеещи в града и в селата на общината чрез осигурен специализиран транспорт до средищното училище СУ „Максим Райкович“.

**Мярка 2.1.3. Подкрепа за професионалните и специализирани училища**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През 2022г. приключва изпълнението на проект BG05M2OP001-3.013-0004-C02 „Професионалното образование - традиция и нови възможности“ (07.08.2020 - 10.11.2022), финансиран от ОПНОИР, МИГ, Бенефициент Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“, гр. Дряново

Дейности: подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование; допълнително обучение за преодоляване на образователни затруднения; взаимодействие с родители; провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи и насърчаване общуването и съвместните изяви между учениците от маргинализирани и не



маргинализирани групи, обучаващи се в образователната институция на територията на община Дряново чрез допълнителни образователни услуги.

Постигнати индикатори:

1. Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция - 31.00 бр..
2. Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система - 24.00 бр.

Всички учебни заведения участват активно при кандидатстване по обявените за „ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование“,

**Мярка 2.1.4. Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и др. уязвими групи за придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от училищата**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През анализирания период детските и учебните заведения продължават да реализират дейности, ориентирани към осигуряване на приобщаващо образование на ученици от малцинствата.

- През 2021 година е реализиран проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на МОН, сформирани 5 групи по 8 деца. 50% показват значителни резултати по овладяване на българския език.
- През 2022г. приключва изпълнението на проект BG05M9OP001-2.018-0049-C03 Заедно в различieto (21.03.2019 - 13.04.2022), финансиран от ОПРЧР 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Бенефициент Община Дряново

**Мярка 2.1.5. Изграждане на връзки между образованието, науката и бизнеса, насочени към развитието на общината**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През периода всички учебни заведения участваха активно при кандидатстване по Национални програми на МОН. Взето е участие по следните програми: Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, „Без свободен час“, „Иновации в действие“, „Отново заедно“, „Профилактика и рехабилитация на

педагогическите специалисти“, „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“.

- Мярка 2.1.6. Продължаване на действието на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“  
Не е отчетен напредък
- Мярка 2.1.7. Продължаване на действието на Национална програма „Обучение за ИТ кариера“  
Не е отчетен напредък
- Мярка 2.1.8. Синхронизиране на план-приема на ученици в професионалните училища, в съответствие с потребностите на реалния бизнес и спецификите на общината  
Не е отчетен напредък
- Мярка 2.1.9. Развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.  
Не е отчетен напредък
- Мярка 2.1.10. Разработване на програми за привличане и задържане на децата в училище  
Отчетен напредък  
Описание на изпълнението:  
Проведена е системна работа по задържане на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение, периодични срещи с родители на учениците от малцинствените групи, с цел свеждане до минимум на безпричинните отсъствия.
- Всички учебни заведения участват активно при кандидатстване по обявените за 2021 г. Национални програми на МОН: „Отново заедно“.
  - Продължава функционирането на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. (ПМС №100/08.06.2018г.). Извършени са 31 посещения по домовете от екипа за обхват.
  - Изготвен и приет Годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците община Дряново.

- В СУ „Максим Райкович“: кариерно ориентиране на ученици от ромския етнос; Реализирани дейности по привличане и работа с родителите на ученици от етническите малцинства. Прилага се Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците.

#### Мярка 2.1.11.

#### Приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности

##### Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

- Осигурена е подкрепяща среда за включване на деца със СОП в образователния процес.
- С родителите на децата със СОП работят ресурсни учители, училищен психолог, логопед, класни ръководители и преподаватели – предоставят се допълнителни консултации, осигурява се подкрепяща среда за социализация и интеграция.
- ДГ „Детелина“ участва в Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ на МОН. От 2021г. към детската градина е назначен психолог, който с работата си с деца и родители допринася за осъществяване на ефективна работа в посока на подпомагане на личностното развитие на всяко дете, чрез реализиране на различни форми на обща и допълнителна подкрепа.

#### Мярка 2.1.12.

#### Прилагане на механизми за социална подкрепа

##### Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

През отчетният период с грижа за образованието е приета Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново до 2024 г.

Община Дряново има традиция да подпомага талантиливи деца. Съгласно Правилника за стимулиране на деца с изяви дарби се осигурява еднократно финансово поощрение на ученици с постижения в различни сфери – образование, култура и др. В периода от 2020 г. – до 2023 г., със средства от общинският бюджет в размер на 12 740,00 лева, са поощрени 140 ученика с изяви дарби.

За периода 2020-2023 г., със средства от общинският бюджет, са отпуснати годишни стипендии за ученици от гимназиален курс, на стойност 100 лв. месечно за всеки стипендиант. Със Заповед на кмета на общината за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г. и 2022/2023 г. са отпуснати годишни стипендии на 31 ученици от гимназиален курс. За

учебната 2022/2023 г. за първи път бяха отпуснати и 8 стипендии за ученици с изявени дарби от 5 до 7 кл., на стойност 50 лв. месечно за всеки стипендиант.

Ежегодно се оказва финансова подкрепа на деца сираци и полусираци, на които предстои завършване на средно образование.

Мярка 2.1.13. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти  
Не е отчетен напредък

Мярка 2.1.14. Изграждане на капацитет, с цел подобряване на предлагането и достъпа до възможности за качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията/преквалификация на възрастни  
Не е отчетен напредък

Мярка 2.1.15. Осигуряване на по-лесен достъп до целеви обучения, информационни и демонстрационни дейности, особено за земеделските производители и горски стопани, обитаващи периферните и отдалечени райони  
Не е отчетен напредък

Мярка 2.1.16. Осигуряване на достъп до формите на учене през целия живот чрез културни институции (библиотеки, читалища, музеи), спортни организации и др., насочени към нови целеви групи със специфични потребности и живеещи в отдалечени места.  
Не е отчетен напредък

Мярка 2.1.17. Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните организации, бизнеса и местната власт  
Не е отчетен напредък

Мярка 2.1.18. Осигуряване на компютър за всяко дете. Засилване на употребата на ИКТ като част от модеризираната образователна инфраструктура (посредством подкрепа за обновяване, осигуряване на достъп за хора с увреждания и др.)  
Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

- Всички учебни заведения участват активно при кандидатстване по обявените за 2021 г. Национални програми на МОН: „Осигуряване на съвременна образователна среда“; „Училищна STEM среда“ и др.
- През ноември 2021г. се преминава към обучение в електронна среда във връзка с Ковид – 19. На учениците, които нямат

достъп до устройства и интернет са предоставени материали чрез образователния медиатор на СУ.

### 1.2.8. Напредък по изпълнението на Приоритет 2.2.

В Приоритет 2.2. са включени 15 мерки:

Мярка 2.2.1. Териториално фокусиране на интервенциите, което да подобри достъпа на населението до първична, специализирана и болнична помощ.

Мярка 2.2.2. Инвестиране в мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19

Мярка 2.2.3. Подобряване на материално-техническата база на лечебните заведения на територията на общината, както и повишаване на осигуреността им с медицинска апаратура и медицински специалисти

Мярка 2.2.4. Инициране участие и реализиране на програми и проекти в сферата на здравеопазването към Министерство на здравеопазването и Европейските структурни и инвестиционни фондове е

Мярка 2.2.5. Развитието на електронното здравеопазване

Мярка 2.2.6. Прилагане на мерки за намаляване на основни рискови за здравето фактори и подобряване профилактиката на болестите

Мярка 2.2.7. Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за лица с увреждания и възрастни граждани

Мярка 2.2.8. Създаване на други видове социални услуги (за спешно настаняване, ранна интервенция, консултативни за деца и семейства и т.н.)

Мярка 2.2.9. Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда

Мярка 2.2.10. Разработване на мерки за приобщаване на уязвимите групи

Мярка 2.2.11. Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение

Мярка 2.2.12. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт

Мярка 2.2.13. Подобряване на достъпа до изкуство

Мярка 2.2.14. Съхраняване, укрепване и популяризиране на културни и духовни празници и културни събития в общината

Мярка 2.2.15. Изготвяне и реализиране на програми за развитие на детско-юношеския и ученически спорт

**Описание на напредъка по Приоритет 2.2. „Подобряване на услугите и достъпността“**

**Мярка 2.2.1. Териториално фокусиране на интервенциите, което да подобри достъпа на населението до първична, специализирана и болнична помощ.**  
**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

Инвестиции в здравна инфраструктура

През 2021г. общинските инвестиции в здравната инфраструктура са насочени към Поликлиника, гр. Дряново са инвестирани финансови средства в размер на 270 523,00 за изпълнение на следните обекти::

- полагане на хидроизолация на ниска и високата част; подмяна на дограма на сградата и др.;
- Здравна служба, с. соколово - ремонт на здравна служба и околно пространство;
- Здравен дом, с. Гостилница - изграждане на нова ограда.

За осигуряване на качествена, навременна и адекватна здравна помощ на територията на община Дряново, през 2023 г. са инвестирани финансови средства за:

- модернизирание и дооборудване на рентгенов кабинет в Поликлиниката. Монтирана е рентгенова уредба за ортопантомографии с помощта на която се дава възможност за визуализиране на всички зъби, зъбодържачият апарат, челюстите и ставите. Инвестицията е в размер на 28 000 лева.

Единствената обособена структура в която медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на децата до 3 год. възраст са Детски ясли – Дряново.

- През 2021г. е закупено обзавеждане – 3 бр. и изградено видеонаблюдение със средства от общинския бюджет.

Общината изпълнява своите ангажименти в сферата на училищното здравеопазване – разкрити са здравни кабинети във всички учебни заведения с назначен медицински персонал, оказващ профилактично наблюдение, а при необходимост и първа долекарска помощ на децата и учениците.

**Мярка 2.2.2. Инвестиране в мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19**  
**Не е отчетен напредък**

- Мярка 2.2.3.** **Подобряване на материално-техническата база на лечебните заведения на територията на общината, както и повишаване на осигуреността им с медицинска апаратура и медицински специалисти**  
**Отчетен напредък**  
Описание на изпълнението:  
През 2023г. е подписан договор за проект BG06RDNP001-19.623-0001-C01 „Закупуване на физиотерапевтично оборудване за дейността на Медицински център Пулс“, находящ се в гр. Дряново П.К. 5370, общ. Дряново, обл. Габрово и адрес на управление ул. „Шипка“ № 164 (20.12.2023 - 30.06.2025), Процедура BG06RDNP001-19.623 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, ПРСР 2014-2020г.
- Мярка 2.2.4.** **Инициране участие и реализиране на програми и проекти в сферата на здравеопазването към Министерство на здравеопазването и Европейските структурни и инвестиционни фондове**  
**Не е отчетен напредък**
- Мярка 2.2.5.** **Развитието на електронното здравеопазване**  
**Не е отчетен напредък**
- Мярка 2.2.6.** **Прилагане на мерки за намаляване на основни рискови за здравето фактори и подобряване профилактиката на болестите**  
**Отчетен напредък**  
Описание на изпълнението:  
През мандата с финансови средства в размер на 68 030,00 лева бяха подпомогнати 98 млади семейства.
- По Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми живеещи на територията на Община Дряново е оказана финансова помощ в размер на 10 330,00 лева на 4 семейства.
  - 94 семейства получиха финансова помощ съгласно Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново. Изплатените средства, от бюджета на Община Дряново, са в размер на 57 070,00 лева.
- С решение на Общински съвет Дряново, през 2022 г. е приет Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в до училищна и училищна възраст на територията на Община Дряново.

- За периода от приемане на правилника са разгледани 19 заявления, одобрени и изплатени са общо 12 595,00 лева.

С решение на Общински съвет – Дряново, в края на 2021 г. е учреден „Общински социален фонд за подпомагане лечение на граждани от Община Дряново“.

- За периода от създаване на фонда са постъпили и са обработени общи 4 заявления за ползване на средства от фонда, одобрени и изплатени са общо 3 454,83 лева.

Община Дряново финансово подпомага лицата, настанени в Регионален хоспис, като за всяка календарна година заплаща 60 % от таксата за 3 лица за настаняване до 4 месеца.

- За подпомагане на нуждаещите се от настаняване, общо за изплатени средства в размер на 105 900,00 лева.

Ежегодно се подпомагат с лекарства болни с бъбречни заболявания за провеждане на хемодиализа.

#### Мярка 2.2.7.

#### **Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за лица с увреждания и възрастни граждани**

##### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През 2022г. е изпълнен проект BG16RFOP001-5.002-0018-C01 Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства (18.12.2018 - 22.02.2022), BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, ОПРЧР, Бенефициент Община Дряново

През периода е изпълнен проект BG05M9OP001-2.062-0003-C02 Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост (01.01.2021 - 01.09.2022), финансиран от ОПРЧР 2014-2020, Бенефициент Община Дряново

Изграждането на ЦСРИЛПРУИ е продиктувано от стартирания процес на извеждане на възрастни с увреждания от специализирани институции и предоставяне на възможности за тяхното социално включване. Целевата група включва, освен настанените в момента пълнолетни лица с психични разстройства и умствена изостаналост в специализирани институции и резидентни услуги в Община Дряново – около 140 души, също и хора, които имат психични разстройства и умствена изостаналост и живеят в общността, както и на техните семейства. Основната цел е подкрепа и придружаване в изграждането или възстановяване на умения за живот в общността чрез предоставяне на почасови и мобилни услуги в ЦСРИЛПРУИ. Работата на центъра ще допринесе и за превенция на социалното изключване



на хора, които сега живеят в общността и срещат затруднения, които са предпоставка за институционализиране, ако не са налице услуги за подкрепа.

Основните дейности по проекта включват: Ремонт на предоставените помещения за ЦСРИЛПРУИ; Обзавеждане и оборудване на ЦСРИЛПРУИ; Наемане на персона; Обучение и текуща подкрепа на персонала; Разработване на методика за предоставянето на услугите в ЦСРИЛПРУИ; Закупуване на автомобили; Осигуряване на дейността на ЦСРИЛПРУИ за период от 12 месеца.

Индикатори:

1. Участници над 18 г., получаващи социални услуги в общността – 60бр.

2. Лица над 18 г. – 60 бр.

През 2023г. приключва изпълнението на проект BG05M9OP001-2.090-0015-C02 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства - град Дряново, (01.09.2021 - 30.09.2023), финансиран от ОПРЧР 2014 – 2020, Бенефициент Община Дряново. Стойността е 1 716 151,79 лв.

Проектът осигури подкрепа на целевите групи чрез разкриване на 7 бр. социални услуги от резидентен тип - Център за грижа за лица с психични разстройства.

Седемте центъра са базирани в новопостроени по проект по ОПРР 2014-2020 седем двуетажни сгради, като всеки от тях е с капацитет от по 15 места или общо 105 потребителя.

В резултат на проекта е създадена на нова форма на социална услуга, чиято работа е фокусирана повече върху взаимодействието на индивида и средата в общността; формирани умения за живот на база индивидуалните възможности на хората, които ползват услугите; променени обществените нагласи към хората, които срещат затруднения, поради наличието на психически разстройства.

Индикатор:

2. Участници над 18 г., получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция и от психиатрични болници – 109 бр.

#### Мярка 2.2.8.

**Създаване на други видове социални услуги (за спешно настаняване, ранна интервенция, консултативни за деца и семейства и т.н.)**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През 2021г. приключва проект BG05M9OP001-2.101-0035-C02 Подкрепа в дома, финансиран от ОПРЧР 2014-2020г., по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Бенефициент: Община Дряново (15.04.2020 - 31.03.2021) на обща стойност 104 052,49 лв. БФП.

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Индикатор:

1. Участници над 18г., вкл. с увреждания, получаващи грижа във връзка с пандемичната ситуация – 86 бр.

През 2021г. приключва проект BG05M9OP001-2.103-0010-C01 Подкрепа в дома, финансиран от ОПРЧР 2014-2020г., по BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4, Бенефициент: Община Дряново (18.08.2020-18.02.2021) на обща стойност 54 936 лв. БФП.

Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Индикатор:

1. Участници над 18г., вкл. с увреждания, получаващи грижа във връзка с пандемичната ситуация – 51 бр.

През 2023г. приключва проект BG05M9OP001-6.002-0204-C01 Патронажна грижа + в община Дряново (28.09.2021 - 23.02.2023), ОПРЧР, Бенефициент Община Дряново.

По проекта са предоставени интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Индикатор:

1. Подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 – 363 бр.

През 2023г. приключва проект BG05M9OP001-6.004-0201-C01 Патронажна грижа + в община Дряново (29.11.2022 - 29.05.2023),

BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, ОПРЧР, Бенефициент Община Дряново.

По проекта са предоставени интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Индикатор:

1. Подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 – 294 бр.

През 2022г. приключва проект BG05FMOP001-5.001-0092-C09 3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Дряново (11.01.2021 - 30.09.2022), BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, ФЕПНЛ Храни, Бенефициент Община Дряново.

Услугата се предоставя при спазване на противоепидемичните мерки, принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Индикатор:

Лица – 16 бр.

През 2023г. е подписан АДФП за проект BG05SFPR003-1.001-0226-C01 Топъл обяд в община Дряново (01.03.2023- 30.09.2025), Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, Процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд, Бенефициент Община Дряново. В рамките на работните дни, ще се осигурява топъл обяд на 70 лица от различни рискови групи. Стойността на проекта е 170 580,48 лв.

През 2023г. е подписан АДФП за проект BG05SFPR002-2.001-0216-C01 „Грижа в дома в община Дряново“ (30.04.2023- 30.05.2024), Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 Грижа в дома, Бенефициент Община Дряново.

Проектът е насочен към осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Предвидените по проекта дейности ще обхванат минимум 95 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Стойността на проекта е 507 628,70 лв.

#### **Мярка 2.2.9. Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда**

##### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През периода по проекти на община Дряново е осигурена следната заетост:

- По ОПРЧР, проект „Заедно в различието“ – разкрити 15 работни места (януари – декември 2021г.)
- По Регионална програма за заетост – 6 работни места (юни – ноември)
- По Национална програма „Активиране на неактивни лица“ – 1 работно място (март 2021г. – декември 2024г.)
- По Национална програма „Старт в кариерата“ – 1 работно място (юни 2021 – юни 2022 г.)
- По Национална програма „Компонент 3 – Аварийни групи“ – 10 работни места (декември 2023г.)

**Мярка 2.2.10. Разработване на мерки за приобщаване на уязвимите групи**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

Общината Дряново успешно си партнира със службите на Дирекция „Социално подпомагане“ – изнесени работни места. Изпълнява се Програма за извършване на общественополезни дейности от лицата, имащи право на месечно социално подпомагане.

Община Дряново подпомага всички кампании на БЧК по раздаване на помощи от ЕС за нуждаещите се социално слаби лица.

**Мярка 2.2.11. Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

Не са изградени социални жилища.

За настаняване на нуждаещите се използва общинският жилищен фонд. Броят на общинските жилища към 31.12.2021г. е 20 (18 за граждани с установени жилищни нужди, 1 ведомствено и 1 резервно). През януари 2021г. е утвърден списък на 10 картотекирани лица, в които най-голям дял заемат чакащите от 4-та група – 6 лица, живеещи въз основа на свободно договаряне. Подадени са 3 заявления за установяване на жилищна нужда и картотекиране. Не са прекратявани наемни отношения.

- През периода е извършен ремонт на общинско жилище на ул. „Ген. Столетов“, гр. Дряново.

**Мярка 2.2.12. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт**

Не е отчетен напредък

Мярка 2.2.13. **Подобряване на достъпа до изкуство**

Не е отчетен напредък

Ателие по дърворезба

Мярка 2.2.14. **Съхраняване, укрепване и популяризиране на културни и духовни празници и културни събития в общината**

Не е отчетен напредък

Килийно училище

Мярка 2.2.15. **Изготвяне и реализиране на програми за развитие на детско-юношеския и ученически спорт**

Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

Освен направените инвестиции за поддържане и подобряване на спортните бази, Община Дряново подпомага спортните клубове чрез предоставяне на ежегодна субсидия за тренировъчна дейност, за подготовка на национални състезатели от Дряново, за организиране на традиционни за града турнири и традиционното награждаване на най-добрите спортисти на града.

На територията на община Дряново функционират 7 спортни клуба, чиято дейност е насочено основно към развитието на детско-юношеския спорт. Освен действащите клубове на територията на община Дряново развива спортна дейност и филиал на ОБК „Чардафон“ Габрово. Целогодишно в школите са обхванати спортисти от всички възрастови групи.

Клубовете ежегодно се подпомагат от общината чрез финансови субсидии, а състезателите и техните треньори участват в надпреварата „Спортист на годината“ , „Треньор на годината“ и специални награди за принос в развитието на спорта на община Дряново, които се обявяват на традиционна церемония „Спортист на годината“. Средствата заделени от общинския бюджет за субсидиране на спортните клубове и спортни събития, бележат ръст от 55 000,00 лева през 2020 г., 66 000,00 лева през 2021 г. до 83 000,00 лева през 2022 г. и 76 000 лева за 2023 г.

### 1.2.9. Напредък по изпълнението на Приоритет 2.3.

В Приоритет 2.3. са включени 9 мерки:

Мярка 2.3.1. Дигитализация на административни услуги и създаване и усъвършенстване на нови форми на административно

обслужване -е-правителство и др.

Мярка 2.3.2. Въвеждането на електронни обществени поръчки и процедури за отдаване на концесии

Мярка 2.3.3. Подобряване на знанията на служителите в областта на информационните технологии

Мярка 2.3.4. Усвояване на добри практики в повишаване на административния капацитет

Мярка 2.3.5. Подобряване на уменията за управление на проекти

Мярка 2.3.6. Подобряване на уменията на местните партньори за разработване, финансиране и управление на съвместни проекти

Мярка 2.3.7. Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация и изграждане на информационни системи в помощ на инвеститорите

Мярка 2.3.8. Стратегическо планиране и общински политики

Мярка 2.3.9. Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове

#### Описание на напредъка по Приоритет 2.3. „Повишаване на административния капацитет и качеството на административното обслужване“

Мярка 2.3.1. Дигитализация на административни услуги и създаване и усъвършенстване на нови форми на административно обслужване -е- правителство и др.

##### Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

Общинската администрация надгражда функциите си посредством внедрената Единна интегрирана информационна система на община – ИМЕОН.

През 2021г. е извършена дигитализация на актове за раждане; актове за брак: град Дряново; с. Царева ливада; с. Ганчовец; с. Гостилница. През 2022 г. са въведени актовете за брак на останалите населени места.

През 2023г. приключва изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0168-C01 Мониторинг на системата за дигитални административни услуги в община Дряново за подобряване на административната и

регулаторната среда чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса (02.09.2022 - 31.12.2023), ОПДУ 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, Бенефициент НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ Фондация, гр. Дряново

**Мярка 2.3.2. Въвеждането на електронни обществени поръчки и процедури за отдаване на концесии**  
Не е отчетен напредък

**Мярка 2.3.3. Подобряване на знанията на служителите в областта на информационните технологии**  
Не е отчетен напредък

**Мярка 2.3.4. Усвояване на добри практики в повишаване на административния капацитет**  
Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

През 2023г. започва изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0019-C01 Укрепване на капацитета на Община Дряново за провеждане на устойчиви социални политики на местно ниво (01.06.2023- 01.06.2025), финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.002 Укрепване на общинския капацитет, Бенефициент Община Дряново.

Проектът включва широк обхват от взаимосвързани дейности, които целят да повишат компетенциите и капацитета на Общинска администрация Дряново и нейните социални партньори за упражняване на правомощията и задълженията по ЗСУ, ЗХУ, ЗЛП и да подобрят качеството на социалните услуги. Проектното предложение цели ускоряване на реформата на системата на социалните услуги на общинско ниво, укрепване на капацитета на Община Дряново за провеждане на съвременни социални политики и повишаване на качеството на социалните услуги на местно ниво.

Проектът е на стойност 137 697 лв.

**Мярка 2.3.5. Подобряване на уменията за управление на проекти**  
Не е отчетен напредък

**Мярка 2.3.6. Подобряване на уменията на местните партньори за разработване, финансиране и управление на съвместни проекти**

Не е отчетен напредък

Мярка 2.3.7. Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация и изграждане на информационни системи в помощ на инвеститорите  
Не е отчетен напредък

Мярка 2.3.8. Стратегическо планиране и общински политики  
Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

През 2023г. се реализира проект BG06RDNP001-19.610-0102-C01 Проект за разработване на Стратегия за BOMP за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Местна инициативна група „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, Процедура BG06RDNP001-19.610 Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Бенефициент Местна инициативна група Дряново-Трявна-В сърцето на Балкана

Мярка 2.3.9. Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове  
Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

Съгл. Споразумение №94/09.12.2020г., подписано между Агенция по геодезия, картография и кадастър и Община Дряново, считано от 01.01.2021г. Община Дряново подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР. Административното обслужване обхваща: информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР; приемане на заявления за извършване на официални документи и тяхното предоставяне на потребителите; приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

#### 1.2.10. Напредък по изпълнението на Приоритет 3.1.

В Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“ са включени 4 мерки:



Мярка 3.1.1. Изграждане на регионалната транспортна свързаност

Мярка 3.1.2. Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и привеждането ѝ в съответствие с европейските изисквания

Мярка 3.1.3. Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа, паркинги и паркоместа

Мярка 3.1.4. Модернизация на телекомуникационната мрежа и развитие на мрежите за достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернетна територията на общината

### Описание на напредъка по Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“

Мярка 3.1.1. Изграждане на регионалната транспортна свързаност  
Не е отчетен напредък

Мярка 3.1.2. Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и привеждането ѝ в съответствие с европейските изисквания  
*Отчетен напредък*

#### Описание на изпълнението:

През 2021 г. е извършено: изкърпване асфалтова настилка и машинно изсичане и надробяване на храсти, клони в с. Зая, разклон главен път (I-5) с. Ганчовец; текущ ремонт на вертикална пътна маркировка (пътни знаци) община Дряново; ремонт на участъци от улична мрежа на територията на община Дряново - заустване на улица от с. Царева ливада в път за с. Радовци; ремонт на тротоари на главна улица на с. Царева ливада. Вложените средства са осигурени от капиталовата програма на Община Дряново и целева субсидия от РБ.

През 2022 година: Основен ремонт на път част от имот 23947.104.15 в местността „Припека“ гр. Дряново; Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет на главен път I- 5 при ж.к. Успех; Полагане фрезован асфалт пред гаражи на път за с. Царева ливада; Хоризонтална пътна маркировка на пешеходни зони; Ремонт и монтаж пътни знаци; Доставка и полагане на фрезован асфалт на територията на община Дряново (вилна зона, крайни квартали и села)

През 2023 година: Реализиран е обект „Реконструкция на общински път GAB 3118 - /III-609, Трявна - Царева ливада/ - Куманите - от п.к. с РТ III-609 до с. Куманите“

През 2023г. е подписан договор BG06RDNP001-7.019-0042-C03 Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в Община Дряново (11.08.2023 - 15.09.2025), Процедура BG06RDNP001-7.019

Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Бенефициент Община Дряново.

Проектът предвижда интервенции в пътища, общинска собственост в община Дряново, обхващайки следните обекти и подобекти:

- Обект: „Рехабилитация и/или реконструкция на участък от общински път GAB 2127“, с начало от п.к. с второстепенна улица в град Дряново с идентификатор 23947.501.9597 в посока кв. „Марча“

- Подобект 2: „Реконструкция на участъци от общински път GAB 2128 и общински път GAB3129“

- Участък 1: „Реконструкция на участък от общински път GAB 2128“ - от РП III–4041 до п.к. с общински път GAB3129

- Участък 2: „Реконструкция на участък от общински път GAB 3129“ - от п.к. с общински път GAB2128 до нач. населено място с. Ритя

- Подобект 3: „Реконструкция на общински път GAB 3130 - / III-303, Дряново - Керека / - Балванците“

Цитираните пътищата обслужват общо всички жители на град Дряново /6107д./, с. Ритя /9д./, с. Балванците /7д./, а и на общината като цяло /8313д./.

Обща стойност на проекта: 2 927 310,09 лв.

### Мярка 3.1.3.

#### **Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа, паркинги и паркоместа**

*Отчетен напредък*

##### **Описание на изпълнението:**

През 2021г. са извършени ремонтни дейности на уличната инфраструктура на територията на общината.

- в град Дряново са извършвани ремонти на тротоарни, улични настилки, шахти и съоръжения в град Дряново - ремонт тротоар и улични съоръжения на ул. „Сава Йотов“, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Максим Райкович“, ул. „Янко Дряновски“, ул. „Ст. Руневски“, ул. „Шипка“;
- преасфалтиране на улици в гр. Дряново – улици в ж.к. Успех, ул. „Гурко“, улици в кв. „Никоевци“;
- довършителни дейности по ул. „Шипка“; основен ремонт на ул. „Максим Райкович“;

- направа на парапет кръстовище на ул. „Шипка“ и ул. „Ген. Столетов“;
- изграждане на подпорна стена ул. „Шипка“, на ул. М. Преображенски, лепене плочки Ларго, демонтаж, ремонт и монтаж на ел. стълбове жк „Успех“ и др.
- Извършен е основен ремонт в с. Царева ливада на ул. „Христо Ботев“, асфалтиране върху подменен водопровод на част ул. „Д-р Върбан Генчев, текущ ремонт улични съоръжения; оформяне единични кръпки с асфалтова смес в гр. Дряново, с. Славейково, с. Гостилница, с. Янтра и с. Скалско; ремонт на шахти в с. Янтра и др.
- В общината текущо е извършван ремонт на хоризонтална и вертикална пътна маркировка, поставяне на вертикални пътни знаци, текущ ремонт съоръжения по улици, направа бетонови настилки и др.

Финансовият ресурс е осигурен от общински бюджет, капиталова програма, ПМС, целева субсидия от РБ.

През 2021г. са осъществени следните дейности:

- изработка и монтаж на автобусна спирка на път I-5 при с. Ганчовец; в гр. Дряново - сваляне ниво на тротоар на ул. „Станционна“;
- Подход за инвалиди при поликлиника и др.

През 2022 г.:

- Основен ремонт на ул. „Освобождение“ в с. Ганчовец;
- Изграждане продължение на ул. „Железничарска“, гр. Дряново;
- Основен ремонт паважна настилка на ул. „Арх. Пенчо Койчев“, гр. Дряново;
- Изграждане нова вертикална планировка и осветление към паркинг в ж.к. „Априлци“ под блокове № 3 и № 4;
- Основен ремонт бетонова настилка зад жилищни сгради на ул. „Шипка“ 141-145 гр. Дряново;
- Основен ремонт ул. „Ангел Кънчев“, гр. Дряново;
- Изграждане бетонов подход към жилищни сгради на ул. „Матей Преображенски“ № 26, № 28 , № 30 и ул. Гурко № 1, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 и № 13
- Проектиране и изграждане на паркинг на ул. „Гурко“ № 4
- Основен ремонт ул. „Хан Аспарух“, с. Царева ливада
- Основен ремонт на улици „Васил Левски“ и „Стефан Лафчиев“ в Община Дряново“

- Възстановяване на разрушен мост и оформяне на подходите към него в землището на гр. Дряново
- Текущ ремонт на улични шахти

През 2022 г.:

Улична мрежа в община Дряново, финансиране с целева субсидия от РБ:

- В град Дряново: изграждане нова вертикална планировка на ул. „Освобождение“, основен ремонт на ул. „Генерал Цончев“, изграждане нова бетонова настилка на ул. „Иван Вазов“ № 1 и № 3;
- основен ремонт на улици около блокове № 1, 2, 3 и 5 в ж.к. „Успех“;
- изграждане улици в район „Вехти лозя“;
- изграждане тротоари на ул. „Шипка“ в участъка „Боев яз - път I – 5“;
- изграждане нова вертикална планировка на ул. „Бачо Киро“ 19-51 след подмяна на водопроводна инсталация; изграждане нова вертикална планировка в ж.к. „Априлци“, бл. 17
- В селата: Основен ремонт ул. „Иван Касъров“ в с. Янтра

През 2023г. приключи изпълнението на проект BG06RDNP001-19.455-0001-C02 Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново (30.08.2021 -30.06.2023), BG06RDNP001-19.455 МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, ПРСР, Бенефициент Община Дряново.

Улиците, обект на инвестицията са както следва: Подобект №5: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски“, град Дряново и Подобект №11: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Стефан Лафчиев“, град Дряново. Проектът включва дейности по изпълнение на строително-монтажните работи и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР.

Обща стойност: 352 791.29 лв.

В процес на изпълнение е проект BG06RDNP001-19.561-0002-C01 Реконструкция на улици в град Дряново (07.02.2023 - 30.06.2025), процедура BG06RDNP001-19.561 МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, ПРСР, Бенефициент Община Дряново

Дейността включва изпълнение на строително-монтажните работи по следните улици: ул. Сава Йотов, град Дряново, с обхват от п.к. с улица

Матей Преображенски до п.к. с улица Шипка - ул. Христо Ботев, град Дряново, с обхват от улица Сава Йотов до п.к. с улица Шипка - ул. Матей Преображенски, град Дряново, с обхват от п.к. с улица Станционна до п.к. с улица Хаджи Димитър и РП III-609  
Обща стойност на проекта 380 811,92 лв.

**Мярка 3.1.4. Модернизация на телекомуникационната мрежа и развитие на мрежите за достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернетна територията на общината**  
Не е отчетен напредък

### 1.2.11. Напредък по изпълнението на Приоритет 3.2.

В Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“ са включени 8 мерки:

Мярка 3.2.1. Поддържане и ремонт на съществуващите водоеми и изграждане на нови

Мярка 3.2.2. Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и пречиствателни станции за питейна вода

Мярка 3.2.3. Изграждане на водоизточници и санитарно-охранителни зони около водоизточниците

Мярка 3.2.4. Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното ограничаване

Мярка 3.2.5. Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваша преработката на смет и отпадъци

Мярка 3.2.6. Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и сметоизвозване в общината

Мярка 3.2.7. Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи замърсяванията

Мярка 3.2.8. Изграждане на системи за ранно предупреждение ще бъдат допълнително засилени, включително и техническия капацитет в прогнозирането и управлението на риска от бедствия.

### Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“

**Мярка 3.2.1. Поддържане и ремонт на съществуващите водоеми и изграждане на нови**  
Не е отчетен напредък

**Мярка 3.2.2. Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и пречиствателни станции за питейна вода**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През 2021 г. е извършен:

- Основен ремонт на водопровод на главен път, с. Царева ливада.
- Подмяната на водопроводна инсталация (1900 метра) в чертите на село Царева ливада, като цели намаляване на загубите на питейна вода.
- Подмяната на водопроводна инсталация на ул. „Максим Райкович“ (200 метра) в чертите на град Дряново, като цели намаляване на загубите на питейна вода
- Подмяна на канализация на ул. „Максим Райкович“ - град Дряново.<sup>2</sup>

2022 година<sup>3</sup>:

- Подмяната на водопроводна инсталация в чертите на град Дряново – общо 990 м., като се цели намаляване на загубите на питейна вода, както следва по улици: улица „арх. Пенчо Койчев“ -172 метра; улица „Васил Левски“ - 338 метра; улица „Стефан Лафчиев“ - 176 метра; улица „Ангел Кънчев“ – 304 метра.
- Изграждане на водопровод в гробищен парк – гр. Дряново – 148 м.
- Подмяната на водопроводна инсталация (80 метра) на ул. „Хан Аспарух“ с. Царева ливада, като се цели намаляване на загубите на питейна вода.
- Подмяната на водопроводна инсталация (205 метра) на ул. „Освобождение“ с. Ганчовец, като се цели намаляване на загубите на питейна вода.

През 2023 г. са изпълнени следните обекти:

- Водоснабдяване на кв. „Марча“ и село Крънча
- Изграждане на водопровод за кв. „Марча“

**Мярка 3.2.3. Изграждане на водоизточници и санитарно-охранителни зони около водоизточниците**

**Не е отчетен напредък**

---

<sup>2</sup> Източник: Годишен отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията на Община Дряново за 2021 година

<sup>3</sup> Източник: Годишен отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията на Община Дряново за 2022 година

#### Мярка 3.2.4. **Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното ограничаване**

##### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

Сектор „Въздух“ – за запазване доброто качество на атмосферния въздух, поддържане нивото на емисиите под пределно допустимите концентрации и понижаване на ФПЧ са изпълнявани дейностите: метене на тротоари, площади и улични платна и измиване на улици  
Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани сметища.

- През 2021г. са изчистени строителни, едрогабаритни и битови отпадъци от 5 броя нерегламентирани сметища в землищата на селата Маноя, Караиванца, Скалско, Царева ливада и гр. Дряново, като са събрани и предадени на Регионалното депо за отпадъци – Севлиево – 33,112 тона.
- През 2022 г. на територията на Община Дряново са изчистени от строителни, едрогабаритни и битови отпадъци 6 броя нерегламентирани сметища, в землищата на селата, Караиванца, Скалско, Янтра, Царева ливада и гр. Дряново.
- Оползотворяване на дървесни отпадъци

С подписан през 2020 г., меморандум за сътрудничество между община Дряново и „Кроношпан България“ ЕООД за рационално оползотворяване на дървесни отпадъци, образувани на територията на общината се цели намаляване на депонираните отпадъци и подобряване на екологичните показатели на територията на общината. Годишно се оползотворяват близо 11 тона дървесни отпадъци.

#### Мярка 3.2.5. **Изграждане на специализирана инфраструктура, обезпечаваша преработката на смет и отпадъци**

##### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

За постигане на количествените цели в сектор „Отпадъци“ на общинско ниво чрез прилагане на мерки, съгласно йерархията при управление на отпадъците – предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране са предприети действия за увеличаване количеството отпадъци, предадени за рециклиране.

- Разделно събиране на био отпадъци и компостиране

На територията на община Дряново е изградено общинско съоръжение за компостиране на разделно събраните биоотпадъци от община Дряново и довеждаща инфраструктура. Съгласно договор, оператор на изградената компостираща площадка на територията на община

Дряново е „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД, което отговаря и за организиране на системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци.

През 2021г. са предприети действия за поетапно въвеждане на организираната система за разделно събиране на биоотпадъци, като в първия етап са включени обектите за социални услуги. Отпадъците се преработват на изграденото общинско съоръжение за компостиране, което е част от Регионалната система за управление на отпадъците – Севлиево.

През 2021г. за КОМПОСТ е извършено - направа на фундаментна плоча за кантар, засипване алея с трошен чакъл, натоварване, превоз и монтаж будка със средства от капиталовата програма на общината.

Разделно събраните биоотпадъци: за 2021 г. - 790 кг.; за 2022 г. - 3 680 кг.

- Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Организирана е система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, състояща се от контейнери тип „Иглу“ с жълт и зелен цвят. Количеството разделно събрани отпадъци от опаковки през 2021 г. е 23,380 тона, от които количествата нерестицируеми отпадъци, предадени за депониране са 21, 330 тона. (Договор между Община Дряново и „Булекопак“ АД); през 2022 година са 15 120 кг., от които количества рециклируеми отпадъци са 6,140 тона, а останалите 8,140 т. са предадени за депониране.

- Негодни за употреба батерии и акумулатори

Организирани са дейности по разделно събиране, съхраняване и предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори. За 2021г. събраното количество НУБА е 315,20 кг. (Договор с „Еко батерии“ АД)

- Текстилни отпадъци

Система за разделно събиране, транспортиране и третиране на текстилни отпадъци, като през 2021г. събраното количество е 5,430 тона. (Хедуей интернешънъл“ ЕООД).

- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване е организирано чрез кампания съвместно с „Елтехресурс“ АД. Събрани са над 50 бр. информационно и телекомуникационно оборудване и потребителски уреди – хладилници, телевизори, ел. печки и др.

- Опасни отпадъци

Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата е организирано чрез кампания с „БалБок“ АД с мобилни събирателни



пунктове. Предадени са 135,26 кг отпадъци, вкл. медикаменти с изтекъл срок на годност, люминесцентни тръби и живак съдържащи уреди, киселини и др.

- Строителни и едрогабаритни отпадъци:

Извършването на услугата по събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци са подадени 167 бр. заявки от физически и юридически лица, като са извозени 434,48 тона на Регионалното депо – Севлиево (2021г.) Реализиран проект BG16M1OP002-2.009-0067-C01 Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците във „Вагонен завод ИНТЕРКОМ“ АД (08.09.2020 - 05.10.2022), ОПОС, частен бенефициент  
Изпълнен: 2020 - 2022

### **Мярка 3.2.6. Обновяване и модернизирание на оборудването за сметосъбиране и сметоизвозване в общината**

#### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

Услугата по сметосъбиране, сметоизвозване на ТБО и почистване на териториите за обществено ползване в населените места на община Дряново се изпълнява от Общинско предприятие „Чисто Дряново“, което е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и осъществява своята дейност на бюджетна издръжка.

Битови отпадъци:

- Закупени са 30 бр. 110 литрови кофи и 30 бр. нови контейнери тип „Бобър“ и са ремонтирани стари съдове за отпадъци (2021г.) За 2021г. извозените количества смесен битов отпадък до сепариращата инсталация в Севлиево са: 2781,86 тона.
- Изграждане основа, доставка и монтаж на многофункционален контейнер 300/700/240 см на стадион Локомотив гр. Дряново; Изграждане на джобове за контейнери в кв. Изгрев (2022г.)
- Закупени са 40 бр. 110-литрови кофи и 70 бр. нови контейнери тип „бобър“ и са ремонтирани стари съдове за отпадъци, с цел превенция и намаляване на изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани сметища. През отчетния период, на територията на Община Дряново, бяха изчистени от строителни, едрогабаритни и битови отпадъци 6 броя нерегламентирани сметища, в землищата на селата, Караиванца, Скалско, Янтра, Царева ливада и гр. Дряново (2022г.)
- „Доставка на нов специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване, за нуждите на Община Дряново“ (2023г.)

**Мярка 3.2.7. Изграждане на площадки и съоръжения, намаляващи замърсяванията**  
**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

Съгласно сключен договор между Община Дряново и „Еко батери“ АД на територията на община Дряново са организирани дейности по разделно събиране, съхраняване и предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори. В периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. от територията на община Дряново събраното количество НУБА е 299,00 кг.

Съгласно подписано Споразумение за сътрудничество между Община Дряново и „Хедуей интернешънъл“ ЕООД, на територията на общината е организирана система за разделно събиране, транспортиране и третиране на текстилни отпадъци. Цели се рационалното оползотворяване на отпадъци от текстил и облекло, намаляване на депонираните отпадъци, подобряване на екологичните показатели на територията на общината. В периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. от територията на община Дряново събраното количество текстилни отпадъци е 5,380 тона.

**Мярка 3.2.8. Изграждане на системи за ранно предупреждение ще бъдат допълнително засилени, включително и техническия капацитет в прогнозирането и управлението на риска от бедствия.**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През 2022г. е разработена Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025 г. на основание чл. бд, ал.1 от Закона за защита при бедствия за изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. и Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. В нея е осъществена синергия с ПИРО и са изведени следните дейности за реализиране на оперативните цели на общинско ниво: 2.5.1.1.1. Изготвяне на предложения за необходимостта от усъвършенстване на системата за ранно предупреждение и оповестяване при актуализиране на Общинския план за защита при бедствия (Общински щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия); 2.5.2.1.1 Финансиране и въвеждане на ефективна система за ранно предупреждение при бедствия, особено в малките населени места (Органи на изпълнителната власт).

### 1.2.13. Напредък по изпълнението на Приоритет 3.3.

В Приоритет 3.3. „Развитие на културната, образователна, спортната и туристическа инфраструктура“ са включени 6 мерки.

Мярка 3.3.1. Поддържане и обогатяване на културната инфраструктура

Мярка 3.3.2. Изграждане на спортни зали/инфраструктури за развитие на професионален спорт, поддържане на открити и закрити спортни площи

Мярка 3.3.3. Модернизиране, реконструкция и изграждане на нова база за масов спорт

Мярка 3.3.4. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт

Мярка 3.3.5. Изграждане на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината

Мярка 3.3.6. Подобряване на общинската образователна инфраструктура включително внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради/помещения на образователната инфраструктура, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.

### Приоритет 3.3. „Развитие на културната, образователна, спортната и туристическа инфраструктура“

Мярка 3.3.1. Поддържане и обогатяване на културната инфраструктура

#### Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

През 2021г. с финансиране чрез капиталовата програма са изпълнени следните интервенции:

- Читалище с. Керека - възстановяване на фасади и хидроизолация;
- Читалище с. Зая - текущ ремонт;
- ремонт на ритуална зала в с. Царева ливада.

2022 г.

- Развитие на културната инфраструктура в община Дряново чрез обновление и модернизация на Културния дом
- Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в читалищните сгради в община Дряново
- Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: Народно читалище „Развитие 1869“ – гр. Дряново
- Текущ ремонт на покривна конструкция и фасади на сграда с ИД 73465.501.111.1 /Читалище с площ 322 кв. м. с. Туркинча

- Ремонт на мокро помещение и тоалетна на първи етаж в общинска сграда ползвана от: Кметство;
- Читалище „Светлина - 1922“ и Пощенска станция, в с. Скалско
- Аварийно смъкване, сортиране и подреждане каменни плочи на покрив на Лафчиева къща

2023 г.

- Изграждане на отоплителна и вентилационна инсталация на голям салон на Културен дом Дряново с финансиране от държавния бюджет
- Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ на обект НЧ „Развитие-1869“ гр. Дряново

През 2022г. приключва изпълнението на проект BG06RDNP001-19.377-0001-C01 „Ремонт, подобряване на прилежащите пространства и оборудване на църква „Свети Николай“ – с. Янтра“ (20.10.2021 - 20.10.2022), Процедура BG06RDNP001-19.377 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, Бенефициент Църква „Св. Николай“

Изпълнява се проект BG06RDNP001-7.015-0018-C03 „Ремонт, реставрация и подобряване на околното пространство на част от манастирски комплекс „Дряновски манастир „Св. Арх. Михаил“, град Дряново (03.05.2022 - 03.05.2025), BG06RDNP001-7.015 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Бенефициент „Дряновски манастир „Св. Арх. Михаил“

Изпълнява се проект BG06RDNP001-7.015-0015-C03 „Ремонт, реконструкция, възстановяване, консервация и реставрация на килийно училище“ към Църква „Свети Въведение Богородично“ град Дряново, (27.04.2022 - 27.04.2025), BG06RDNP001-7.015 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Бенефициент Църква „Св. Въведение Богородично“, гр. Дряново

Изпълнява се проект BG06RDNP001-7.015-0014-C03 „Реконструкция и възстановяване" на църква „Св. Рождество Богородично“ село Гостилица (27.04.2022 - 27.04.2025), BG06RDNP001-7.015 Процедура

чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Бенефициент църква „Св. Рождество Богородично“ село Гостилица

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект BG06RDNP001-19.560-0004-C01 „Изграждане на декор-стена за катерене в Народно читалище „Развитие - 1869“ /Лятно кино/“ (18.01.2024 - 30.06.2025), Процедура BG06RDNP001-19.560 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“. Бенефициент НЧ „Развитие-1869“ В началото на 2024г. е подписан договор за БФП.

Обща стойност на проекта 69 688,38 лв.

През 2023г. започна изпълнението на проект BG06RDNP001-19.560-0006-C01 „Придобиване на мобилна сцена за обогатяване на събитийния календар на община Дряново“ (04.10.2023 - 30.06.2025), Процедура BG06RDNP001-19.560 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“

Бенефициент: Община Дряново

Обща стойност на проекта 68 305,65 лв.

През 2023г. започна изпълнението на проект BG06RDNP001-19.560-0007-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Туристически информационен център в гр. Дряново“ (10.11.2023 - 30.06.2025), Процедура BG06RDNP001-19.560 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“

Бенефициент: Община Дряново

Обща стойност на проекта 60 554,34 лв.

**Мярка 3.3.2. Изграждане на спортни зали/инфраструктури за развитие на професионален спорт, поддържане на открити и закрити спортни площи**  
**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

Община Дряново разполага с една от най-добрите спортни обекти на територията на област Габрово и региона.

2021 г.

- Многофункционална спортна зала, която има капацитет за провеждане на официални срещи по хандбал, баскетбол, волейбол, футбол и др. Извършени инвестиции през 2021г.:

вътрешен ремонт помещение, замазка за хидроизолация; възстановяване на щети след наводнение / парно; фитнес зала, закупуване на уреди и др.

- Текущите ремонти в спортна зала – Дряново на стойност 42 309,00 лева, като с цел подобряване условията за спорт са инвестирани и финансови средства в размер на 10 000,00 лева за закупуване на фитнес уреди за преоборудване на фитнес зала към Спортна зала Дряново.
- Два стадиона - стадион „Локомотив“ в гр. Дряново с естествена тревна настилка и стадион в Царева ливада с изкуствена настилка, на които целогодишно се провеждат тренировки, официални срещи, детски турнири.
- Извършени са текущи ремонти и направа на подпорна стена Стадион, ремонт съоръжения и др.
- Изградено е осветление на тенис кортове.

През 2022 година са инвестирани финансови средства в размер на 65 997,00 лева за изпълнение на следните обекти:

- Доставка и монтаж на многофункционален контейнер на стадион Локомотив гр. Дряново
- Доставка и монтаж мултифункционално електронно табло в спортна зала Дряново
- Ремонт на стадион в с. Царева ливада
- Текущ ремонт на Спортна зала

През 2023 година са инвестирани финансови средства в размер на 67 215,00 лева за изпълнение на следните обекти:

- С цел бъдещо изграждане на спортен комплекс в село Гостилица е закупен недвижим имот, намиращ се в близост до общински терен, с цел неговото разширяване до необходимата площ.
- Изградено е захранване с ток и вода на преместваем контейнер обслужващ тенис кортове при стадион „Локомотив“, гр. Дряново.
- Възстановена е източна метал на ограда на стадион „Републиканец“ в с. Царева ливада, общ. Дряново, съборена от ураганен вятър /28.03.2023г./

През 2023г. приключи изпълнението на проект BG06RDNP001-19.561-0003-C01 „Подмяна спортна настилка на баскетболно игрище на спортен комплекс „Локомотив“ гр. Дряново“ (13.06.2023 - 30.06.2025), Процедура BG06RDNP001-19.561 МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Бенефициент Община Дряново

Обща стойност на проекта: 22 800.00 лв.

**Мярка 3.3.3. Модернизирание, реконструкция и изграждане на нова база за масов спорт**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

2022 г.

- Доставка и монтаж мултифункционално електронно табло в спортна зала Дряново
- Текущ ремонт на Спортна зала намираща се на ул. „Поп Харитон“ №1 в гр. Дряново
- Ремонт на стадион в с. Царева ливада

2023г.

- Доставка на бягаща пътека за фитнес към спортна зала Дряново

**Мярка 3.3.4. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт**

**Не е отчетен напредък**

Мярката се дублира с Мярка 2.2.12. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт

**Мярка 3.3.5. Изграждане на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината**  
**Не е отчетен напредък**

**Мярка 3.3.6. Подобряване на общинската образователна инфраструктура включително внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради/помещения на образователната инфраструктура, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.**

**Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

През 2021 г. е реализиран проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново, община Дряново“, финансиран от ДФЗ, на обща стойност 1 156 950.89 лв. Платена сума за 2021 г. – 723 540,30 лв. Чрез проекта се подобрява енергийната ефективност и се намаляват вредните емисии от отоплението.

През 2021 г. със средства от общинския бюджет в училището са инвестирани: закупуване на 2 бр. лаптопи; изграждане на дренажна система на сградата - 20 802; основен ремонт на външна парна инсталация; изкърпване и боядисване стени; канализация;

възстановяване на отоплителна инсталация; изграждане на дренажна система около сградата на училището; текущ ремонт улици, водосточни тръби и др.

През 2021г. е реализиран проект за подобряване на материално техническата база на ДГ Детелина в база „Иглика“ към ДГ „Детелина“, гр. Дряново са инвестирани средства от капиталовата програма на общината и целева субсидия от РБ за основен ремонт на дворно пространство; подмяна ограда на дворно пространство и ремонтни дейности на базата.

През 2022г. е извършен текущ ремонт, покривна конструкция и подмяна на ламаринена повърхност па пристройка към централна сграда на ДГ „Детелина“

#### **1.2.14. Напредък по изпълнението на Приоритет 3.4.**

В Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“ са включени 3 мерки.

Мярка 3.4.1. Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа

Мярка 3.4.2. Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на алтернативните източници на енергия

Мярка 3.4.3. Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и на уличното и парковото осветление

#### **Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“**

**Мярка 3.4.1. Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа**  
Не е отчетен напредък

**Мярка 3.4.2. Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на алтернативните източници на енергия**  
Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

В процес на изпълнение: проект BG06RDNP001-4.015-0348-C02 „Изграждане на фотоволтаична централа, подмяна на осветителни тела, закупуване на технологично оборудване и специализирани транспортни средства за предприятие за месопреработка и млекопреработка“ (23.08.2023 - 15.06.2025)



В процес на изпълнение: проект BG06RDNP001-4.012-1388-C02 „Изграждане на фотоволтаична централа, закупуване на оборудване и селскостопанска техника за кравеферма“ (25.01.2023 - 15.06.2025)

### Мярка 3.4.3. **Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и на уличното и парковото осветление**

#### **Отчетен напредък**

Описание на изпълнението:

Енергийно ефективно улично и парково осветление в община Дряново

- Текущ ремонт градинско/ градско осветление в община Дряново, разширение улично осветление жк „Априлци“ (2021г.)
- Изграждане улично осветление на ул. „Железничарска“ и ул. „Борова гора“, град Дряново; Текущ ремонт улично и градинско осветление в община Дряново (2022г.)

Инвестиции в публични сгради:

- Ремонт фасади, вътрешен ремонт и вертикална планировка на съществуваща административна сграда в с. Ганчовец (2021 г.)
- Реконструкция на отоплителна инсталация на общинска сграда с идентификатор 23947.501.129.1., находяща се на ул. „Шипка“ №164, гр. Дряново - изграждане на нова VRF система за отопление; (2021 г.)
- Извършени са ремонти на сграда Кметство с. Маноя, кметство с. Радовци, кметство с. Скалско и др. (2021 г.)
- Основен ремонт на фасади, вътрешен ремонт и вертикална планировка на съществуваща административна сграда - УПИ VI, кв 63 - град Дряново (2022г.)
- Успешно реализиран проект „Реконструкция и ремонт на административна сграда на ул. „Никола Мушанов“ № 3, гр. Дряново“ (2022 г.)

През 2023 г. Община Дряново, като водещ партньор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, кандидатства с 5 предложения за енергийно обновяване на много фамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост. Общата стойност на проектите е в размер на 6 634 641,80 лева.

Одобрено е едно от проектните предложения: „Енергийно обновяване на Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Дряново, ул. „Шипка“ 143“ на стойност 450 006,65 лева, като станалите четири проектни предложения са в резервен списък.

С идеята чрез сътрудничество между Община Дряново и собствениците на сградите – частна собственост, да стартира обновяване и озеленяване на фасадите на жилищните сгради в града, през мандата беше възобновена инициатива „Красиво Дряново“.

В периода от 2021 г. до 2023 г., по инициативата „Красиво Дряново“, Община Дряново подпомогна с материали при извършване на строително – ремонтни работи собственици на 28 жилищни сгради.

Разработен е проект за укрепване на жилищен блок „Дружба“ (район пешеходна зона, ул. Стефан Стамболов № 41).

През 2023г. е подписан АДБФП за проект BG-RRP-4.025-0003-C01 Енергийно ефективно осветление в община Дряново (18.08.2023-18.02.2025), финансиран от НПВУ, Бенефициент Община Дряново. Проектно предложение е за изпълнение на мерки, свързани с рехабилитацията и модернизацията на системи за външно изкуствено осветление в община Дряново и по-конкретно - в четири населени места на територията на общината, в т.ч. в град Дряново, с. Царева ливада, с. Гостилица, с. Ганчовец.

Стойност на проекта - 899 644,78 лв.

През 2023г. е одобрен за финансиране проект BG06RDNP001-7.020-0044-C01 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация Дряново“. На 08.01.2024 е подписан АДБФП (08.01.2024 - 15.09.2025), Процедура BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ от мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Обща стойност на проекта 677 374,42 лв., 100% БФП

### 1.2.15. Напредък по изпълнението на Приоритет 3.5.

Приоритет 3.5. „Развитие на градска инфраструктура“ включва 2 мерки:

Мярка 3.5.1 Изпълнени проекти за благоустрояване на градската среда (площади, инфраструктура в жилищни квартали и др.)

Мярка 3.5.2 Изпълнени проекти за изграждане и обновяване здравната и социалната инфраструктура

### Приоритет 3.5. „Развитие на градска инфраструктура“

#### Мярка 3.5.1. Изпълнени проекти за благоустрояване на градската среда (площади, инфраструктура в жилищни квартали и др.)

##### Отчетен напредък

Описание на изпълнението:

В Програмата за реализация на ПИРО (Приложение 1) са посочени 6 конкретни обекта.

- Ремонт и обновяване на площадно пространство в гр. Дрянов
- Изграждане на пешеходна и велоалея от моста на Колю Фичето до Дряновския манастир
- Изграждане на покрит пазар за местни производители.
- Обновяване на ключови обществени сгради в град Дряново.

По посочените обекти предстои изпълнение в оставащия период на действие на ПИРО.

##### **За изграждане на детски площадки се наблюдава напредък.**

През 2021г. е изготвен Доклад за безопасност на детските площадки на открито, в резултат на което са предприети действия по ремонт на площадките и съоръженията към тях. Целогодишно се осъществява текущ ремонт на детските площадки и съоръженията към тях.

- Извършен е ремонт на детски и спортни площадки с. Царева ливада (2021г.)
- Изграждане детска площадка ул. „Гурко“, гр. Дряново (2022 г.)
- Изграждане детска площадка Априлци над бл. 10 (2022 г.)
- Изграждане детска площадка парк Локомотив(2022 г.)
- Изграждане детски площадки в двора на ЦДГ Детелина, гр. Дряново (2022 г.)
- Изграждане на ограда и полагане на ударопоглъщаща настилка на детска площадка в кв. „Изгрев“ гр. Дряново (2022 г.)
- Изготвяне на работен проект за изграждане на детски площадки(2022 г.)

През 2023 г. са инвестирани финансови средства в размер на 57 643,00 лева за разработване на проекти за благоустрояване и изграждане на парк и детска площадка в района на ул. „Камен Калчев“, детска площадка в района на Културен дом, детска площадка в ж.к. Априлци пред блок 6 и разширяване на изградената детска площадка на ул. „Гурко“.

- изградена зона за спорт на ул. „Гурко“.

##### **Ремонт и рехабилитация на пешеходната зона в град Дряново**

- Проектиране на пешеходна зона Дряново (2022г.)

2021 г. са реализирани следните допълнителни обекти, допринасящи за изпълнението на мярката са:

- в град Дряново - асфалтиране на подблоково пространство на ул. „Камен Калчев“ №26-28; полагане на трайна настилка пред жилищни сгради на ул. „Камен Калчев“ №19-21; изграждане на алея при бл.б жк „Априлци“; текущ ремонт на парк ул. „Поп Харитон“ (парк за кучета); монтаж на пейка в района на поликлиниката; текущ ремонт покрив сграда гробищен парк и др.
- В с. Царева ливада е направено преасфалтиране задблоково пространство ул. „Ал. Стамболийски“.
- Проект „Създаване на място за отдих и игра в село Ганчовец“, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) - обща стойност на проекта 9 994,80 лв. Платена сума за 2021 г. 9 994.80 лв.
- Проект „Облагородяване и създаване на зона за отдих в село Длъгна“, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) – обща стойност на проекта 9 798.22 лв. Платена сума за 2021 г. 15 798.22 лв. Превишението са разходи са сметка на общината.

През 2022 г. са изпълнени следните дейности:

- Проект за „Подпорна стена на десен бряг на р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за ж. п. гара до стадион „Локомотив“ с пешеходна алея“
- Инженеринг за обект: Изграждане на асфалтов пъмп-трак в гр. Дряново
- Основен ремонт фонтан в гр. Дряново
- Изграждане на пешеходни алеи към автобусна спирка в ж.к. Априлци
- Облагородяване околблоково пространство на ул. „Михаил Иванов“ № 3-5 град Дряново
- Почистване на терен и допълнителни СМР за изграждане на площадка за отдих с. Маноя
- Текущ ремонт ограда в парк на ул. Поп Харитон (комплекс камъка вечен) и направа на предпазен парапет в общински пазар гр. Дряново
- Изграждане на парк на ул. „Матей Преображенски“
- Изработка и монтаж капаци на кладенци в с. Ганчовец
- Ремонтни дейности в с. Царева ливада
- Хоризонтална пътна маркировка на пешеходни пътеки в гр. Дряново

- Направа бетонови фундаменти и монтаж беседки в общински имот
- Демонтаж, ремонт и монтаж беседка и доставка нова беседка в с. Царева ливада
- Текущ ремонт вертикална планировка на ул. Хаджи Димитър с. Царева ливада
- В рамките на дейност „Озеленяване“ са поддържани всички цветни и зелени площи в града. Извършвани са текуща резитба, косене и поливане на тревните площи. Сезонната цветна растителност през годината е подменена два пъти - през пролетта и през есента. Ежедневно са почиствани и поддържани зелената система и междублоковите пространства. По график е извършвана и дезакаризация (обработки срещу бълхи и кърлежи) на тревните площи с обща площ на обработената територия 122 дка.

2023г.:

- Проект за благоустрояване и изграждане на парк в ПИ общинска собственост 23947.501.9767 по КККР на гр. Дряново
- Изграждане на пешеходна алея в общински поземлен имот 23947.501.2147

През 2023г. Община Дряново подписа Партньорско споразумение със Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ във връзка с реализиране на проект „Общински фондове: изграждане на капацитет за промяна“, финансиран от Фондация „Америка за България“. Възобновена е дейността на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Дряново“ при нови правила на управление и функциониране.

Приоритетната област на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново за 2023 г. е „Прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот“. Общият бюджет на фонда за 2023 г. е 18 000 лв. и е осигурен от Община Дряново - 10 000 лв. и Платформа АГОРА - 8 000 лв. Фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново се финансира от Община Дряново и Сдружение „Платформа АГОРА“, в изпълнение на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности“, финансиран от Фондация "Америка за България".

Мярка 3.5.2


**Изпълнени проекти за изграждане и обновяване здравната и социалната инфраструктура**

**Не е отчетен напредък**

## II. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПИРО

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите.

Фигура 4. Стратегическа рамка на ПИРО на Община Дряново




Стратегическата рамка на ПИРО на община Дряново вкл. визия за развитие, главна стратегическа цел, 3 стратегически цели, 14 приоритета, насочени към развитие на икономиката, туризма, техническата инфраструктура, намаляване на бедността, опазване на околната среда и повишаване капацитета на общинската администрация. Стратегическата част на ПИРО показва избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите.

Целите и приоритетите на ПИРО на община Дряново са определени в съответствие с целите и приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на по-високите нива: Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район, Националната програма за развитие: България 2030, Актуализираната национална концепция за пространствено развитие, както и с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027г., като са обвързани с постигането на конкретни резултати за територията на община Дряново. Стратегическите цели отразяват местните потенциали за развитие и се съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на общината.

## 2.1. Оценка на техническото изпълнение на ПИРО

Първата стъпка за оценката на ПИРО на Община Дряново е да се направи стойностен анализ на техническото изпълнение на заложените стратегически цели, приоритетите, с които целите се конкретизират и най-вече на мерките и дейностите, имащи основополагаща роля за реализирането на целия план. За целта в настоящата Междинна оценка е направена съпоставка между броя изпълнени мерки за периода 2021 – 2023г. и първоначално заложените мерки и дейности. Резултатите от този анализ са представени на следващата фигура:


Фигура 5. Дял на изпълнените проекти спрямо заложените в ПИРО на Община Дряново

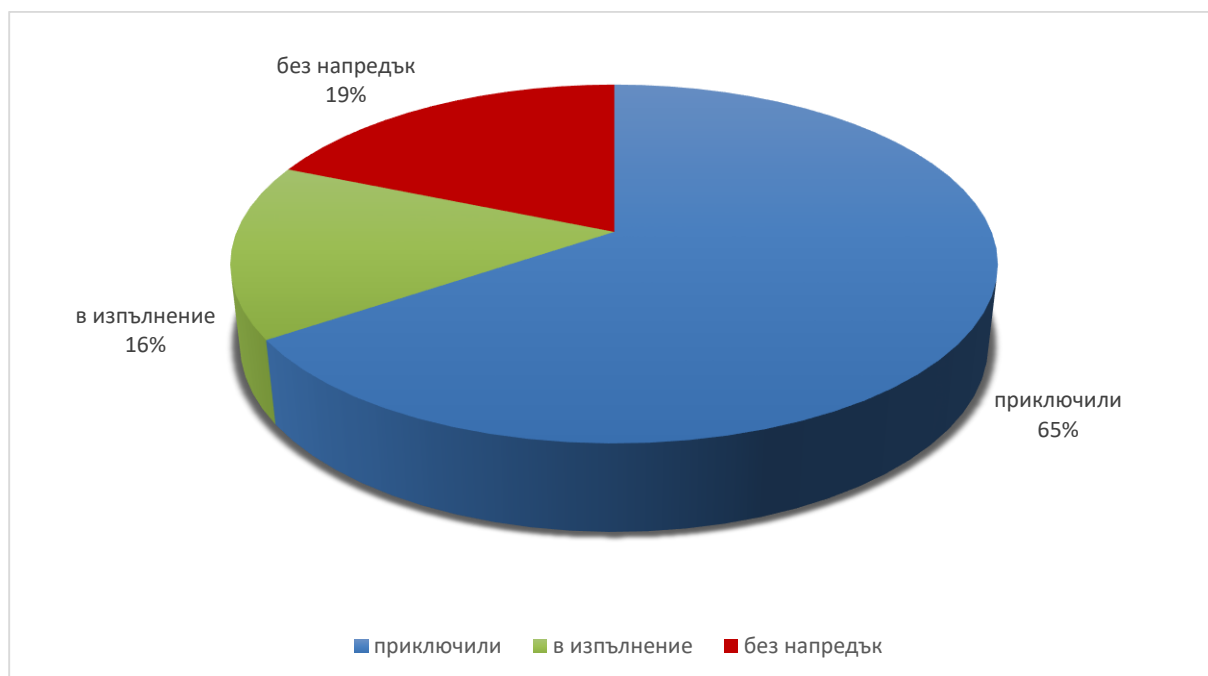

В ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2027 г. са заложи общо 101 мерки, разпределени по приоритети. В някои от мерките има открит само по един проект или дейност, допринасящи за напредъка по конкретната мярка, докато в други са отчетени повече от един реализиран проект, свързан с изпълнението ѝ. При техническия напредък са взети предвид и такива дейности, които нямат финансово измерение – разходвани средства през плановия период, но въпреки това са реализирани с усилия на Общинската администрация и целенасочени действия за изпълнението на заложената цел.

Ефективността на техническото изпълнение на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2023 г. е 81,27%, формирани от 65,64% приключили дейности/проекти и 15,73% дейности и проекти, които са в процес на изпълнение.

Фигура 6. Изпълнение по стратегически цели и категории проекти/инициативи

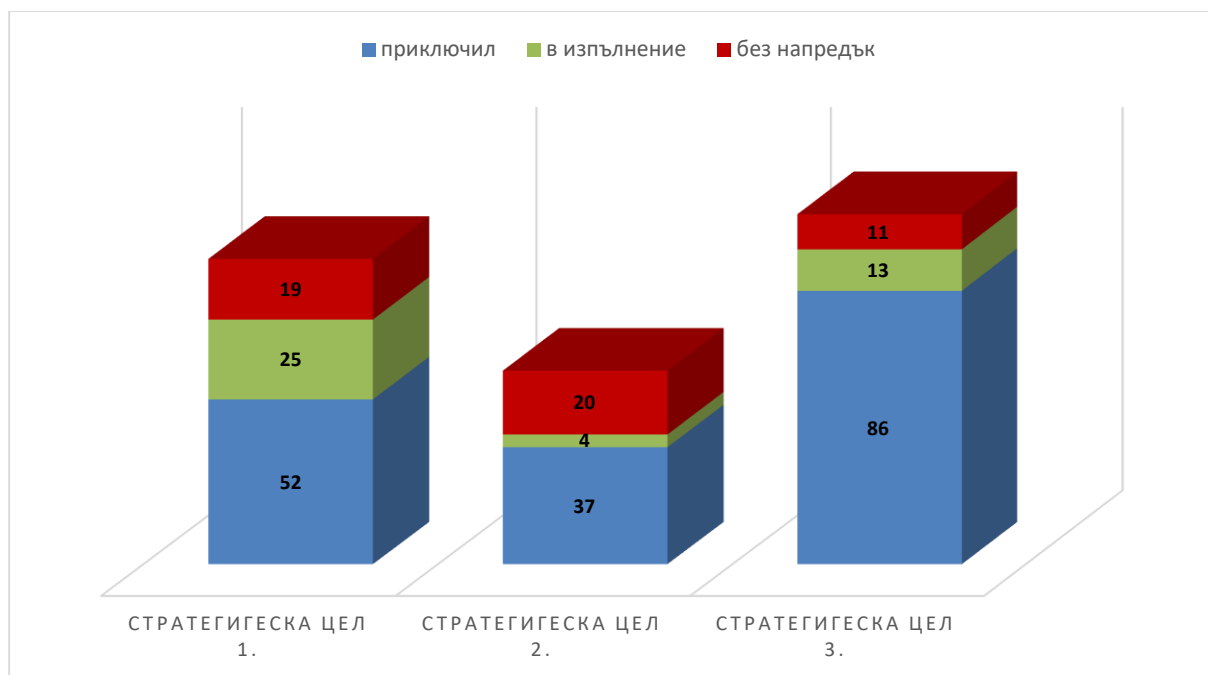

Освен анализа на общата реализация на всички мерки спрямо планираните, за целите на Оценката на изпълнението на ПИРО на Община Дряново е направена и съпоставка с отчетено изпълнение за всяка една стратегическа цел, респективно приоритет, за да се направи подробен анализ на силните и слабите моменти в изпълнението на заложените цели.


### Напредък по Стратегическа цел 1. „Подем в икономиката“

Реализацията на Стратегическа цел 1. „Подем в икономиката“ ще доведе до силен икономически растеж и до нарастване на благосъстоянието на жителите на общината, което ще се постигне като се подкрепи привличането на нови инвестиции и стратегически инвеститори, използване на средствата по европейските програми, внедряването на иновациите, качествено образование и обучение, насърчаване на заетостта и социално сближаване. По този начин ще се осигури висока производителност и ще се подкрепят малките и средните предприятия (МСП) и земеделските стопанства, които са основни целеви групи на политиките за конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Стратегическата цел 1 съдържа 6 приоритета и 67 мерки, които се очаква да допринесат за постигането на по-висок икономически растеж, за намаляване на безработицата, както и за нарастване на инвестициите в дълготрайните материални активи, на преките инвестиции и повишаване на производителността.



Фигура 7. Технически напредък на проектите по приоритети, допринасящи за постигане на Стратегическа цел 1

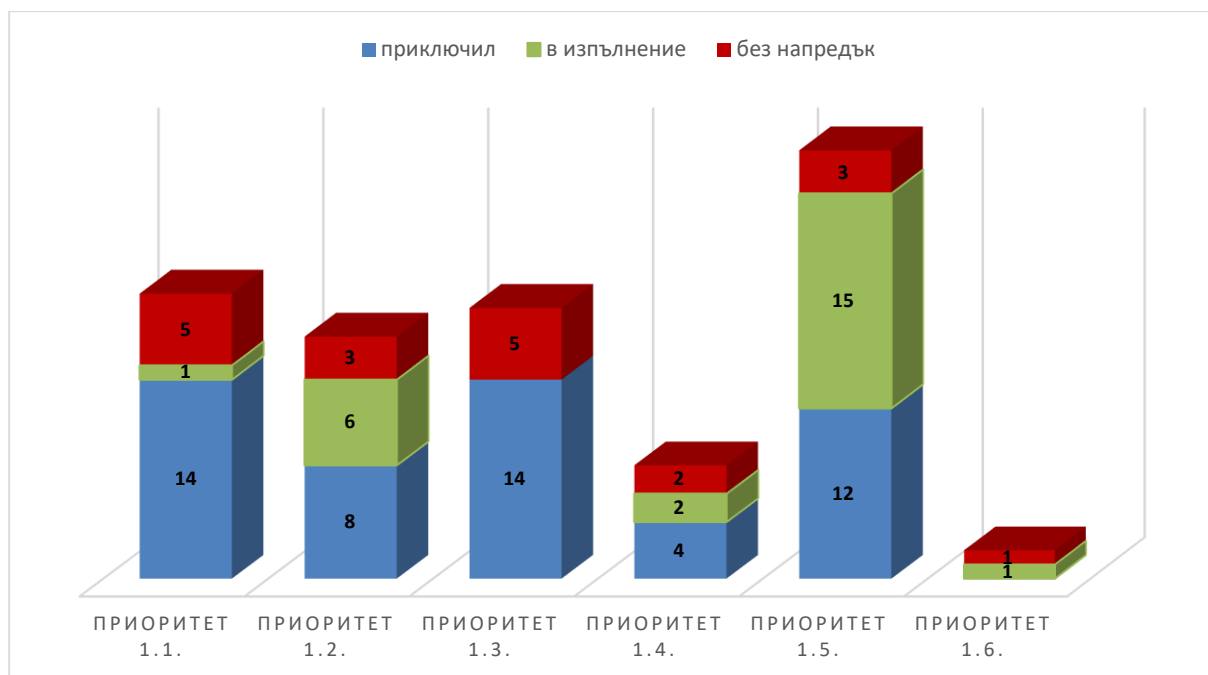

### Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“

Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“ е насочен към създаване на условия за развитие на бизнес среда, благоприятстваща иновациите и инвестициите в развитие на цифровата инфраструктура, производства и услуги с висока добавена стойност, високи технологии и финансиране на стартъпи. Предвидено е да се насърчи предприемачеството, прехода към Индустрия 4.0 и развитието на публично-частни партньорства; подкрепя за създаването на нови МСП.

В Приоритет 1.1. са включени 7 мерки:

#### Мярка 1.1.1. Изграждане на активен позитивен имидж на общината като инвестиционна дестинация

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.1.1. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и без предвиден финансов ресурс е необходимо при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да отпадне.

### **Мярка 1.1.2 Създаване на подходяща инвестиционна среда за привличане на стратегически инвеститори**

*Констатации:* В обхвата на мярката са включени 2 дейности, като се изпълнява 1 от тях: изготвяне и цифровизация на кадастрални карти на малките населени места в община Дряново. Дейността за изграждане на индустриална зона - в източната част на град Дряново е без напредък.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.1.2. е осъществена частично.** Техническото изпълнение е добро, като е извършена цифровизация на нецифровизирани пространствени данни (Дигитализация, Гео рефериране, трансформация и оцифряване на текущи регулационни, за строителни, кадастрални планове и др.).

### **Мярка 1.1.3. Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за създаване на нови МСП**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят 8 реализирани проекта на частни бенефициенти.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.1.3. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на проектите на частни бенефициенти, финансирани от ОПИК 2014-2020 година, реализирани в гр. Дряново, с. Геша, с. Царева ливада и с. Соколово.

### **Мярка 1.1.4. Финансиране на стартъпи**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася 1 проект, който е в процес на изпълнение

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.1.4. е осъществена частично.** Техническото изпълнение е незадоволително.

### **Мярка 1.1.5. Развитие на цифровата инфраструктура**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.1.5. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и без предвиден финансов ресурс е необходимо при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да отпадне.

### **Мярка 1.1.6. Насърчаване на преход към Индустрия 4.0**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.1.6. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, които да допринесат за

изпълнение на мярката и без предвиден финансов ресурс е необходимо при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да отпадне.

#### **Мярка 1.1.7. Развитие на публично-частни партньорства**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.1.7. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и без предвиден финансов ресурс е необходимо при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да отпадне.

### **Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите“**

---

Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите“ е насочен към постигане на икономически подем чрез модернизиране на производствената база, внедряване на нови технологии и иновации за по-голяма конкурентоспособност и по-добро качеството на произвежданите продукти. Тези мерки ще доведат до интелигентен и устойчив местен растеж. Капацитетът за научни изследвания, знания и иновации зависи от широк спектър фактори: стимулиране на въвеждането на нови технологии и иновативни практики, развитие на информационните и комуникационни технологии и online услугите и създаване на центрове за върхови постижения, местни лаборатории за технологични изпитвания и др., които са предвидени, като мерки към настоящия приоритет при залагането на които беше обърнато специално внимание на специфичните цели на оперативна програма за иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2021-2027 г.

В Приоритет 1.2. са включени 5 мерки:

#### **Мярка 1.2.1. Стимулиране на въвеждането на нови технологии и иновативни практики**

*Констатации:* В ПИРО е посочена дейност, свързана с дигитализация на музейни, библиотечни и читалищни фондове, по която не е отчетен напредък. За напредък по изпълнение на мярката допринасят 2 приключили проекта и 3 в процес на изпълнение на частни бенефициенти.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.2.1. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на проектите на частни бенефициенти, финансирани от ПРСР 2014-2020 година, реализирани в гр. Дряново и с. Соколово.

**Мярка 1.2.2. Създаване на центрове за върхови постижения, местни лаборатории за технологични изпитвания и др.**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.2.2. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да отпадне, с оглед на реалистичността на мярката както от гледна точка на икономическия интерес, на потенциала на осъществяване и допустимостта за финансиране и целесъобразността на подобно начинание.

### **Мярка 1.2.3. Развитие на информационните и комуникационни технологии и online услугите**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят 1 приключил проект и 3 в процес на изпълнение на частни бенефициенти.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.2.3. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на проектите на частни бенефициенти, финансирани от ОПИК 2014-2020 година, реализирани в гр. Дряново, с. Геша и с. Царева ливада.

### **Мярка 1.2.4. Насърчаване на фирми, реализиращи производствени модели в подкрепа на кръговата икономика**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят 5 приключили проекта на частни бенефициенти.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.2.4. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на проектите на частни бенефициенти, финансирани от ОПИК 2014-2020 година.

### **Мярка 1.2.5. Стимулиране на иновационната активност на предприятията съгласно Стратегията за интелигентна специализация 2021-2027 г.**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.2.5. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и без предвиден финансов ресурс е необходимо при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да отпадне.

### Приоритет 1.3. „Откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта“

---

Приоритет 1.3. „Откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта“ е ориентиран към решаване проблемите на дългосрочната безработица, която оказва сериозни неблагоприятни последици за икономиката на общината. Чрез приоритета ще се увеличат възможностите на търсещите работа, което ще допринесе за растежа на заетостта, намаляване на безработицата и зависимостта от обезщетения. Предвидените мерки включват предложения за институционално и обучение на работното място, придобиване на ключови знания и умения, стимули за насърчаване на заетостта, осигуряване на достъп до програми за активизиране, ориентиране, обучение и др.

В Приоритет 1.3. са включени 9 мерки.

#### Мярка 1.3.1. Придобиване на ключови знания и умения

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.3.1. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да се включи в обхвата на друга мярка като дейност.

#### Мярка 1.3.2. Създаване на програми за гъвкави системи за квалификация и преквалификация включително на безработни

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася 1 проект „Заетост за теб“ на ОП „Чисто Дряново“, финансиран чрез Агенция по заетостта

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.3.2. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро.

#### Мярка 1.3.3. Насърчаване на младежката заетост

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят 2 изпълнени дейности на Община Дряново.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.3.3. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на приетия „Общински план за младежта“ и работата по 2 национални програми, насочени към младежката заетост.

**Мярка 1.3.4. Насочване на образованието и обучението към изграждане на умения и компетентности в съответствие с местния пазар на труда**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.3.4. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да се включи в обхвата на друга мярка като дейност.

**Мярка 1.3.5. Мерки за подобряване на услугите по активиране, помощ при търсенето на работа, съответствие между търсене и предлагане, преквалификация и индивидуализирани услуги за нискоквалифицираната работна ръка**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят 9 приключили проекта на Община Дряново.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.3.5. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро в резултат на проектите на проектната активност на Община Дряново, реализирали проекти по ОПРЧР 2014-2020 г. и по националните програми за осигуряване на заетост.

**Мярка 1.3.6. Насочване на образованието и обучението към изграждане на умения и компетентности в съответствие с местния пазар на труда**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.3.6. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да се включи в обхвата на друга мярка като дейност.

**Мярка 1.3.7. Подкрепа за самонаети лица и начинаещи предприемачи чрез професионална квалификация и обучение на безработни, включително и тези от рискови групи**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.3.7. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да се включи в обхвата на друга мярка като дейност.

### **Мярка 1.3.8. Подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася 1 проект, насочен към подкрепа на настанените лица с различни степени на умствена изостаналост- мъже и жени в две защитени жилища в с. Царева ливада, Община Дряново за включване в пазара на труда, по начин, отговарящ на техните потребности и възможности.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.3.8. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на проекта на Сдружение „Дружество за умствено и психически увредени лица“, гр. Дряново, финансиран от ОПРЧР 2014-2020г.

### **Мярка 1.3.9. Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и заетост**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.3.9. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да се включи в обхвата на друга мярка като дейност.

## **Приоритет 1.4. „Развитие на туризма“.**

---

Приоритет 1.4. „Развитие на туризма“ е свързан с постигане на стабилен ръст на туристическия сектор, основно изискване е осигуряването на необходимите условия на достъпност и комфорт на обектите, без това да поставя в риск тяхната автентичност. За осигуряване на добра възвръщаемост от инвестициите и стабилен ръст на сектора, сериозни усилия ще се фокусират в съвременни методи на маркетинга на туристическите дестинации с фокус върху целостта и разнообразието на предлагания продукт.

В Приоритет 1.4. са включени 4 мерки.

#### **Мярка 1.4.1. Популяризиране на културното наследство на общината и развитие на културния туризъм**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят дейности, изпълнени от Община Дряново основно със събития от културния календар и партньорството с Министерство на туризма и периодично в Министерство на културата.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.4.1. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро в резултат на инвестиции във визуализационни елементи с туристическа информация, вкл. на български и английски език и QR код, който при сканиране отвежда към страница с повече данни, организиране на и други; провеждане на събори, фестивали, концерти, семинари, чествания и др., които допринасят за популяризиране на Дряново като целогодишна туристическа дестинация:

#### **Мярка 1.4.2. Подкрепа на инициативи за създаване на туристически продукти в областта на селския туризъм**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.4.2. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да се включи в обхвата на друга мярка като дейност.

#### **Мярка 1.4.3. Обособяване на нови и рехабилитация на съществуващи екопътеки и туристически маршрути с цел развитие на екотуризма**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят инвестициите в екопътеки и 1 проект в процес на изпълнение.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.4.3. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на проекта на Община Дряново „Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера“, финансиран от ПРСР 2014-2020г.

#### **Мярка 1.4.4. Развитие на MICE туризъм: целенасочена рекламна кампания, привличане на специализирани събития, разработване на инсентив пакети**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.4.4. не е отчетено изпълнение.**

В ПИРО е поставена амбициозната задача за развитие на MICE туризъм свързан с организирането на срещи, конгреси и изложби, привличане на специализирани събития,



разработване на инсентив пакети, чрез, които общината може да представи културните и историческите си забележителности. Но в Програмата за реализация на ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание относно наличието на суперструктура за реализиране на подобни мащабни събития.

## **Приоритет 1.5. „Развитие на селското и горското стопанство“**

---

Приоритет 1.5. „Развитие на селското и горското стопанство“ е свързан с повишаване конкурентоспособността на сектора и да осигури неговото устойчиво развитие, като се активизира инвестиционния процес, насочен към модернизиране на производствените структури – земеделски стопанства и преработватели на земеделска продукция, както и внедряване на иновативни решения в земеделската практика. Предвидено е реализацията на мерките да подкрепи насърчаване на иновациите, въвеждането на нови технологии и практики в селското стопанство, които да допринасят за задоволяване на увеличаващото се търсене на хранителни продукти и на възобновяеми селскостопански суровини по начин, щадящ и съхраняващ околната среда.

Ще се стимулира въвеждането на превантивни мерки за предпазването на горите от пожари, възстановяването на горските масиви и осъществяването на залесителните дейности с оглед увеличаване площите, използвани по устойчив начин, преобразуване на нискокачествената изоставена земя в гори, намаляване на почвената ерозия и подобряване на водния баланс.

В Приоритет 1.5. са включени 9 мерки.

### **Мярка 1.5.1. Стимулиране развитието на земеделие и животновъдство**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят 7 проекта в процес на реализация на частни бенефициенти.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.5.1. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на проектите на частни бенефициенти, финансирани от ПРСР 2014-2020 година

### **Мярка 1.5.2. Модернизация на материалните активи и производствените фактори**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят 8 проекта изпълнени или в процес на реализация на частни бенефициенти.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.5.2. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на проектите на изпълнени 5 проекта и 3 в процес на реализация частни бенефициенти, финансирани от ПРСР 2014-2020 година в следните населени места: с. Геша, с. Гостилица, с. Денчевци, с. Игнатовци, с. Косарка, с. Соколово, с. Царева ливада.

#### **Мярка 1.5.3. Повишаване информираността и професионалната квалификация на заетите в селското стопанство**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася 1 изпълнен проект на частен бенефициент.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.5.3. се осъществява частично.** Техническото изпълнение е незадоволително, защото е изпълнен само 1 проект в гр. Дряново.

#### **Мярка 1.5.4. Насърчаване на внедряването на иновациите и обмена на знания в областта на храните и земеделието**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.5.4. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да се включи в обхвата на друга мярка като дейност.

#### **Мярка 1.5.5. Модернизиране и разширяване на напоителните полета и внедряване на нови технологии за напояване**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.5.5. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание и възможността за финансиране във времеви период до 2030 година или да се включи партньорски проект.

#### **Мярка 1.5.6. Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и природосъобразно горско стопанство**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.5.6. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден

финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание, да се планира ресурс и заинтересовани страни – допустими бенефициенти за реализацията на проекти.

#### **Мярка 1.5.7. Устойчиво управление на горите и горския фонд**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася 1 изпълнен проект на частен бенефициент .

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.5.7. се осъществява частично.** Техническото изпълнение е незадоволително, защото е изпълнен само 1 проект в с. Керека.

#### **Мярка 1.5.8. Наблюдение, превенция и борба с пожарите**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025 г.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.5.8. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на дейността на общинската администрация.

#### **Мярка 1.5.9. Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят изпълнени инфраструктурни интервенции за превенция на риска от наводнения на територията на община Дряново.

*Оценка на мярката:* **Мярка 1.5.9. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на дейността на общинската администрация по изграждане и ремонт на подпорни стени, редовно почистване речните корита. Необходимо е да се предприемат дейности за реализиране на интегриран проект с Община Трявна за река Тревненска/Дряновска и с община Габрово за река Янтра.

### **Приоритет 1.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“**

---

Приоритет 1.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“, насочва усилията на община Дряново към спиране загубата на биологично разнообразие, чрез набилязване на мерки в защитените зони по Натура 2000, ефективна селскостопанска и риболовна политика, съгласувани действия против агресивни инвазивни видове, създаване на индикатори и мониторинг за биологичното разнообразие и информиране на обществеността. От друга страна въздействието на изменението на климата се

намалява чрез биологичното разнообразие, опазване на екосистемите и устойчивото им използване.

В Приоритет 1.6. са включени 2 мерки.

#### **Мярка 1.6.1. Опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 1.6.1. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не са посочени конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и не е предвиден финансов ресурс за нейното изпълнение. Препоръчително е при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание и да се планира ресурс.

#### **Мярка 1.6.2. Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа „Натура 2000“**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася изпълнението на 1 проект за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000


*Оценка на мярката:* **Мярка 1.6.2. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на проекта на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ Фондация, Дряново и Трявна, финансиран от ОПОС 2014-2020

### **Напредък по Стратегическа цел 2 „Развитие на човешките ресурси“**

Фокусът на стратегическа цел 2 е поставен върху развитието на човешкия ресурс като най-важен за жизнеността и просперитета на общината. Подобряване на образователните характеристики, услугите, достъпността и административния капацитет ще спомогне община Дряново а се развива успешно и да запази своите човешки ресурси с подобрен здравен и социален статус.

Стратегическата цел 2 съдържа 3 приоритета и 42 мерки, които се очаква да допринесат за съхраняването и развитието на човешките ресурси в общината

Фигура 8. Технически напредък на проектите по приоритети, допринасящи за постигане на Стратегическа цел 8

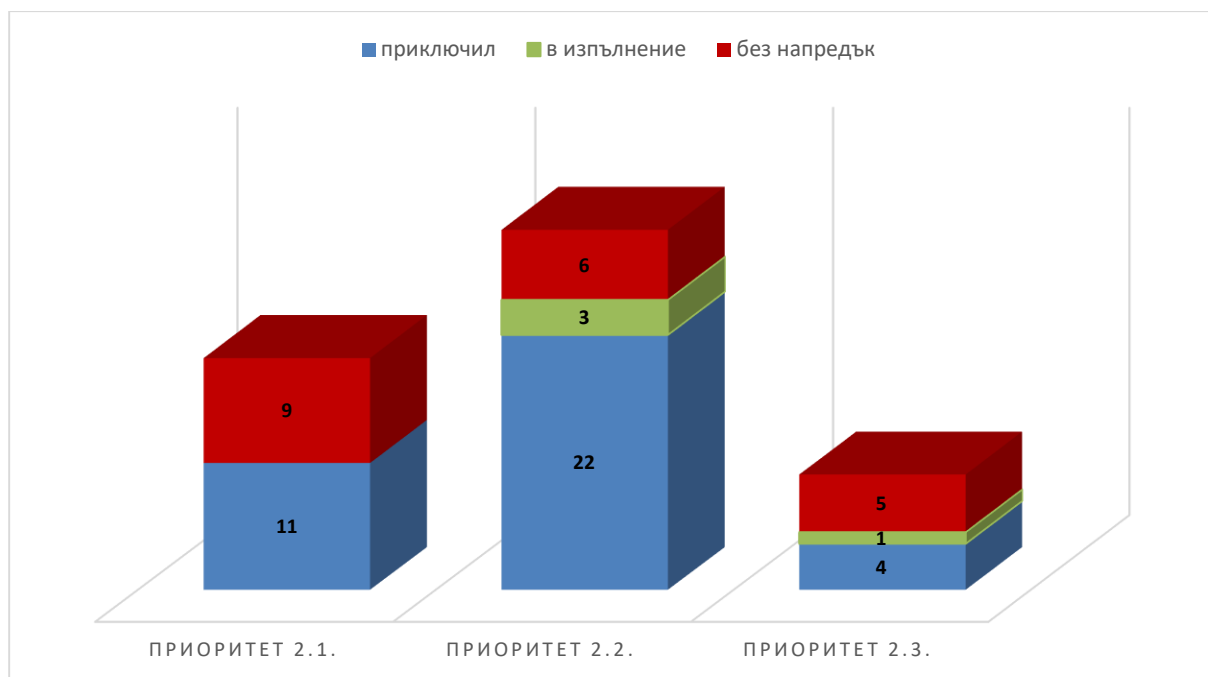

#### Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на общината“,

Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на общината“, е насочен към нарастване на дела на завършилите средно образование и насърчаване на участието на младите хора във формално и неформално образование и обучение. По-високото образование на младите хора е предпоставка за по-активно участие в различните форми и начини за учене през целия живот и за подобряване на образователната структура на населението. Значими усилия ще бъдат съсредоточени върху повишаването приложимостта на училищното образование за постигане на професионална реализация.

В Приоритет 2.1. са включени 18 мерки.

#### **Мярка 2.1.1. Осигуряване на условия за разширяване на обхвата на предучилищното образование и въвеждане на задължително образование за 4-годишните**

*Констатации:* Всички, подлежащи на задължително обучение в подготвителна група ромски деца са обхванати на 100%. В детската градина се обхващат все повече деца още от 3 годишна възраст, което предполага по-добро овладяване на българския език, придобиване на умения и навици и по-висока степен на готовност на тези деца за училище.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.1.1. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е отлично.

**Мярка 2.1.2. Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи училища**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят действията на общината за обезпечаване достъпа до образование до всички деца, живеещи в града и в селата на общината чрез осигурен специализиран транспорт до средищното училище СУ „Максим Райкович“.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.1.2. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е отлично.

**Мярка 2.1.3. Подкрепа за професионалните и специализирани училища**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася проекта на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“, гр. Дряново „Професионалното образование - традиция и нови възможности“

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.1.3. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро.

**Мярка 2.1.4. Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и др. уязвими групи за придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от училищата;**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася 2 проекта на Община Дряново за овладяване на български език и за социално – икономическа интеграция на уязвими групи.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.1.4. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на дейността на общинската администрация и педагогическия персонал на образователните институции.

**Мярка 2.1.5. Изграждане на връзки между образованието, науката и бизнеса, насочени към развитието на общината**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася изпълнението на проекти на училищата, финансирани от програмите на МОН.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.1.5. се осъществява частично** Техническото изпълнение е добро в резултат на дейността на общинската администрация и педагогическия персонал

в учебните заведения. Препоръчително е прецизиране на формулировката при актуализация на ПИРО и определяне на финансов ресурс.

**Мярка 2.1.6. Продължаване на действието на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.1.6. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не е планиран финансов ресурс, необходимо е при актуализация мярката да отпадне, защото продължаване на действието на Националните програми на МОН не е в правомощията на Община Дряново, а е възможност за финансиране на проекти на училищата.

**Мярка 2.1.7. Продължаване на действието на Национална програма „Обучение за ИТ кариера“**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.1.7. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО не е планиран финансов ресурс, необходимо е при актуализация мярката да отпадне, защото продължаване на действието на Националните програми на МОН не е в правомощията на Община Дряново, а е възможност за финансиране на проекти на училищата.

**Мярка 2.1.8. Синхронизиране на план-приема на ученици в професионалните училища, в съответствие с потребностите на реалния бизнес и спецификите на общината**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.1.8. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и без предвиден финансов ресурс е необходимо при актуализация на ПИРО мярката да отпадне.

**Мярка 2.1.9. Развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.1.9. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и без предвиден финансов ресурс е необходимо при

актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание или да бъде включена като дейност към Мярка 2.1.3. Подкрепа за професионалните и специализирани училища.

#### **Мярка 2.1.10. Разработване на програми за привличане и задържане на децата в училище**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите, реализирани дейности по привличане и работа с родителите на ученици от етническите малцинства и др.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.1.10. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на дейността на общинската администрация и педагогическия персонал в учебните заведения.

#### **Мярка 2.1.11. Приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася създадената в образователните институции подкрепяща среда за включване на деца със СОП в образователния процес.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.1.11. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на дейността на общинската администрация и педагогическия персонал в учебните заведения.

#### **Мярка 2.1.12. Прилагане на механизми за социална подкрепа**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася силно изявената местна политика на Община Дряново за подкрепа на деца с изявени дарби, финансова подкрепа на деца сираци и полусираци, на които предстои завършване на средно образование и други.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.1.12. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на дейността на общинската администрация и педагогическия персонал в учебните заведения.

#### **Мярка 2.1.13. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.1.13. не е отчетено изпълнение.** Необходимо е актуализация на ПИРО за мярката да бъде предвиден финансов ресурс и източници на финансиране за изпълнението ѝ или да бъде трансформирана като дейност.



**Мярка 2.1.14. Изграждане на капацитет, с цел подобряване на предлагането и достъпа до възможности за качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията/преквалификация на възрастни**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.1.14. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, които да допринесат за изпълнение на мярката и без предвиден финансов ресурс е необходимо при актуализация на ПИРО да бъде обмислено нейното съдържание, да бъде отнесена към друга мярка или да отпадне.

**Мярка 2.1.15. Осигуряване на по-лесен достъп до целеви обучения, информационни и демонстрационни дейности, особено за земеделските производители и горски стопани, обитаващи периферните и отдалечени райони**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.1.15. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, които да отговорят на въпроса „Как ще се осигури този достъп“, без предвиден финансов ресурс и източници за обезпечаването, мярката е неизпълнима и следва да отпадне.

**Мярка 2.1.16. Осигуряване на достъп до формите на учене през целия живот чрез културни институции (библиотеки, читалища, музеи), спортни организации и др., насочени към нови целеви групи със специфични потребности и живеещи в отдалечени места.**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.1.15. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, които да отговорят на въпроса „Как ще се осигури този достъп“, без предвиден финансов ресурс и източници за обезпечаването, мярката е неизпълнима и следва да отпадне.

**Мярка 2.1.17. Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните организации, бизнеса и местната власт**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.1.17. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, конкретни ангажименти на партньори, както и възможността за финансиране мярката е неизпълнима.

**Мярка 2.1.18. Осигуряване на компютър за всяко дете. Засилване на употребата на ИКТ като част от модернизирания образователна инфраструктура (посредством подкрепа за обновяване, осигуряване на достъп за хора с увреждания и др.)**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят училищни проекти по програмите на МОН.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.1.18. се осъществява частично.** Техническото изпълнение е незадоволително. Формулировката на мярката следва да се прецизира, защото няма връзка между ИКТ и достъпа за хора с увреждания при така направената формулировка.

## **Приоритет 2.2. „Подобряване на услугите и достъпността“**

---

Приоритет 2.2 предвиждат инвестиции както във физическите параметри на заведенията, в които се предлагат тези услуги (сгради, оборудване и т.н.), и в подобряване на количеството и качеството на предлаганите услуги.

В Приоритет 2.2. са включени 15 мерки:

**Мярка 2.2.1. Териториално фокусиране на интервенциите, което да подобри достъпа на населението до първична, специализирана и болнична помощ.**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят извършените инвестиции в подобряване здравната инфраструктура.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.2.1. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро - реализирани са инвестиции в Поликлиниката, здравните служби, детската ясла, здравните кабинети в училищата.

**Мярка 2.2.2. Инвестиране в мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.2.2. не е отчетено изпълнение.** Инициерирането на мерки не е ефективно да бъде формулирано като мярка в ПИРО. Препоръчва се при актуализация на ПИРО да отпадне.

**Мярка 2.2.3. Подобряване на материално-техническата база на лечебните заведения на територията на общината, както и повишаване на осигуреността им с медицинска апаратура и медицински специалисти**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката през е осигурено финансиране за закупуване на физиотерапевтично оборудване за дейността на Медицински център Пулс

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.2.3. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е незадоволително, но с изпълнението на проект по ПРСР 2014-2020г. ще бъде осъществен напредък.

#### **Мярка 2.2.4. Инициране участие и реализиране на програми и проекти в сферата на здравеопазването към Министерство на здравеопазването и Европейските структурни и инвестиционни фондове**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.2.4. не е отчетено изпълнение.** Проектната активност на общината и на други организации не изисква дефинирането на конкретна мярка. От направения запис не става ясно по какъв начин ще стане иницирането. Препоръчва се мярката да отпадне.

#### **Мярка 2.2.5. Развитието на електронното здравеопазване**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.2.5. не е отчетено изпълнение.** В ПИРО за изпълнение на мярката не са посочени конкретни дейности, бюджет и източници на финансиране. Препоръчва се отпадането ѝ.

#### **Мярка 2.2.6. Прилагане на мерки за намаляване на основни рискови за здравето фактори и подобряване профилактиката на болестите**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката са изпълнени дейности за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, създаден е Общински социален фонд за подпомагане лечение на граждани, подпомагат се деца сираци, новородени и други.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.2.6. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро.

#### **Мярка 2.2.7. Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за лица с увреждания и възрастни граждани**

*Констатации:* В ПИРО на Община Дряново са записани 2 конкретни услуги: Създаване и поддържане на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост и Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства. През периода и за двете услуги за реализирани проекти на Община Дряново

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.2.7. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е отлично, което е резултат от конкретното планиране и изпълнението на 3 проекта, свързани с

**Мярка 2.2.8. Създаване на други видове социални услуги (за спешно настаняване, ранна интервенция, консултативни за деца и семейства и т.н.)**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката са реализирани 5 проекта и в процес на изпълнение са 2 проекта с бенефициент Община Дряново.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.2.8. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро, като са осигурени социално – здравни услуги, топъл обяд и др., финансирани от фондовете на ЕС.

**Мярка 2.2.9. Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят реализирани проекти на Община Дряново за осигуряване на заетост.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.2.9. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро като е осигурено финансиране от националните програми на Агенция по заетостта, ОПРЧР.

**Мярка 2.2.10. Разработване на мерки за приобщаване на уязвимите групи**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася сътрудничеството между Община Дряново и Дирекция „Социално подпомагане“

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.2.10. се осъществява частично.** Препоръчително е мярката да бъде трансформирана или да отпадне при актуализация на ПИРО.

**Мярка 2.2.11. Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката са извършени ремонтни дейности на общински жилища.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.2.11. се осъществява частично.** Техническото изпълнение е незадоволително поради недостиг на общински жилища, които са остарели и амортизирани и недостигът на средства. В дългосрочен план трябва да се търси решение на липсата на нови общински жилища, за задоволяване на социалните ангажименти на общината.

### **Мярка 2.2.12. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.2.13. не е отчетено изпълнение.** Формулировката е неясна, обхваща различни тематични направления, не са посочени конкретни дейности и не е финансово обезпечена в ПИРО. Осигуряването на достъпната среда се осъществява в рамките на конкретни инфраструктурни проекти. Препоръчва се мярката да отпадне при актуализация на ПИРО и да бъде посочена като дейност.

### **Мярка 2.2.13. Подобряване на достъпа до изкуство**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.2.13. не е отчетено изпълнение.** При така направената формулировка, без посочване на конкретни дейности, конкретни ангажименти на партньори, както и възможността за финансиране мярката е неизпълнима.

### **Мярка 2.2.14. Съхраняване, укрепване и популяризиране на културни и духовни празници и културни събития в общината**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.2.14. не е отчетено изпълнение.** Установено е смислово дублиране с обхвата на Мярка 1.4.1. Популяризиране на културното наследство на общината и развитие на културния туризъм и се препоръчва отпадането ѝ при актуализация на ПИРО.

### **Мярка 2.2.15. Изготвяне и реализиране на програми за развитие на детско-юношеския и ученически спорт**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася ежегодната подкрепа на спортните клубове в общината.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.1.15. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на дейността на общинската администрация.

## **Приоритет 2.3. „Повишаване на административния капацитет и качеството на административното обслужване“**

---

Приоритет 2.3. „Повишаване на административния капацитет и качеството на административното обслужване“ е насочена към осигуряване на ефективни публични услуги, като необходими условия за благоприятна жизнена и бизнес-среда, икономически растеж и високо качество на живота. Предвидените мерки се очаква да допринесат за укрепване на институционалната среда, въвеждането на принципите на открито управление и добра информираност. Дейностите в приоритета са насочени към формулиране и прилагане на ефективни политики, намаление на административната тежест за бизнеса и домакинствата и оптимално изразходване на финансовите ресурси.

В Приоритет 2.3. са включени 9 мерки.

### **Мярка 2.3.1. Дигитализация на административни услуги и създаване и усъвършенстване на нови форми на административно обслужване -е-правителство и др.**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася извършената дигитализация на актове за раждане и актове за брак. Общинската администрация надгражда функциите си посредством внедрената Единна интегрирана информационна система на община – ИМЕОН. През 2023г. приключва изпълнението на проект за мониторинг на системата за дигитални административни услуги в община Дряново за подобряване на административната и регулаторната среда чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.3.1. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро в резултат на изпълнения проект и извършената дигитализация на административни архиви. В ПИРО е записана дейността „Ефективно електронно управление в Община Дряново обслужване -е-правителство и др.“, която се изпълнява.

### **Мярка 2.3.2. Въвеждането на електронни обществени поръчки и процедури за отдаване на концесии**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.3.2. не е отчетено изпълнение.**

### **Мярка 2.3.3. Подобряване на знанията на служителите в областта на информационните технологии**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.3.3. не е отчетено изпълнение.**

#### **Мярка 2.3.4. Усвояване на добри практики в повишаване на административния капацитет**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася осигуреното финансиране за дейности, които целят да повишат компетенциите и капацитета на Общинска администрация Дряново и нейните социални партньори за упражняване на правомощията и задълженията по ЗСУ, ЗХУ, ЗЛП и да подобрят качеството на социалните услуги.

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.3.4. се осъществява частично.** Техническото изпълнение е незадоволително, но с осигурения ресурс за реализиране на проект „Укрепване на капацитета на Община Дряново за провеждане на устойчиви социални политики на местно ниво“ по ПРЧР 2021-2027 предстои постигане на напредък.

#### **Мярка 2.3.5. Подобряване на уменията за управление на проекти**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.3.5. не е отчетено изпълнение.**

#### **Мярка 2.3.6. Подобряване на уменията на местните партньори за разработване, финансиране и управление на съвместни проекти**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.3.6. не е отчетено изпълнение.**

#### **Мярка 2.3.7. Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация и изграждане на информационни системи в помощ на инвеститорите**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 2.3.7. не е отчетено изпълнение.**

#### **Мярка 2.3.8. Стратегическо планиране и общински политики**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася изпълнението на 1 проект на Община Дряново

*Оценка на мярката:* **Мярка 2.3.8. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро с изпълнение на Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Местна инициативна група „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“.

### Мярка 2.3.9. Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася подписано между Агенция по геодезия, картография и кадастър и Община Дряново, считано от 01.01.2021г. Община Дряново подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР.


*Оценка на мярката:* **Мярка 2.3.9. се осъществява успешно.** Административното обслужване обхваща: информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от ККР; приемане на заявления за извършване на официални документи и тяхното предоставяне на потребителите; приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

### Напредък по Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и свързаност“

Стратегическата цел е ориентирана към изграждане на адекватна инфраструктура за осигуряване на по-качествена среда за населението на общината. Стратегическата цел обхваща следните четири приоритета:

Стратегическата цел 3 съдържа 5 приоритета и 22 мерки.

Фигура 9. Технически напредък на проектите по приоритети, допринасящи за постигане на Стратегическа цел 3

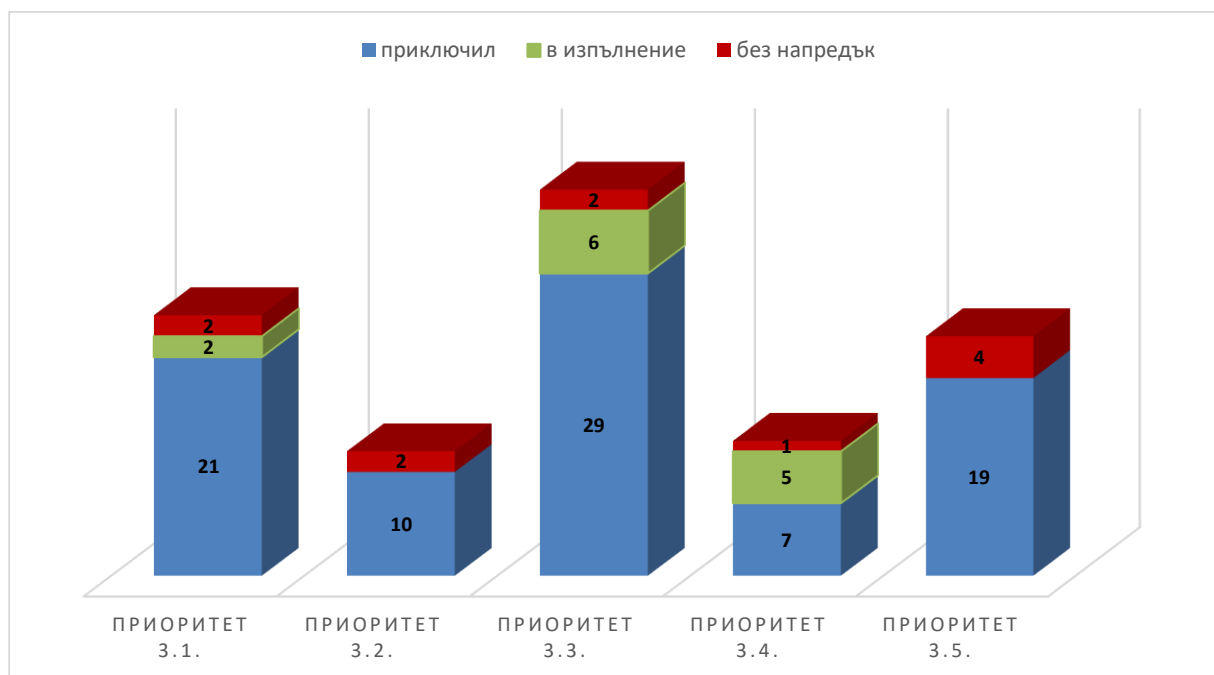



### **Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“**

---

Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“ е насочен към развитието на транспортната и дигитална инфраструктура на общината, което ще увеличи конкурентните ѝ предимства и ще доведе до възможност за осигуряване на равен достъп на всички жители, независимо от тяхното местожителство до пазара на труда, икономически и социални функции и услуги.

В Приоритет 3.1. са включени 4 мерки.

#### **Мярка 3.1.1. Изграждане на регионалната транспортна свързаност**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 3.1.1. не е отчетено изпълнение.**

#### **Мярка 3.1.2. Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и привеждането ѝ в съответствие с европейските изисквания**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят изпълнените рехабилитационни дейности в общински пътища, вкл. осигуряване на финансиране за реализиране на мащабен инвестиционен проект „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в Община Дряново“ по ПРСР 2014-2020.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.1.2. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на извършени инвестиции в реконструкция на общински пътища.

#### **Мярка 3.1.3. Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа, паркинги и паркоместа**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят извършените ремонтни дейности по уличната инфраструктура на територията на общината.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.1.3. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро, вкл. и приключеното изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново“, финансиран от ПРСР 2014-2020

#### **Мярка 3.1.4. Модернизация на телекомуникационната мрежа и развитие на мрежите за достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернетна територията на общината**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 3.1.4. не е отчетено изпълнение.**

## **Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“**

---

Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“ продължава изпълнението на мерките и дейностите по оптимизация на системата за управление на отпадъците. Предприемат се действия, насочени към изпълнение на пакета „Кръгова икономика“ с цел превръщане на отпадъците в ресурси. Приоритет е изграждането и реконструкцията на ВИК мрежата. Изготвени са ВиК проекти за водоснабдяване на с. Чуково, с. Марча и вилна зона „Манга“. Предвижда се въвеждане в експлоатация на инсталацията за компостиране, намаляване на депонирания отпадък и създаване на предпоставки за събиране и рециклиране на строителни отпадъци (развитие на услугата с контейнери), с което значително се повиши ефективността на общинско предприятие „Чисто Дряново“.

В Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“ са включени 8 мерки.

### **Мярка 3.2.1. Поддържане и ремонт на съществуващите водоеми и изграждане на нови**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 3.2.1. не е отчетено изпълнение.**

### **Мярка 3.2.2. Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и пречиствателни станции за питейна вода**

*Констатации:* В ПИРО за изпълнението на тази мярка да посочени 2 дейности/проекти: Рехабилитация и подмяна на водопроводи и Изграждане на ПСОВ. Напредък се отчита по едната дейност чрез проект за водоснабдяване на кв. „Марча“ и село Крънча. изпълнен е основен ремонт на водопровод на главен път, с. Царева ливада.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.2.2. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро в резултатна инвестициите във водопроводната мрежа.

### **Мярка 3.2.3. Изграждане на водоизточници и санитарно-охранителни зони около водоизточниците**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 3.2.3. не е отчетено изпълнение.**

#### **Мярка 3.2.4. Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното ограничаване**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринася почистването на нерегламентирани сметища и изградената система за управление на дървесни отпадъци на частно предприятие.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.2.4. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро.

#### **Мярка 3.2.5. Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваша преработката на смет и отпадъци**

*Констатации:* За напредък по изпълнение на мярката допринасят при въведената система за управление на отпадъците в Община Дряново – предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране. Организирано е разделно събиране на биоотпадъци и компостиране, на отпадъци от опаковки, на НУБА, ИУЕЕО, текстилни отпадъци, опасни отпадъци, строителни отпадъци.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.2.5. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро.

#### **Мярка 3.2.6. Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и сметоизвозване в общината**

*Констатации:* Услугата по сметосъбиране, сметоизвозване на ТБО и почистване на териториите за обществено ползване в населените места се предоставя от Общинско предприятие „Чисто Дряново“. Регулярно се закупуват и се ремонтират съдове за битови отпадъци. През 2023 г. е закупен нов специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване, за нуждите на Община Дряново.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.2.6. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро.

#### **Мярка 3.2.7. Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи замърсяванията**

*Констатации:* Напредъкът се отчита чрез създадените условия за разделно събиране на отпадъци от опаковки и НУБА.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.2.7. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро. Препоръчва се обединяване на мярката, защото смислово площадките и съоръженията са част от цялостната инфраструктура за управление на отпадъците.

**Мярка 3.2.8. Изграждане на системи за ранно предупреждение ще бъдат допълнително засилени, включително и техническия капацитет в прогнозирането и управлението на риска от бедствия.**

*Констатации:* Изпълнява се Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025 г.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.2.8. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро. Препоръчва се мярката да се обвърже с Мярка 1.5.9. Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите.

### **Приоритет 3.3. „Развитие на културната и спортната инфраструктура“**

---

**Приоритет 3.3. „Развитие на културната и спортната инфраструктура“** е насочен към модернизирание, реконструкция и изграждане на нова база за масов спорт, изграждане на спортни зали/инфраструктури за развитие на професионален спорт, поддържане на открити и закрити спортни площи и поддържане и обогатяване на културната инфраструктура и достъпа до изкуство.

В Приоритет 3.3. „Развитие на културната, образователна, спортната и туристическа инфраструктура“ са включени 6 мерки.

#### **Мярка 3.3.1. Поддържане и обогатяване на културната инфраструктура**

*Констатации:* В ПИРО са включени 4 конкретни дейности за изпълнение на мярката: 1. Реставрация на сгради паметници на културата - аварийно смъкване, сортиране и подреждане каменни плочи на покрив на Лафчиева къща; в процес на изпълнение са проекти за ремонт, подобряване на прилежащите пространства и оборудване на църква „Свети Николай“ – с. Янтра; ремонт, реставрация и подобряване на околното пространство на част от манастирски комплекс „Дряновски манастир „Св. Арх. Михаил“, град Дряново; ремонт, реконструкция, възстановяване, консервация и реставрация на килийно училище“ към Църква „Свети Въведение Богородично“ град Дряново; Реконструкция и възстановяване на църква „Св. Рождество Богородично“ село Гостилица. 2. Подобряване на материално техническата база на културната инфраструктура: Развитие на културната инфраструктура в община Дряново чрез обновление и модернизация на Културния дом, извършени са ремонтни дейности, изградена е отоплителна и вентилационна инсталация на голям салон на Културен дом Дряново. В процес на изпълнение е проект придобиване на мобилна сцена за обогатяване на събитийния календар на община Дряново; Ремонт, обзавеждане и оборудване на Туристически информационен център в гр. Дряново“. 3. Реконструкция, ремонт и

обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в читалищните сгради в община Дряново по която се отчита напредък. Интервенции са осъществени в Народните читалища в с. Керека, с. Зая, с. Туркинча, Народно читалище „Развитие 1869“ – гр. Дряново, Читалище „Светлина - 1922“ и Пощенска станция, в с. Скалско и др. В процес на изпълнение е изграждане на декор-стена за катерене в Народно читалище „Развитие - 1869“ /Лятно кино/. 4. Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи екопътеки и туристически маршрути в община Дряново – дейността се дублира с Мярка 1.4.3. Обособяване на нови и рехабилитация на съществуващи екопътеки и туристически маршрути с цел развитие на екотуризма.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.3.1. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е отлично в резултат на изпълнените проекти и привлечения сериозен финансов ресурс за проекти, които са в процес на изпълнение.

### **Мярка 3.3.2. Изграждане на спортни зали/инфраструктури за развитие на професионален спорт, поддържане на открити и закрити спортни площи**

*Констатации:* За изпълнение на мярката Община Дряново през целия период осигурява инвестиции в строително – ремонтни дейности и оборудване за спортните обекти на територията на общината: Многофункционална спортна зала; стадион „Локомотив“ в гр. Дряново, стадион „Републиканец“ в с. Царева ливада, осветление на тенис кортове. С цел бъдещо изграждане на спортен комплекс в село Гостилица е закупен недвижим имот, намиращ се в близост до общински терен, с цел неговото разширяване до необходимата площ.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.3.2. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е отлично в резултат на изпълнените проекти, вкл. с финансиране от ПРСР 2014-2020.

### **Мярка 3.3.3. Модернизиране, реконструкция и изграждане на нова база за масов спорт**

*Констатации:* Изпълнява се Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025 г.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.3.3. се осъществява частично.** Необходимо е предефиниране на мярката и обединяването ѝ с Мярка 3.3.2. Изграждане на спортни зали/инфраструктури за развитие на професионален спорт, поддържане на открити и закрити спортни площи като се посочи спортна инфраструктура за масов и професионален спорт.

### **Мярка 3.3.4. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт**

*Констатации:* Мярката се дублира с Мярка 2.2.12. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт

*Оценка на мярката:* По **Мярка 3.2.3. не е отчетено изпълнение.**

#### **Мярка 3.3.5. Изграждане на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината**

*Констатации:* Мярката смислово се с обхвата на мерките, включени в Приоритет 1.4. „Развитие на туризма“.

*Оценка на мярката:* По **Мярка 3.2.3. не е отчетено изпълнение.** Препоръчва се да отпадне от Приоритет 3.3. и да се включи в Приоритет 1.4.

#### **Мярка 3.3.6. Подобряване на общинската образователна инфраструктура включително внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради/помещения на образователната инфраструктура, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.**

*Констатации:* В ПИРО са включени 2 дейности: 1.Подобряване на материално техническата база на общинските училища. Мярката цели изграждане на интерактивни кабинети, ресурсни кабинети, ремонт на спортни площадки, физкултурни салони и други в общинските училища на територията на Общината. През периода са извършвани инвестиции. 2. Подобряване на материално техническата база на ДГ Детелина. Мярката има за цел подобряване на материално техническата база не само на ДГ Детелина, но и на база Иглика, и базата в Царева Ливада. През периода са извършени инвестиции в ДГ Детелина в база „Иглика“ към ДГ „Детелина“, гр. Дряново.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.3.6. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро. Препоръчва се мярката да бъде обвързана с приоритетите за образование към Стратегическа цел 2.

### **Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура**

---

Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура е насочен към изграждане и обновяване на електропреносната мрежа, намаляване на емисиите на парникови газове, чрез увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници, подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд.

В Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура са включени 3 мерки.

#### **Мярка 3.4.1. Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък

*Оценка на мярката:* По **Мярка 4.3.1. не е отчетено изпълнение.**

#### **Мярка 3.4.2. Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на алтернативните източници на енергия**

*Констатации:* В ПИРО по 3.4.2 се предвижда диверсификация на енергийните доставки и нарастване дела на възобновяемите чрез евентуални инвестиции в инсталиране на генератори за вятърна и соларна енергия, насърчаване изграждане на соларни паркове) извличане енергията на биомасата. Отчитане на напредъка е свързан с реализирането на 2 проекта на частни бенефициенти за изграждане на фотоволтаични централи в землището на град Дряново.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.4.2. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на осигурените инвестиции.

#### **Мярка 3.4.3. Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и на уличното и парковото осветление**

*Констатации:* През периода са реализирани проекти за подобряване енергийната ефективност на уличното и парково осветление, на публични сгради. За отчетения напредък допринасят и одобрените проекти на Община Дряново за енергийно ефективно осветление в община Дряново, Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация Дряново“ и проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Дряново, ул. „Шипка“ 143.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.4.3. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е много добро.

### **Приоритет 3.5. „Развитие на градска инфраструктура“**

---

В ПИРО в текстовата част е посочено, че Приоритет 3.5. „Развитие на градска инфраструктура“ включва 1 мярка. В Приложение 1. Програма за реализация са описани 2 мерки:

Мярка 3.5.1 Изпълнени проекти за благоустрояване на градската среда (площади, инфраструктура в жилищни квартали и др.)

Мярка 3.5.2 Изпълнени проекти за изграждане и обновяване здравната и социалната инфраструктура

При извършване на оценката се разглежда обхвата на 2-те мерки.

### **Мярка 3.5.1 Изпълнени проекти за благоустрояване на градската среда (площади, инфраструктура в жилищни квартали и др.)**

*Констатации:* В Програмата за реализация на ПИРО (Приложение 1) са посочени 6 конкретни обекта: Ремонт и обновяване на площадно пространство в гр. Дряново; Изграждане на пешеходна и велоалея от моста на Колю Фичето до Дряновския манастир; Изграждане на покрит пазар за местни производители; Обновяване на ключови обществени сгради в град Дряново. За дейността „Ремонт и рехабилитация на пешеходната зона в град Дряново“ е извършено проектиране през 2022г. По посочените обекти не се отчита напредък и предстои изпълнение в оставащия период на действие на ПИРО. По 1 конкретна дейност има напредък – изграждане на детски площадки.

*Оценка на мярката:* **Мярка 3.5.1. се осъществява успешно.** Техническото изпълнение е добро в резултат на инвестициите в детски площадки и допълнителни обекти в населените места, допринасящи за изпълнението на мярката.

### **Мярка 3.5.2 Изпълнени проекти за изграждане и обновяване здравната и социалната инфраструктура**

*Констатации:* По изпълнение на мярката не е отчетен напредък. В Приложение 1 Програма за реализация на ПИРО е посочено: Проектът предвижда създаване на дневни центрове и центрове за грижа и предоставяне на услуги в тях. Мярката дублира с Мярка 2.2.7. Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за лица с увреждания и възрастни граждани.

*Оценка на мярката:* По **Мярка 3.5.2. не е отчетено изпълнение.**

## **Заклучение**

Анализът показва, че най-ефективно е изпълнена **Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и свързаност“**, като е постигнато **отлично изпълнение - 78,18%**, в резултат на работата на общинската администрация за реализиране на сериозни проекти за изграждане на адекватна инфраструктура за осигуряване на по-качествена среда за населението на общината.

За изпълнението на **Стратегическа цел 2 „Развитие на човешките ресурси“** е постигнато **добро изпълнение - 60,66%**, в резултат на реализирани проекти в сферата на



образованието, социалните услуги, здравеопазването, вкл. и укрепване на административния капацитет.

За изпълнението на **Стратегическа цел 1. „Подем в икономиката“** се отчита **много добро изпълнение** - 54,17%, в резултат на изпълнени проекти на общинската администрация за превенция на риска и има високата проектна активност на местния бизнес.

**Общото техническо изпълнение на ПИРО на Община Дряново на етап междинна оценка е отлично от 81,27%** или 217 проекта/дейности, от които 175 приключили и 42 в процес на изпълнение, които реално ще бъдат завършени към края на периода на действие на документа.

## 2.2. Оценка на финансово изпълнение на ПИРО

В настоящата точка е представено финансовото изпълнение на ПИРО на Община Дряново, на база количествен анализ, при който единичните финансови параметри на остойностените проекти/ дейности са обобщени в общо финансово изпълнение.

Получените стойности и тяхното съпоставяне с планирания финансов ресурс в Програмата за реализация на ПИРО позволява да се направи количествена оценка за степента на изпълнение на приоритетите - финансово изпълнение се използва като индикатор за степента на постигане на приоритетите.

Разработването на ПИРО се базира на „интегрирания подход“ в стратегическото планиране. В резултат, отделните приоритети са с дефиниции и обхват, така че да допринасят заедно за постигането на стратегическите цели.

Всеки приоритет има определен принос към стратегическите цели на ПИРО и по този начин проследените резултати за приоритетните области отразяват степента на постигане на целите. Методиката на работа включва: разпределение на бюджета на даден проект според наличната информация за дяловете на различните финансови източници; сумиране на общите стойности за всички изпълнени проекти; разпределение на общата сума по приоритети и източници.


Таблица 2. Финансово изпълнение на ПИРО на Община Дряново за периода 2014-2020 г. (в хил. лв.)

Стратегическа цел	Планирани (общо в хил. лв.) - 2021 - 2027	Изпълнение 2021 - 2023 г.	
		общо в хил. лв.	%
Стратегическа цел 1 „Подем в икономиката“	10 750	10 212	95%
Стратегическа цел 2 „Развитие на човешките ресурси“	5 450	7 277	134%
Стратегическа цел 3 „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и свързаност“	92 480	15 710	17%
<b>ОБЩО</b>	<b>108 680</b>	<b>33 200</b>	<b>31%</b>

Общата финансова равностетка за реализация на ПИРО – Дряново в междинния период на изпълнение (периода 2021 – 2023г.) е 33 199 784 лв.

Анализът, който по същество е част от параметъра „ефикасност на използваните ресурси“ показва, че общите разходи за финансовото изпълнение на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2023 г. на етап междинна оценка е **31%**, от планирания индикативен финансов ресурс. Този резултат е показателен за постигнато добро изпълнение.

Фигура 10. Финансово изпълнение на Стратегическите цели на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2023 г. (в хил. лева)

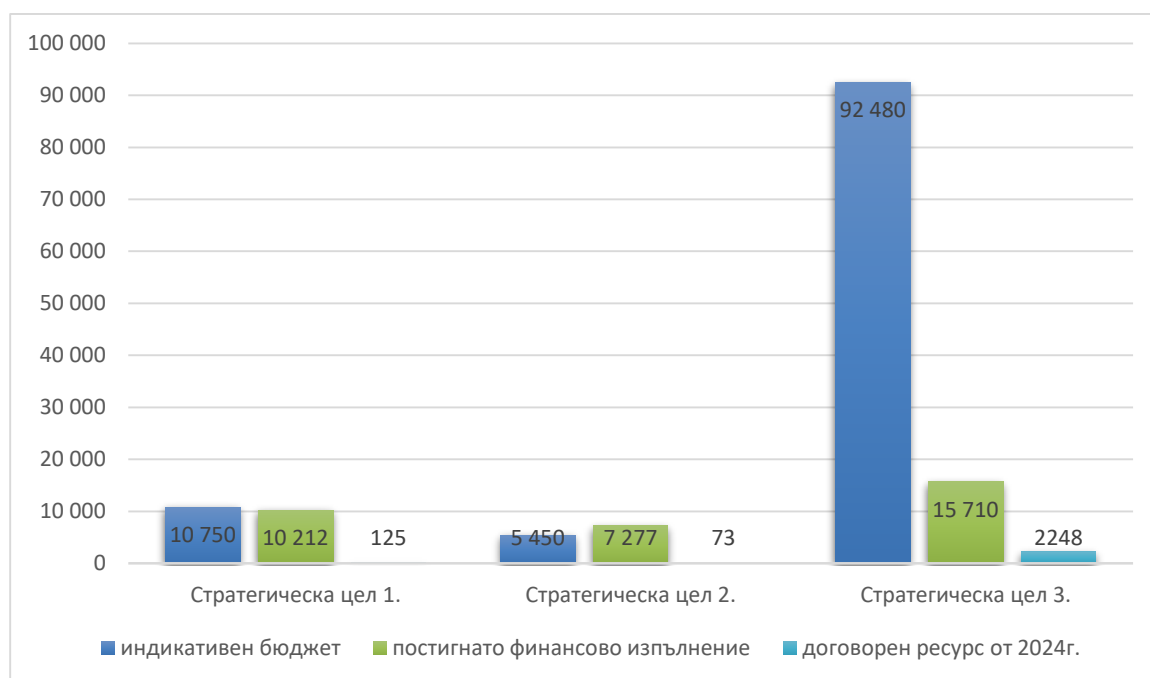


Стойностите на финансовото изпълнение на **Стратегическа цел 1** „Подем в икономиката“ са 95%, като изпълнението е от 10 212 016 лв. от общо планирания 10 750 000лв. Основен принос имат реализираните проекти на частни бенефициенти.

По-детайлен анализ на финансовото изпълнение на междинния етап от изпълнение на ПИРО на Община Дряново показва най-добро финансово изпълнение през периода 2021 – 2023г. по **Стратегическа цел 2** „Развитие на човешките ресурси“, където е постигнато 134% изпълнение или реализирани 7 277 498 лв. спрямо планираните 5 450 000 лв.

По **Стратегическа цел 3**. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и свързаност“ са вложени най-много средства - 15 710 270 лв., които формират дял едва от 17% спрямо планираните – 92 480 000 лв. За изпълнението на проектите, заложи в тази стратегическа цел е осигурен финансов ресурс в размер на 2 248 374 лв. за които са подписани проекти в края на 2023 година и реалното изпълнение ще започне през 2024г.

Фигура 11. Разпределение на финансовите ресурси по години (хил. лв.)

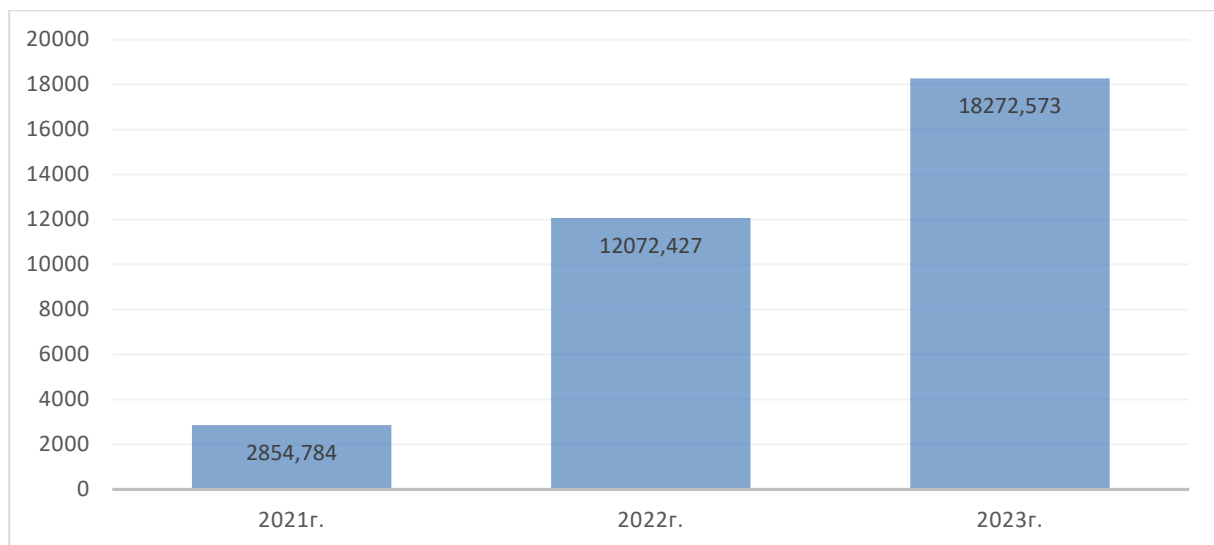

С най-висока динамика на инвестиции за изпълнение на ПИРО е 2023 г, когато приключва значителна част от проекти на Община Дряново, финансирани от оперативните програми за периода 2014 – 2020 година и започна финансирането по някои от програмите за новия период 2021 – 2027 година. Забавянето на отваряне на схеми за финансиране по одобрените от Европейската комисия програми забави темповете за кандидатстване, но общинската администрация има готовност да участва на конкурентен принцип и да ускори процеса по изпълнение на ПИРО.

### 2.3. Отчитане актуалните стойности на индикаторите от ПИРО

Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за резултат, проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за продукт, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида индикатори са въведени в следствие на предписанията от „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“. При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2021-2027г.<sup>4</sup>

След оценката за степента на техническо и финансово изпълнение на проектите, следва отчитане на актуалните стойности на индикаторите за измерване на целите и приоритетите от ПИРО. Сравнението между реалните и целевите стойности позволява втори подход за преценка на степента в реализацията на ПИРО. Разгледани са индикаторите с достоверен източник на информация към момента на изготвяне на оценката.

Постигнатите стойности показват добра степен на изпълнение за целите и приоритетите на плана. Значителна част от заложените икономически и социални индикатори са преизпълнени. Информационното осигуряване на останалите индикатори е свързано с дейността на ресорите в общинска администрация, които са предоставили данни към 2023 г. Част от индикаторите се проследяват с натрупване.

Таблица 3. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2027 г. – индикатори за резултат

№	Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (2020г.)	Целева стойност (2027г.)	Постигната междинна стойност (2021 - 2023г.)
<b>Стратегическа цел 1. „Подем в икономиката“</b>						
1	БВП на човек от населението в реално изражение	лв.	НСИ,ТСБ	13 510	18 000	.. <sup>5</sup>
2	Чуждестранни преки инвестиции на глава от населението	лв./човек	НСИ,ТСБ	779	5 000	327 лева/на човек <sup>6</sup>
<b>Стратегическа цел 2. „Развитие на човешките ресурси“</b>						

<sup>4</sup> Бележка: Списък на общите индикатори, съгласно проектите на Регламенти на ЕС за периода 2021-2027 г., е представен в Приложение № 3а към настоящите Методически указания.

<sup>5</sup> Бележка: липсват данни от НСИ

<sup>6</sup> Източник: НСИ, последни налични данни за 2021г.

№	Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (2020г.)	Целева стойност (2027г.)	Постигната междинна стойност (2021 - 2023г.)
3	Коефициент на безработица (15 – 64 навършени години)	%	НСИ,ТСБ	5.9	3	6,3%
<b>Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и свързаност“</b>						
4	Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение	км	НСИ, АПИ	0	20	<b>2,7</b>
5	Изградена или рехабилитирана вътрешна водопроводна мрежа в населените места	км	НСИ, община	0	20	<b>2,1</b>

Таблица 4. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2027 г. – индикатори за продукт

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност (2027г.)	Постигната междинна стойност (към 2022г.)
<b>Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“</b>						
Мярка 1.1.3 „Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за създаване на нови МСП“	Предприятия, получаващи подкрепа	бр.	Община Дряново;	ежегодно	20	8
Мярка 1.1.4 „Финансиране на стартапи“	Стартиращи предприятия, които получават подкрепа	бр.	Община Дряново;	ежегодно	20	1
Мярка 1.1.5 „Развитие на цифровата инфраструктура“	Предприятия, получаващи подкрепа за цифровизиране на своите продукти и услуги	бр.	Община Дряново;	ежегодно	10	0
<b>Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите“</b>						
Мярка 1.2.1 „Стимулиране на въвеждането на нови технологии и иновативни практики“	Номинална стойност на оборудването за научни изследвания и иновации	лв.	Община Дряново;	ежегодно	1 000 000	2 667 025
Мярка 1.2.4 „Насърчаване на	Домакинства, подкрепяни за	бр.	Община Дряново;	ежегодно	20	5 <sup>7</sup>

<sup>7</sup> Бележка: Посоченият брой е на предприятия, получили подкрепа за енергийна ефективност, ИСУН

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност (2027г.)	Постигната междинна стойност (към 2022г.)
фирми, реализиращи производствени модели в подкрепа на кръговата икономика“	използването на интелигентни енергийни мрежи					
<b>Приоритет 1.3. „Откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта“</b>						
Мярка 1.3.1 „Придобиване на ключови знания и умения“	Реализирани курсове за професионално обучение	бр.	Частен бизнес;	ежегодно	10	0
Мярка 1.3.6 „Насочване на образованието и обучението към изграждане на умения и компетентности в съответствие с местния пазар на труда“	Реализирани обучения по предприемачество, подготовка и управление на проекти	бр.	Частен сектор / НПО;	ежегодно	3	0 <sup>8</sup>
<b>Приоритет 1.4. „Изграждане на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината“</b>						
Мярка 1.4.2 „Подкрепа на инициативи за създаване на туристически продукти в областта на селския туризъм“	Туристи/ посещения в подпомогнатите обекти	бр.	Община Дряново;	ежегодно	3 000	0
<b>Приоритет 1.5. „Развитие на селското и горското стопанство“</b>						
Мярка 1.5.1 „Стимулиране на развитието на биодинамичното земеделие и животновъдство“	Създадени биоферми и биопроизводства, вкл. Преработка на земеделска продукция	бр.	ОДЗ	ежегодно	7	12
Мярка 1.5.8 „Наблюдение, превенция и борба с пожарите“	Жители, които се ползват от мерки за защита от горски пожари	бр.	Община Дряново	ежегодно	6 500	0
Мярка 1.5.9 „Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите“	Жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения и жители, които се ползват от мерки за защита срещу природни бедствия,	бр.	Община Дряново	ежегодно	6 500	7 531

<sup>8</sup> Бележка: Дублира мярка 1.3.4.

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност (2027г.)	Постигната междинна стойност (към 2022г.)
	свързани с климата (различни от наводнения и горски пожари)					
<b>Приоритет 1.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“</b>						
Мярка 1.6.1 „Опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.“	Изпълнени проекти за опазване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие	бр.	Община Дряново;	ежегодно	3	0
Мярка 1.6.2 „Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа „Натура 2000“	Площ на защитените зони по „Натура 2000“, обхванати от мерки за опазване и възстановяване в съответствие с рамката за приоритетни действия	кв.	Община Дряново	ежегодно	50	30 кв. м <sup>9</sup>
<b>Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на общината“</b>						
Мярка 2.1.1 „Осигуряване на условия за разширяване на обхвата на предучилищното образование и въвеждане на задължително образование за 4-годишните“	Годишен брой на децата, използващи подобрените условия	бр.	Община Дряново	ежегодно	30	44
Мярка 2.1.2 „Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без	Годишен брой на децата, използващи подобрените условия	бр.	Община Дряново	ежегодно	30	70

<sup>9</sup> В рамките на проект BG16M1OP002-3.032-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода ВОРМ в територията на МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, (26.04.2022 - 31.05.2024), МИГ, Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОРМ“, Бенефициент НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ Фондация, Дряново и Трявна, се предвижда изграждане на 12 бр. малки влажни зони, всяка с площ от 30 кв.м и максимална дълбочина до 1 м, като се предвижда земно покритие на дъното и бреговете (не от бетон или др. изкуствен материал).

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност (2027г.)	Постигната междинна стойност (към 2022г.)
функционални училища“						
Мярка 2.1.3 „Подкрепа за професионалните и специализирани училища“	Брой училища получили подкрепа	бр.	Община Дряново	ежегодно	2	1
Мярка 2.1.10 „Разработване на програми за привличане и задържане на децата в училище“	Брой разработени програми	бр.	Община Дряново	ежегодно	5	3
Мярка 2.1.13 „Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти“	Брой проведени обучения	бр.	Община Дряново	ежегодно	5	0
<b>Приоритет 2.2. „Подобряване на услугите и достъпността“</b>						
Мярка 2.2.3. „Подобряване на материално-техническата база на болниците на територията на общината, както и повишаване на осигуреността им с медицинска апаратура и медицински специалисти“	Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните здравни заведения	бр.	Община Дряново	ежегодно	1 000	0
Мярка 2.2.7. „Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за лица с увреждания и възрастни граждани“	Годишен брой на лицата, които използват социални и интегрирани здравно-социални услуги	бр.	Община Дряново	ежегодно	1 000	163
Мярка 2.2.8. „Създаване на други видове социални услуги (за спешно настаняване, ранна интервенция, консултативни за деца и семейства и т.н.)“	Годишен брой на лицата, които използват други видове социални услуги (за спешно настаняване, ранна интервенция, консултативни за	бр.	Община Дряново	ежегодно	1 000	810



Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност (2027г.)	Постигната междинна стойност (към 2022г.)
	деца и семейства и т.н.					
<b>Приоритет 2.3. „Повишаване на административния капацитет и качеството на административното обслужване“</b>						
Мярка 2.3.3. „Подобряване на знанията на служителите в областта на информационните технологии“	Брой проведени обучения	бр.	Община Дряново	ежегодно	10	0
Мярка 2.3.4. „Усвояване на добри практики в повишаване на административния капацитет“	Брой проведени обучения	бр.	Община Дряново	ежегодно	10	0
Мярка 2.3.5. „Подобряване на уменията за управление на проекти“	Брой проведени обучения	бр.	Община Дряново	ежегодно	10	0
Мярка 2.3.9. „Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове“	Изработени и одобрени кадастрални и устройствени планове за населените места	бр.	Община Дряново	ежегодно	4	0
<b>Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“</b>						
Мярка 3.1.2. „Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и привеждането ѝ в съответствие с европейските изисквания“	Дължина на новите и рехабилитирани общински пътища, получили подкрепа	км	Община Дряново	ежегодно	10	2
Мярка 3.1.3. „Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа, паркинги и паркоместа“	Жители, които имат достъп до нова или модернизирана инфраструктура в градските райони	бр.	Община Дряново	ежегодно	1 000	6000
Мярка 3.1.4. „Модернизация на телекомуникационната мрежа и развитие на мрежите за	Домакинства с абонаменти за широколентов достъп до мрежата	бр.	Община Дряново	ежегодно	500	0

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност (2027г.)	Постигната междинна стойност (към 2022г.)
достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернетна територията на общината“	много висок капацитет Предприятия с абонаменти за широколентов достъп до мрежа с много висок капацитет					
<b>Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“</b>						
Мярка 3.2.2. „Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и пречиствателни станции за питейна вода“	Жители, свързани към подобрени системи за снабдяване с вода Жители, свързани поне към системи за вторично пречистване на отпадъчни води	бр.,	Община Дряново	ежегодно	1000	544 (Царева ливада, Крънча, Марча)
	Загуби на вода	% загуби на количество доставена вода на входа на системата	Община Дряново	ежегодно	40%	60%
Мярка 3.2.4. „Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното ограничаване“	Жители, които се ползват от мерки по отношение на качеството на въздуха	бр.	Община Дряново	ежегодно	8 396	7 531
Мярка 3.2.5. „Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваща преработката на смет и отпадъци“	Жители, обслужвани от съоръжения за рециклиране на отпадъци и малки системи за управление на отпадъци	бр.	Община Дряново	ежегодно	3 000	8 824
<b>Приоритет 3.3. „Развитие на културната, образователна, спортната и туристическа инфраструктура“</b>						
Мярка 3.3.1. „Поддържане и обогатяване на културната инфраструктура“	Ползватели на подкрепяната културна инфраструктура	бр.	Община Дряново	ежегодно	1 000	2 000

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност (2027г.)	Постигната междинна стойност (към 2022г.)
Мярка 3.3.2. „Изграждане на спортни зали/инфраструктури за развитие на професионален спорт, поддържане на открити и закрити спортни площи“	Ползватели на подкрепяната спортна инфраструктура	бр.	Община Дряново	ежегодно	1 000	2000
Мярка 3.3.5. „Изграждане на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината“	Туристи/посещение в подпомогнатите обекти	бр.	Община Дряново	ежегодно	10 000	0
Мярка 3.3.6. „Подобряване на общинската образователна инфраструктура включително внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради/помещения на образователната инфраструктура, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.“	Годишен брой на децата, използващи подкрепяната образователна инфраструктура	бр.	Община Дряново	ежегодно	1 000	660
<b>Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“</b>						
Мярка 3.4.1. „Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа“	Потребители, свързани към енергийни мрежи	бр.	Община Дряново, Агенция по енергийна ефективност	ежегодно	3 500	0
Мярка 3.4.2. „Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на алтернативните	Общо произведена енергия от възобновяеми източници	%	Община Дряново, Агенция по енергийна ефективност;	ежегодно	25%	0

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност (2027г.)	Постигната междинна стойност (към 2022г.)
източници на енергия“						
Мярка 3.4.3. „Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд“	Сгради с подобрена енергийна класификация (жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни)	бр.	Община Дряново	ежегодно	50	4

На база на представените в горната таблица данни могат да бъдат направени следните изводи:

#### Напредък по постигане на индикаторите за резултат:

- Постигане на индикаторите за измерване степента на постигане на Стратегическа цел 1. „Подем в икономиката“ е незадоволително.
- Постигане на индикаторите за измерване степента на постигане на Стратегическа цел 2. „Развитие на човешките ресурси“ е незадоволително.
- При заложените индикатори за изпълнение на Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и свързаност“ е постигнато близо 14% изпълнение.

#### Напредък по постигане на индикаторите за продукт:

- Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“ – незадоволително;
- Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите“ – отлично;
- Приоритет 1.3. „Откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта“ – незадоволително;
- Приоритет 1.4. „Изграждане на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината“ – незадоволително;
- Приоритет 1.5. „Развитие на селското и горското стопанство“ – добро;
- Приоритет 1.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“ – добро;
- Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на общината“ – много добро;
- Приоритет 2.2. „Подобряване на услугите и достъпността“ – добро;
- Приоритет 2.3. „Повишаване на административния капацитет и качеството на административното обслужване“ - незадоволително;

- Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“ - добро;
- Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“ – много добро;
- Приоритет 3.3. „Развитие на културната, образователна, спортната и туристическа инфраструктура“ – много добро;
- Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“ - незадоволително;

От направената оценка е установена необходимостта да се предприемат корективни действия в Матрицата на индикаторите (Приложение №3), които да бъдат съобразени с промяната на стратегическата рамка на ПИРО при неговата актуализация, така и с Приложение За – Списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. (Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027). Индикаторите трябва да бъдат в синхрон с наличната и регулярно поддържана информационна основа в България и наличните данни в Община Дряново. Така могат да бъдат посочени техни начални, междинни и целеви стойности. Инструментът е основно средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ПИРО, междинната и последващата оценка на плана.

### III. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

При изпълнението и извършването на междинната оценка на реализацията на ПИРО на Община Дряново важно значение има обратната връзка по постигнатите резултати, въздействието на предприетите интервенции върху територията и съответно тяхната релевантност и адекватност на текущата ситуация.

Експертната оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при изпълнението на ПИРО на Община Дряново в междинния етап на плановия период се базира на аналитичния преглед и на обобщените резултати от изпълнените проекти и дейности в периода, обхванат от междинната оценка, финансирани със средства от бюджета на общината, държавния бюджет, фондове на ЕС и други източници. За извършването на оценката са използвани събраните данни по отношение на техническото и финансово изпълнение на проектите и дейностите в Програмата за реализация на ПИРО, Индикативната финансова таблица, както и определените индикатори за наблюдение и оценка на плана.

Настоящата оценка ще провери два аспекта:(1) доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати (цели, приоритети и завършени проекти от Програмата за реализация) – ефективност; (2) доколко начинът за изпълнение на ПИРО се основава на добро управление на ресурсите – ефикасност.

#### 3.1. Оценка на ефективността

Ефективността на използваните ресурси показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността измерва степента, до която провежданите политики чрез програми, мерки, инициативи или проекти постига предварително поставените цели.

За целите на настоящата Междинна оценка за периода 2021-2023 г., ефективността на използваните ресурси при реализацията на ПИРО на Община Дряново се оценява в два аспекта. От една страна се прави съпоставяне на дела на реализираните проекти и дейности спрямо първоначално планираните и от друга страна се оценява степента на постигане на стойностите по заложените индикатори, отчитащи изпълнението на стратегическите цели и приоритети.

От направения анализ в предходните раздели оценката на ефективността е добра. Общото техническо изпълнение на ПИРО на Община Дряново на етап междинна оценка е отлично - 81,27%, формирани от 65,64% приключили дейности/проекти и 15,73%

дейности и проекти, които са в процес на изпълнение и които реално ще бъдат завършени към края на периода на действие на документа.

**Общите разходи за финансовото изпълнение на ПИРО на Община Дряново на етап междинна оценка е 31%.**

Финансовият анализ сам по себе си не води еднозначно до изводи за ефикасността на използваните ресурси. Финансовият анализ показва, че от гледна точка на ефикасността за изпълнението на **Стратегическа цел 1** са разходвани и оползотворени 95% от планирания ресурс и е постигнато 54,17%, изпълнение на планираните дейности/проекти и добро изпълнение на планираните резултати. Като цяло по Стратегическа цел 1 „Подем в икономиката“ е постигнато много добро изпълнение в резултат на проектната активност на местния бизнес и реализираните проекти на частни бенефициенти.

За Стратегическа цел 2. Се отчита финансово преизпълнение на планирания ресурс - 134% и е постигнато 60,66% изпълнение на планираните дейности/проекти в резултат на реализирани проекти в сферата на образованието, социалните услуги, здравеопазването, вкл. и укрепване на административния капацитет. По **Стратегическа цел 2** „Развитие на човешките ресурси“ се отчита много добро изпълнение.


За Стратегическа цел 3. са разходвани и оползотворени едва 17% от планирания ресурс и е постигнато 78,18% изпълнение на планираните дейности/проекти и добро изпълнение на планираните резултати. Като цяло по **Стратегическа цел 3**. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и свързаност“ е постигнато добро изпълнение. Тук е мястото да се отбележи, че независимо от постигнатите резултати реализираните проекти и инвестиции в обхвата на Стратегическа цел 3. се постига много добро общо въздействие, защото са реализирани ключови проекти за развитие на общината. По-ниските показатели са свързани с генералния дефицит на публични средства за подобряване на техническите инфраструктури в българските населени места.

### **3.2. Оценка на ефикасността**

Ефикасността на използваните ресурси указва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи. Оценката на ефикасността е изготвена, базирайки се на сравнението на двата показателя – използвани ресурси и постигнато изпълнение. Графиката дава отправна точка и по същество тя прави съпоставка между вложените ресурси в проекти, техния брой и в каква степен са допринесли за изпълнението на съответния приоритет. В нея големината на кръга показва броя на реализираните проекти към всеки приоритет. Колкото по-голям е кръгът, толкова повече реализирани проекти има към него. В същото време колкото по-нагоре е по ординатната ос, толкова по-висок

е процентът на финансово изпълнение. А колкото по-надясно по абцисата – толкова повече средства са изразходвани в абсолютна стойност.

Фигура 12. Сравнение между вложените ресурси в проекти, техния брой и приноса им към изпълнението на приоритетите на ПИРО Дряново

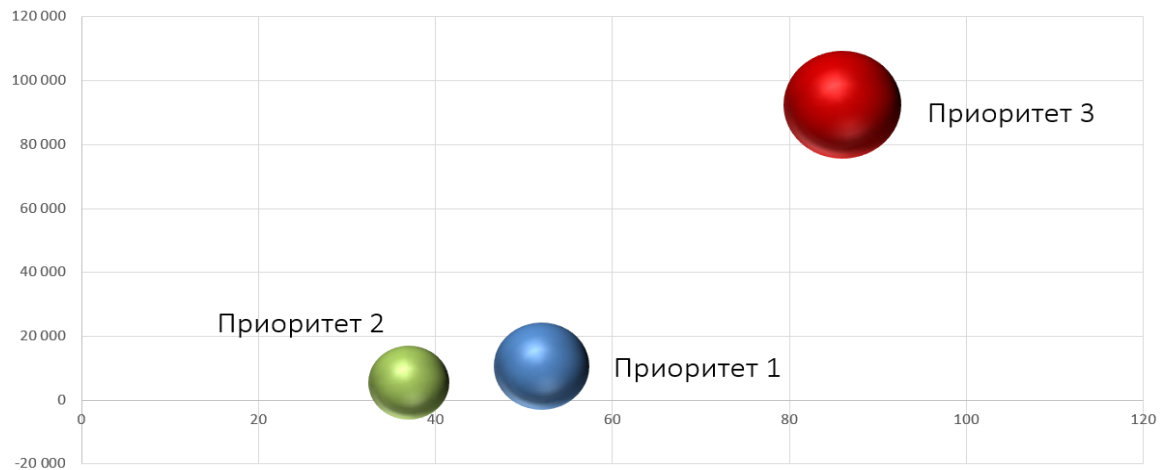

Фигурата визуализира дисбаланса при изпълнението на ПИРО на Община Дряново по стратегически цели. Следва да се подчертае, че този дисбаланс се дължи основно на предвидените и изразходваните средства по отделните приоритети.

Оценката на ефикасността може да се направи и чрез още една гледна точка – тази на произхода на финансовите ресурси за подпомагане на общинските приоритети за развитие.

Фигура 13. Ефективност на изпълнение по източници на финансиране






Основни финансови инструменти за изпълнението на ПИРО за периода 2021 - 2023 г. са средствата от държавния бюджет и европейските фондове от програмен период 2014 – 2020 г. Прегледът на изпълнението показва, че общината е търсила различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на ПИРО.

Осигурен е значителен финансов ресурс от спечелени проекти по оперативните програми на ЕС, действащи до края на 2023г.: Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Добро управление“, Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“, както и програмите за новия период: Национален план за възстановяване и устойчивост, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, Национални програми, от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) и други.

В процеса на финансиране на проекти за местното териториално развитие има Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

Фигура 14. Разпределение на финансовите ресурси по източници и по стратегически цели (хил.лв.)

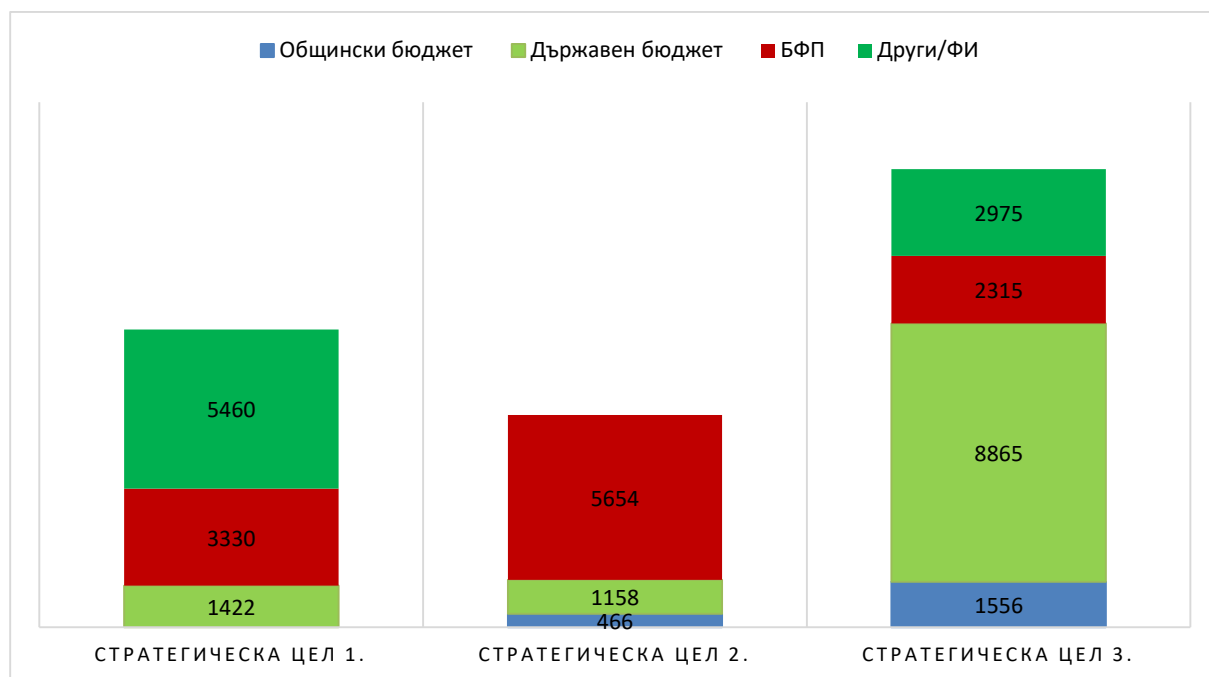

Най-голям дял от инвестираните средства са финансирани от държавния бюджет - 35% или 11 444 474 лв. за проекти на общинската администрация, следвани от финансиране структурните и кохезионни фондове на ЕС – 34% или 11 298 766 лв. за

проекти на общинската администрация, както и за съфинансиране на проекти на частния бизнес, които са реализирани през периода на междинната оценка. През периода от общинския бюджет за изпълнение на ПИРО са реализирани 2 021 779 лв., което представлява 6%.

Другите източници на финансиране формират 25% или 8 434,766 лв. от изразходвания ресурс и това са основно частните инвестиции за съфинансиране на проекти от различни европейски фондове.

Най-голям дял от получените средства от структурните и кохезионни фондове на ЕС са реализирани за проекти на общинската администрация от Стратегическа цел 2 „Развитие на човешките ресурси“.

За постигането на Стратегическа цел 3 „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и свързаност“ е основната концентрация на средствата от държавния бюджет.

**От гледна точка на произхода на финансовите ресурси, Община Дряново води ефикасна политика при изразходването на собствен ресурс, тъй като за всеки похарчен 1 лв. от общинския ресурс е успяла за привлече 15,42 лв. от други източници.**

Важно е да се подчертае, че не винаги изчислената ефикасност е еквивалент на социалните ползи. Ако внимателното се анализира добре планираният подход за реализиране на местната политика, следва да се отбележи, че ресурсите са насочени към решаване на основни проблеми.

Община Дряново е предприела и реализирала успешно няколко важни стъпки в постигане интегрираното развитие на територията, които са представени по стратегически цели.

### **Стратегическа цел 1 „Подем в икономиката“**

За периода на Междинната оценка (2021 – 2023 г.) е характерно за този период, че започва процесът на възстановяване на инвестиционната дейност след световната Ковид пандемия.

В община Дряново преобладават предимно малки и микро предприятия и фирми, свързани с областта на преработвателната промишленост, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, като в процентно съотношение те представляват повече от 50% от общия брой регистрирани предприятия на територията на община Дряново. В община Дряново развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката. Общината е специализирана в няколко индустриални направления, които се основават главно на използването на местната суровинна база. Най-видимото струпване на общини със значителен спад на инвестиционните разходи на фирмите е край Габрово и Велико Търново. Прави впечатление, че свиване на разходите за ДМА има не толкова в туристическите райони на страната, колкото в тези с икономика, фокусирана в

преработващата промишленост. Това най-вероятно отразява реакцията на фирмите към повишената икономическа несигурност през 2020 г.<sup>10</sup>

Икономическата и финансова обстановка в страната предопределя и всички показатели, от които се прави оценка на икономическото развитие на общината. През 2022 г. икономическото развитие на община Дряново, който продължава и през 2023г. В община Дряново се отчита положителна промяна в добавена стойност по факторни разходи през 2022г. е 12% спрямо 2021г.

Въпреки, че Габрово е сред сравнително силно развитите икономически области, нивото на местните данъци е ниско както през 2020г., така и през 2021 г. Най-високо е данъчното облагане в община Габрово, а най-ниско – в общините Трявна и Дряново.

Съществена роля в местното икономическо развитие има МИГ Дряново – Трявна, чрез който местни фирми основно свързани със земеделието получават възможност за инвестиции.

Наблюдава се устойчив ръст в развитието на туризма. През 2022 г. и 2023 г. е отчетен най-висок ръст на нощувките в местата за настаняване в община Дряново за последните 10 години, като броят им надвишава регистрираните през 2018 и 2019 година нощувки. Налице е положителна тенденция към преодоляване на кризата в туристическия сектор през предходните 2020 и 2021 година, вследствие на световната пандемия от COVID 19 и наложените протиепидемични мерки. Отразените нощувки за 2022 г. в община Дряново са 34 323, което е с близо 11 000 нощувки повече от предходната 2021 година. Сходни са резултатите от 2023 г., като към 31.08.2023 г. броят на регистрираните нощувки е 25 089, спрямо 24 106, отчетени за същия период през 2022 г. Запазва се тенденцията за увеличаване броя на категоризираните места за настаняване в община Дряново, като през 2023 г. общият капацитет на легловата база е над 1 200 места.

Реален принос за това има последователната общинска политика. Годишната програма за развитие на туризма в община Дряново се планира според съществуващите местни туристически ресурси и потребности. Дейностите, заложи в годишната програма, са базирани на стратегически цели и приоритети, за утвърждаване визията на община Дряново като добре разпознаваема целогодишна дестинация, с устойчив конкурентоспособен туристически сектор.

Община Дряново членува и участва в редица регионални и национални организации и форуми. Взима участие в събитията и срещите на Асоциацията на общини с територии на културно историческо наследство, както и в Организацията за управление на Старопланински туристически район.

---

<sup>10</sup> Източник: Институт за пазарна икономика, Инвестициите в общините: противоположни тенденции в хода на кризата, 2022г.

Ежегодно туристическият потенциал на общината се представя на най-голямото изложение за туризъм в България – Ваканция и Спа Експо, както и в годишните работни срещи между бизнеса и местната власт, организирани от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. В рамките на мандат 2019 – 2023 Община Дряново активно си партнира с Община Трявна в организирането и провеждането на културни събития, празнични програми и съвместни участия.

## **Стратегическа цел 2 „Развитие на човешките ресурси“**

Към 31.12.2022 г. общият брой на населението по постоянен адрес в община Дряново е 8824 души, от които 7531 са в гр. Дряново, а останалите 1293 – в селата. Броят на младите хора е както следва: - 15 -19 години – 383, от тях живущи в град Дряново - 342 лица - 20 - 29 години – 720, от тях живущи в град Дряново – 643 лица.

В общинския център гр. Дряново е концентрирано над 76,43% от населението, което през 2022г., наброява 5692 жители и се отчита увеличение спрямо предходната година. В малките села живее 23,57% от населението на общината, при което също се отчитат темпове на намаляване.

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Дряново през последните години намалява. Основните причини за това са отрицателният естествен прираст и миграционните процеси, протичащи на територията на цялата Габровска област.

Както за цялата страна, така и за Дряново демографските процеси в общината се задълбочават. В община Дряново осезаемо намалява броят на населението във всички възрастови групи. Населението под трудоспособна възраст, като за 2022г. то е 839 и формира дял от 11,27% от общото население, а населението над трудоспособна възраст е 2755 или 36,99%. Възрастовата структура на населението на общината все още е благоприятна, защото икономически активните лица заемат повече от половината от населението в общината– над 51,74% са в трудоспособна възраст (3 853 души).

Таблица 5. Население под, във и над трудоспособна възраст в Община Дряново за периода 2020-2022г., в %

<b>Население (относителен дял)</b>	<b>2020г.</b>	<b>2021г.</b>	<b>2022г.</b>
Под трудоспособна възраст	1027	976	839
Трудоспособна възраст	4531	4416	3853
Над трудоспособна възраст	3016	2921	2755

Коефициентът на естествен прираст е минус 9,6%, докато през 2021г. е минус 13,2%. Но все още се запазва отрицателният естествен прираст на населението, както и неговото застаряване.

Съществен момент в демографското развитие на общината на фона на всеобщата картина за страната е интензивната външна миграция, породена от безработицата и неблагоприятните социално-икономически условия.

Миграцията засяга предимно хора в активна възраст и процесът е свързан с все по-интензивното преразпределение на населението и струпването му в големите градове за сметка на малките и средни селища. Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 2022 г. е намаляло с 866 души спрямо предходната година. Влошаващите се демографски показатели продължават да влияят негативно върху социално-икономическите процеси в общината и създават естествени бариери пред постигане целите на Плана за интегрирано развитие на община Дряново за периода 2021-2027 г.

Показателите за заетостта и безработицата са важни индикатори за икономическото развитие, тъй като човешкият фактор е свързващо звено между останалите фактори на производството и от него зависи тяхното пълноценно използване. Към 31.12. 2022г. коефициентът на безработица в община Дряново е близо 7% и тя продължава да бъде значително над средните нива за област Габрово - близо 4% и за страната – близо 6%.<sup>11</sup> И през 2023 г. субсидираните работни места в община Дряново са един от механизмите за намаляване натиска на пазара на труда. Община Дряново продължи работа по програми за заетост. Категорично пазарът на труда в общината се нуждае от стимулиране и допълнителни насърчителни мерки.

Високият ръст на безработица през периода потвърждава необходимостта от стимулиране и допълнителни насърчителни мерки. През периода субсидираните работни места в община Дряново са един от механизмите за намаляване натиска на пазара на труда. През анализирания период Община Дряново работи активно с Дирекция „Бюро по труда“ – Дряново за преодоляване на проблема с безработицата по различни национални програми на Агенция по заетостта и Регионалната програма за заетост. Общинската администрация изпълнява проекти, свързани с подобряване достъпа до заетост, активиране на неактивните лица и осигуряване на работни места.

Общинската образователна система не се променя съществено през отчетния период и към 2023 г. - една ДГ „Детелина“, разположена в 3 бази, едно средищно СУ „Максим Райкович“ и една ПГИТ „Рачо Стоянов“.

През учебната 2022/2023 г. детски градини и предучилищните групи в община Дряново се посещават от 191 деца, като броят им се увеличава спрямо предходната учебна година – 183. На 100 деца се падат 108 места в детските градини. Училищната мрежа на територията на община Дряново се състои от 2 общински учебни заведения: СУ „Максим Райкович“ – 436 ученици 2. Професионална гимназия по икономика и техника „Рачо Стоянов“ – 113 ученици. В общообразователните училища на общината броя на учениците за учебната 2022/2023г. е 397, като броят им е намалял в сравнение с

---

<sup>11</sup> Бележка: по данни на Агенция по заетостта

предходната година – 448. В професионалните училища се обучават 124 ученици, като броят им нараства спрямо предходната година – 118 души. Всички учебни заведения участват активно в Национални програми на МОН.

Община Дряново продължава традицията да подпомага таланти деца; за трета поредна година връчва годишни стипендии за ученици от гимназиален курс, на стойност 100 лв. месечно за всеки стипендиант. Отпускането на годишни ученически стипендии цели да поощри и подпомогне ученици от гимназиален курс в средните училища в гр. Дряново, имащи изявени дарби, трайни успехи и постижения в областта на учебни дисциплини, изучавани в съответното училище. Финансовият ресурс се обезпечава от бюджета на общината за съответната година. Стипендиите са индивидуални и се отпускат за срок от една учебна година /девет месеца/. Детските и учебни заведения продължиха да реализират дейности, ориентирани към осигуряване на приобщаващо образование на учениците от малцинствата.

Силна страна в работата на местната администрация е работата по приобщаващо образование и преодоляване на неравенствата. Предизвикателството пред местната власт е овладяване на проблема с отпадналите ученици в задължителна училищна възраст, като това са основно деца от ромското малцинство, които прекъсват своето обучение. Данните сочат, че това е най-сериозният проблем за бъдещото формиране на образовано население в общината. Между образователните институции и местния бизнес се реализират съвместни проекти/ инициативи за подготовка на учениците за професионална реализация.

През 2022г. броят на лечебни заведения за извънболнична помощ остава непроменен - 4 бр. По последни данни на НСИ към 2022 г. на територията на община Дряново работят общо 6 лекари, 14 медицински специалисти по здравни грижи и 7 стоматолози. На 1 лекар се падат 1241 пациенти, което е повече в сравнение с показателите на ниво област Габрово - 247 пациенти на 1 лекар. Това показва по-висока натовареност на лекарите в общината в сравнение с колегите им от областта. Един специалист по дентална медицина – 1 лекар обслужва 1064 души, докато на ниво област Габрово на лекар се падат – 1066 души. Броят на общопрактикуващите лекари е близък, макар и по-нисък от средните стойности в страната, но този на лекарите специалисти е значително по-малък.

Политиката на Община Дряново в сферата на социалните дейности през периода е насочена към запазване на съществуващата широка гама от услуги и повишаване на тяхното качество. Общината се утвърди като доставчик на почасови здравно-социални услуги в домашна среда. По-голямата част от социални услуги (държавно – делегирана дейност) се предоставят за управление на външни доставчици: Защитени жилища за лица с умствена изостаналост I и II в с. Царева ливада, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Гостилница, Защитено жилище за лица с физически увреждания в гр. Дряново, Център за обществена подкрепа, Дневен център за стари хора и Дневен център за деца и възрастни с увреждания.

Община Дряново изпълнява самостоятелно специализираните социални услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Асистентска подкрепа“.

Община Дряново е доставчик на седем услуги в ЦНСТПЛПР /Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства/ с адрес гр. Дряново, ул. Железничарска № 2, създадени в изпълнение на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., След края на проектната дейност, въз основа на заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за даване на предварително одобрение за създаване на социална услуга и решение на Общински съвет Дряново през 2023 година поетапно преминаха към финансиране от държавата.

През 2023 г. е разкрит фронт-офис в гр. Дряново, ул. „Стефан Стамболов“ № 46 с две работни места за подобряване информирането и консултирането на гражданите в социалната сфера, по проект № BG05SFPR002-2.002-0019-C01 „Укрепване на капацитета на Община Дряново за провеждане на устойчиви социални политики на местно ниво“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2023-2027 г.

### **Стратегическа цел 3 „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и свързаност“**

През периода са направени инвестиции за подобряване свързаността между населените места в общината. Реализирани са ключови инфраструктурни проекти.

Община Дряново предприема действия за реализиране на мерки свързани с предотвратяване на климатичните промени. Реализират се проекти за енергийна ефективност на публични сгради. Периодично общинска администрация осъществява текущи ремонти на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения, за да се осигури тяхната надеждна експлоатация. През периода е инвестирано във ВиК мрежата. През анализирания период за изготвени инвестиционни проекти на стойност над 5 милиона лева, с които Община Дряново има готовност да кандидатства за осигуряване на финансиране и в оставащия период на действие на ПИРО да бъдат реализирани. Това са:

- Ремонт и обновяване на площадно пространство в гр. Дряново, общ. Дряново. Индикативна стойност на проекта - 1 596 621,00 лева.
- Водоснабдяване на село Чуково. Индикативна стойност на проекта – 487 000,00 лева.
- Вътрешна водопроводна мрежа село Гостилица (висока зона). Индикативна стойност на проекта – 1 759 000,00 лева.
- Площад, зеленина и паркинг в УПИ I - за площад и зеленина, кв. 83, гр. Дряново (район на спортна зала). Индикативна стойност на проекта - 275 516,53 лева.

- Изграждане на подпорна стена на десен бряг на река Дряновска от съществуваща пасарелка за жп гара до стадион „Локомотив“. Индикативна стойност на проекта – 1 654 990,00 лева.
- Възстановяване подпорна стена в с. Гоздейка. Индикативна стойност на проекта - 159 645,50 лева.
- Възстановяване подпорна стена в с. Катранджии. Индикативна стойност на проекта - 198 725,09 лева.
- Извършване на текущ ремонт и консервационно- реставрационни работи на Икономова къща, гр. Дряново. Индикативна стойност на проекта - 61 015,00 лева.
- Извършване на текущ ремонт и консервационно-реставрационни работи на мост на Колю Фичето над река Дряновска. Индикативна стойност на проекта - 227 684,28 лева.
- Извършване на текущ ремонт и консервационно-реставрационни работи на Ромунова къща. Индикативна стойност на проекта - 177 574,53 лева.
- Ремонт фасади, вътрешен ремонт и вертикална планировка на съществуваща административна сграда – УПИ II, кв. 8 по плана на село Ганчовец, община Дряново. Индикативна стойност на проекта - 350 356,03 лева.
  - Изграждане на осветление за футболно игрище на стадион Локомотив. Индикативната стойност на проекта - 973 335,00 лева.

### **Зони за прилагане на интегриран подход (Зони за въздействие)**

В ПИРО на Община Дряново за периода 2021 – 2027 г. са определени 4 приоритетни зони за прилагане на интегриран подход.

**Зона 1. Индустиална зона в източната част на града:** бъдещата индустиална зона.

**Зона 2. Атрактивна зона за отдих и туризъм:** обхваща територията на стария път за манастира; начало от моста на Колю Фичето с архитектурния парк и зоната около Духовниковата чешма, по новата пешеходна и велоалея.

**Зона 3. Зона за култура:** Пешеходната зона в центъра на града, старата автогара с Ромуновата къща и възрожденски архитектуен ансамбъл Старата улица.

**Зона 4. Зона за спорт:** обхваща спортен комплекс „Локомотив“. Планира се свързване на спортен комплекс „Локомотив“ със Спортна зала – Дряново по път край реката и обособяването им като обща зона за спорт.

През периода 2021 – 2023 г. се наблюдава реализирането на проекти и изразходването на финансов ресурс да се насочва към цялата територия на общината, което допринася за реалното развитие на полицентричната мрежа на населените места. Спецификата на анализирания период извежда на първо място необходимостта от социална подкрепа и подобряване качеството на образователния процес.



През оставащия период трябва да бъдат оползотворени възможностите за изпълнение на проекти, свързани с подобряване състоянието на базовата инфраструктура за подобряване качеството на живот и повишаване инвестиционния потенциал на територията.

### **Обобщение на организационните ресурси за изпълнение и наблюдение на ПИРО**

Към момента, изпълнението на ПИРО се осъществява чрез дейността на отделните ресурси на общинска администрация при координиращата роля на дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика“ в Общинска администрация – Дряново. Сред приложените инструменти за изпълнение и наблюдение на ПИРО се откроява Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО за 2021г., 2022г. и 2023г. Прави впечатление, че малкият набор на приложените инструменти е свързан с обща ефективност на плана и много висока ефективност за два от приоритетите.

Въпреки, че Община Дряново е малка общината, тя успешно разработва, кандидатства и печели европейски проекти на конкурентен принцип. И това е резултат от високата експертиза в полето на управление на европейски средства на администрацията, високия професионален опит и отдаденост на експертите в общинската администрация, пряко ангажирани с работата по проекти.

### **Описание на съответствието между разходите и очакваните ползи**

На етап междинна оценка към края на 2023 г., отчетените проекти и инициативи и индикатори показват добра резултатност в изпълнението на ПИРО. Анализираният проекти и инициативи в Община Дряново имат пълно съответствие със стратегията на ПИРО, като по отделно допринасят за различните мерки на плана. В действащото ПИРО за постигане на желаната визия и главната стратегическа цел в ПИРО са заложили 3 стратегически цели, 14 приоритета и 101 мерки<sup>12</sup>, значителна част от които са нерелевантни на социално - икономическото развитие на общината, на съществуващия потенциал и силните страни, които следва да се развиват. От направените годишни доклади за отчитане изпълнението на ПИРО и настоящата междинна оценка е видно, че по значителна част от мерките няма напредък. Затова се препоръчва преразглеждане и оптимизиране както на приоритетите, така и на планираните мерки и проекти/дейности, защото „Мерките следва да бъдат приложими, постижими и реалистични, с конкретни измерими резултати и с реални източници на финансиране. Това означава, че включените в програмата за реализация мерки не трябва да бъдат „пожелателни“ или „потенциални“ (в случай че бъде осигурено финансиране в неопределен бъдещ момент), а да

---

<sup>12</sup> Бележка: В ПИРО е посочено, че техният брой е 218.

представяват реално планирани дейности и поети ангажименти от страна на общината или партньорите.<sup>13</sup>

Въпреки това в резултат на постигнатото добро техническо и финансово изпълнение на междинния от етап от изпълнение на ПИРО следва да се даде положителна оценка относно съотношението между направените разходи и очакваните/постигнатите ползи.

---

<sup>13</sup> Бележка: Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (март 2020г.).

## IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

### Изводи

- Ефективността на техническото изпълнение на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2023 г. е отлично 81,27%, формирани от 65,64% приключили дейности/проекти и 15,73% дейности и проекти, които са в процес на изпълнение и които реално ще бъдат завършени към края на периода на действие на документа.
- Реално постигнатият финансов напредък спрямо стойността на Програмата за реализация е 31%, спрямо планирания ресурс в индикативната финансова рамка.
- От гледна точка на произхода на финансовите ресурси, Община Дряново води ефикасна политика при изразходването на собствен ресурс, тъй като за всеки похарчен 1 лв. от общинския ресурс в общината са привлечени 15,42 лв. от други източници.
- Висока проектна активност на Община Дряново и на частните бенефициенти;
- По-ниска степен на общо изпълнение поради забавяне одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост и на новите програми, а основен инструмент за реализирането на ПИРО са средствата от Европейския съюз.
- Небалансираност между изпълнението на отделните приоритетни области;
- Умело използване и съчетаване на различни източници на финансиране за изпълнението на ПИРО.
- Добро изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО според отчетените индикатори, които показват висока резултатност, като част от тях са преизпълнени;
- Детайлно отчитане за изпълнението на общинските политики на годишна основа – Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО за 2021г., 2022г. и 2023г.
- Предоставянето на информация към гражданите се осъществява приоритетно чрез интернет страницата на Община Дряново.

### Препоръки

Необходимо е да се извърши актуализиране на Плана за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027г. с оглед променените социално – икономически условия през периода 2021 – 2023г. и наличието на одобрени програми за финансиране през новия програмен период със средства от фондовете на ЕС.

Програмата за реализацията на ПИРО е оперативен документ за реализиране на основните приоритети и цели, залегнали в ПИРО и включва мерки и проектни идеи, насочени към постигане на целите за развитието на Община Дряново в периода 2021 –

2027 г. Изправена пред предизвикателството за работа в създалите се необичайни условия местната администрация следва да предприеме актуализация, чрез която да намери решения на много от проблемите с цел да не се допусне срив в нито една от съществуващите системи на територията на общината.

В междинния период на изпълнение се отчитат извършени дейности и технически напредък при 55% от мерките, а 45% са без напредък. При извършване на оценката е установено, че част от мерките се дублират, припокриват се смислово или са резултат от технически пропуски при разработване на документа.

В тази връзка се препоръчва:

- Да се извърши актуализация на Плана за интегрирано развитие и на приложенията към него: Приложение №1 Програма за реализация на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2027 г., съобразно резултатите от настоящата оценка; Приложение № 1А. Индикативен списък на важни за общината проекти; Приложение №2. Индикативна финансова таблица

**Изведените препоръки няма задължителен характер.**
